


Id	Nombre de tarea	Duración de línea base	Comienzo previsto	Fin de línea base	Duración	Comienzo	Fin	% completado	% físico completado	2022				2023			
										T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	REHABILITACIÓN ACUEDUCTO GUANUMA-LOS BOTADOS	0 días	NOD	NOD	593.63 d	mar 25/1/22	mié 6/12/23	0%	0%								
2	PRELIMINARES	0 días	NOD	NOD	217.63 d	mar 25/1/22	mié 28/9/22	0%	0%								
3	Recepción del anticipo	0 días	NOD	NOD	1.13 días	mar 25/1/22	mar 25/1/22	100%	0%								
4	Firma de acta de Inicio	0 días	NOD	NOD	1.13 días	mar 8/2/22	mar 8/2/22	100%	0%								
5	Otros	0 días	NOD	NOD	12.75 días	mar 17/5/22	mar 31/5/22	0%	0%								
6	Recepción de la Ingeniería de Detalle	0 días	NOD	NOD	0 días	mar 17/5/22	mar 17/5/22	0%	0%								
7	Recepción del Estudio de Impacto Ambiental	0 días	NOD	NOD	0 días	mar 31/5/22	mar 31/5/22	100%	0%								
8	INICIO DE LA OBRA	0 días	NOD	NOD	0 días	mar 31/5/22	mar 31/5/22	0%	0%								
9	MOVILIZACIÓN	0 días	NOD	NOD	30 días	mar 31/5/22	lun 4/7/22	0%	0%								
10	PRESENTACIONES AL INGENIERO SUPERVISOR (SUBMITTALS)	0 días	NOD	NOD	7 días	mar 31/5/22	mar 7/6/22	0%	0%								
21	PROCURAS CLAVE	0 días	NOD	NOD	100 días	mar 7/6/22	mié 28/9/22	0%	0%								
32	TRABAJOS CONTRACTUALES	0 días	NOD	NOD	425 días	mar 31/5/22	lun 2/10/23	0%	0%								
33	PRELIMINARES	0 días?	NOD	NOD	59 días	mar 31/5/22	jue 4/8/22	0%	0%								
37	PLANTA DE TRATAMIENTO	0 días?	NOD	NOD	380 días	mié 20/7/22	lun 2/10/23	0%	0%								
38	Movimiento de Tierra y Replanteos	0 días?	NOD	NOD	10 días	vie 22/7/22	mar 2/8/22	0%	0%								
39	OBRAS CIVILES	0 días?	NOD	NOD	160 días	mié 20/7/22	mar 24/1/23	0%	0%								
75	FIN DE OBRAS CIVILES	0 días?	NOD	NOD	0 días	mar 24/1/23	mar 24/1/23	0%	0%								
76	MONTAJE MECANICO	0 días?	NOD	NOD	209 días	sáb 3/12/22	mié 9/8/23	0%	0%								
87	FIN MONTAJE MECANICO	0 días?	NOD	NOD	0 días	mié 9/8/23	mié 9/8/23	0%	0%								
88	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRIFICACION	0 días?	NOD	NOD	202 días	mar 17/1/23	mié 6/9/23	0%	0%								
93	FIN ELECTRIFICACION	0 días?	NOD	NOD	0 días	mié 6/9/23	mié 6/9/23	0%	0%								
94	PUESTA EN MARCHA	0 días?	NOD	NOD	15 días	mié 30/8/23	vie 15/9/23	0%	0%								
96	AREA EXTERIOR Y CUBIERTA METALICA	0 días?	NOD	NOD	75 días	vie 16/12/22	mié 22/3/23	0%	0%								
101	FIN DE AREA EXTERIOR Y CUBIERTA METALICA	0 días?	NOD	NOD	0 días	mié 22/3/23	mié 22/3/23	0%	0%								
102	IMPREVISTOS PLANTA	0 días?	NOD	NOD	15 días	vie 15/9/23	lun 2/10/23	0%	0%								
103	FIN PLANTA DE TRATAMIENTO	0 días?	NOD	NOD	0 días	lun 2/10/23	lun 2/10/23	0%	0%								
104	FIN TRABAJOS CONTRACTUALES	0 días?	NOD	NOD	0 días	lun 2/10/23	lun 2/10/23	0%	0%								
105	Documentos Entregables	0 días?	NOD	NOD	14 días	mar 26/9/23	mié 11/10/23	0%	0%								
108	IMPREVISTOS	0 días	NOD	NOD	50 días	mié 11/10/23	mié 6/12/23	0%	0%								
109	FIN INCLUYENDO IMPREVISTOS	0 días	NOD	NOD	0 días	mié 6/12/23	mié 6/12/23	0%	0%								

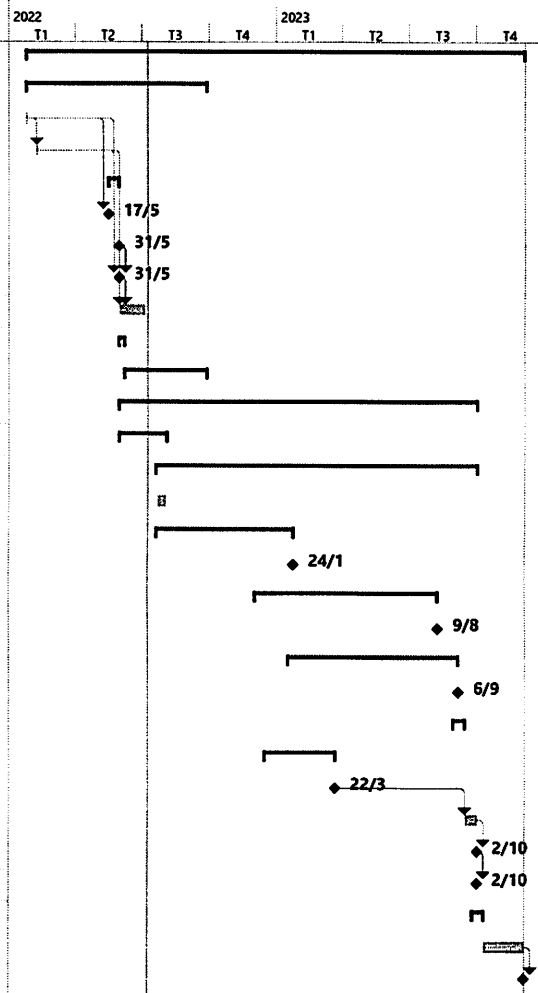

Proyecto: ACUEDUCTO GUANU Fecha: sáb 9/7/22	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Hito de línea base	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite		Resumen de línea base	
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas		Progreso	
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Línea base			
