



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

Santo Domingo, D.N.  
08 de agosto de 2022

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**REPORTE DE CUB. NO. 1**  
**PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 30/05/2022 HASTA 30/06/2022**

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Los Limones-El Copey A Loma Atravesada, Depósito Regulador, Línea De Conducción y Redes E5+124(D.R.) Hasta E0+700, Provincia Montecristi, Zona I, lote XI.  
**Contrato:** 024-2022  
**Contratista:** Osiris Ángel Morales Brito  
**Provincia:** Monte Cristi

Anexo -Reporte de Cubicación No.1  
- Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos en esta obra contemplan la ejecución de las siguientes actividades:

- Línea de Conducción y Redes: esta obra tiene previsto ejecutar 700 m de línea de tubería Ø 4" PVC SDR-26 y un Depósito Regulador de 100 M<sup>3</sup>, aproximadamente de 26,400 galones de agua.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Al momento de realizar este informe esta obra se realizó avances en campo de 614.05 m de línea de Ø 4" PVC SDR-26.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

Suministro y colocación de 700 mts de tubería Ø4" PVC-SDR-26.

Para su conocimiento y fines correspondientes.


Atentamente,

*D/O Ing. Felipe Alcántara*  
**Ing. Víctor Felipe**  
Supervisor de Obras





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

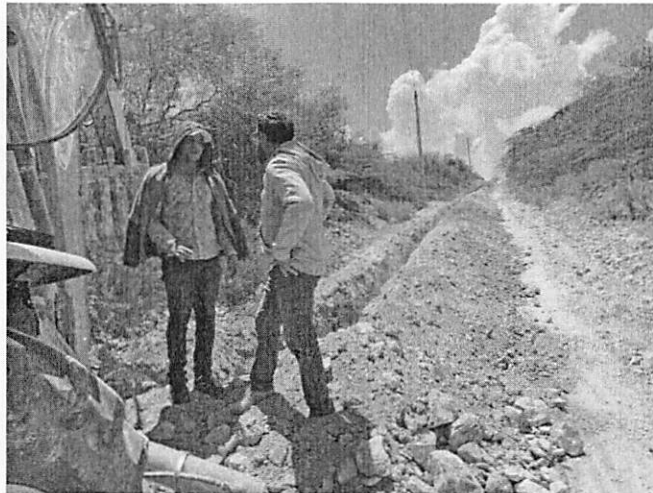





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

Santo Domingo, D.N  
10 de agosto de 2022

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**REPORTE DE CUB. NO. 1**  
**PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 30/05/2022 HASTA 30/06/2022**

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Los Limones-El Copey A Loma Atravesada, Línea De Conducción y Redes Desde Estación E0+700 Hasta E2+820, Provincia Montecristi, Zona I  
**Contrato:** 025-2022  
**Contratista:** Winnie Cleotilde Vargas González  
**Provincia:** Monte Cristi

Anexos -Reporte de Cubicación #1.  
-Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos en esta obra contemplan la ejecución de las siguientes actividades:

- Línea de Impulsión: esta obra tiene previsto ejecutar 3,192.00 m de línea de impulsión, disperso en 2,120.00 de tubería Ø 4" PVC SDR-26 y 1,072.00 de tubería Ø 3" PVC SDR-26.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra ejecución.

**III) ACTIVIDADES DESTACADAS:**

La partida más destacada es la colocación de 1,160.00 mts de tubería de Ø 4" y 493.00 mts de tubería de Ø 3".

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

*D/o Luis E. Obes Torres*  
**Ing. Víctor Felipe**  
Supervisor de Obras





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)**

**DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

