



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

24 de abril del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 10/3/2023 A 21/4/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. - Lote A – Red de Distribución Sector Partido Arriba. (Lote 1)
Contrato: 096 / 2022
Contratista: Ing. Yeselis Raquel Jimenez De Almonte
Provincia: Dajabón \

Anexo : - Reporte de Cubicación No.1
-Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Red de Distribución Sector Partido Arriba, distribuidos en 2,381.89 de Tubería de 4" PVC-SDR-26 Y 1,711.80 metros de Tubería de 3" PVC-SDR-26.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de 1,055.60 mts de Tubería Ø3" PVC SDR-26 C/J. G. y 1,461.60 mts de Tubería Ø4" PVC SDR-26 C/J. G. y la colocación de 1,034.90 mts Tubería Ø3" PVC SDR-26 C/J. G. y 1,432.94 mts Tubería Ø4" PVC SDR-26 C/J. G. con su excavación y movimiento de tierra correspondiente.


Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Ruben Sanchez Robles
Supervisor



Anexos Lote A:

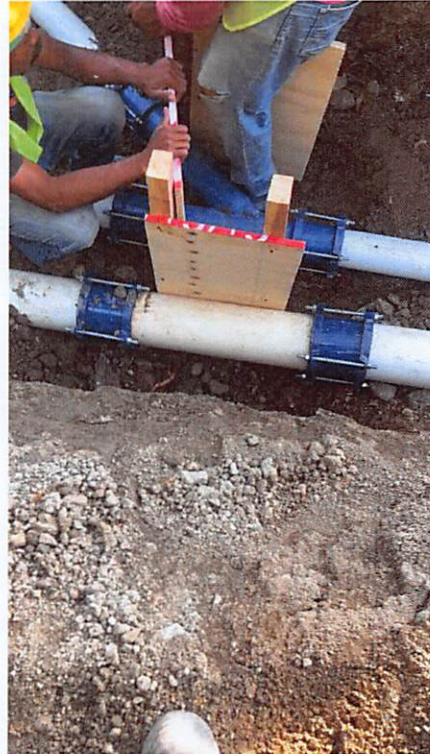



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

****INAPA****

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

FECHA: 24/04/2023

REPORTE DE CUBICACIÓN NO. : 1

OBRA:	AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I. - LOTE A - RED DE DISTRIBUCION SECTOR PARTIDO ARRIBA. (LOTE 1)	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
		DESDE:	10/3/2023
		HASTA:	21/4/2023
CONTRATISTA:	ING. YESELIS RAQUEL JIMENEZ DE ALMONTE	CONTRATO NO.:	2022-096
PROVINCIA:	DAJABON	MUNICIPIO:	PARTIDO
NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
A	RED DE DISTRIBUCION SECTOR PARTIDO ARRIBA		
1	PRELIMINAR		
1.1	REPLANTEO	M	2467.84
3	MOVIMIENTO DE TIERRA		
3.1	EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO C/EQUIPO	M ³ N	1843.32
3.2	ASIEN TO DE ARENA (SUMINISTRO Y COLOCACION)	M ³ S	167.57
3.3	SUMINISTRO MATERIAL DE MINA (SUJETO A APROBACION POR LA SUPERVISION)	M ³ E	210.21
3.5	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M	M ³ C	1509.52
3.6	BOTE DE MATERIAL SOB RANTE	M ³ E	464.56
4	SUMINISTRO DE TUBERIA		
4.1	DE Ø4" PVC(SDR-26) C/J. G. +2% PERDIDA DE CAMPANA	M	1461.60
4.2	DE Ø3" PVC(SDR-26) C/J. G. +2% PERDIDA DE CAMPANA	M	1055.60
5	COLOCACION DE TUBERIA		
5.1	DE Ø4 PVC SDR-26 C/J. G.	M	1432.94
5.2	DE Ø3 PVC SDR-26 C/J. G.	M	1034.90
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE:		
7.2	ACERO (C/PROTECCION ANTICORROSIVA):		
7.2.1	JUNTA TIPO TAPON DE 4"	UD	4.00
7.2.2	ANCLAJE DE H. S. Fc= 180 KG/CM ² P/PIEZAS (SEGUN DETALLE DE DISEÑO)	M ²	0.24
15	SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DEL TRANSITO INLUYE: LETREROS CON BAS, CONOS REFRACTORIOS, CINTA DE PELIGRO, MALLA DE SEGURIDAD COLOR NARAJAN, TANQUES DE 55 GL PINTADOS DE AMARILLO TRAFICO CON CINTA LUMINICA, PASARELAS DE MADERA Y HOMBRES CON BADEROLAS, CHALECOS Y CASCO DE REGURIDAD	M	2467.84
16	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (INCLUYE OBREROS, CAMION Y HERRAMIENTAS MENORES)	M	2467.84
Z	VARIOS		
1	VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 10' IMPRESION FULL COLOR CONTENIDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DE PROYECTO Y CONTRATISTA. ESTRUCTURA EN TUBOS GALVANIZADOS 1 1/2"X 1 1/2" Y SOPORTES EN TUBO CUADRADO 4"X4"	UD	1.00
2	CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASAS O SOLAR Y CASETA DE MATERIALES	MESES	1.00
REALIZADO POR:			
NOMBRE:	ING. RUBÉN DARÍO SÁNCHEZ		
FIRMA:			
CARGO:	SUPERVISOR DE OBRAS		

	LONG. MTL
2"	
3"	1034,90
4"	1432,94
6"	
8"	
10"	
12"	
14"	
16"	
18"	
20"	
24"	
30"	
36"	
38"	
40"	
42"	
48"	
REPL.	2.467,84

EXCACION.	
FC.	VOL. M3
0,63	-
0,72	739,95
0,77	1.103,36
0,86	-
0,96	-
1,06	-
1,17	-
1,28	-
1,40	-
1,52	-
1,65	-
1,84	-
2,19	-
2,66	-
2,83	-
3,00	-
3,28	-
3,94	-

ASIENTO ARENA	
FC.	VOL. M3
0,10	-
0,10	67,27
0,10	100,31
0,10	-
0,10	-
0,10	-
0,10	-
0,20	-
0,20	-
0,25	-
0,25	-
0,35	-
0,40	-
0,45	-
0,45	-
0,45	-
0,45	-
0,50	-

VOL TUBO	
FC.	VOL. M3
0,0300	-
0,0700	72,44
0,0100	14,33
0,0230	-
0,0380	-
0,0570	-
0,0800	-
0,0900	-
0,1300	-
0,1642	-
0,2000	-
0,2919	-
0,4560	-
0,6567	-
0,7317	-
0,8107	-
0,8938	-
1,1675	-

TOTALES

EXC. 1.843,32

AA 167,57

VOL T 86,77

SUMINISTRO MATERIAL DE MINA 210,21

RELLENO COMPACTADO 1.509,52

BOTE DE MATERIAL + ESPONJAMIENTO 464,56

LONGITUD TUBERIA

	LONG. M
2"	-
3"	1.034,90
4"	1.432,94
6"	-
8"	-
10"	-
12"	-
14"	-
16"	-
18"	-
20"	-
24"	-
30"	-
36"	-
38"	-
40"	-
42"	-

% ESPG	LONG TOTAL
2%	-
2%	1.055,60
2%	1.461,60
3%	-
3%	-
4%	-
4%	-
4%	-
5%	-
5%	-
6%	-
7%	-
	-
	-
	-
	-
	-

EXCAVACION DE MATERIAL CLASIFICADO

TIPO MATERIAL	%	EXCAV.
CLASIF. TOSCA DURA	60%	1.105,99
CLASIF. TOSCA BLANDA	20%	368,66
CLASIF. TIERRA SUELTA	20%	368,66
CLASIFICACION	0%	-
	1,00	1.843,32



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Dajabón
08 de mayo del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 01/4/2023 A 5/5/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón,
Zona I. - Lote B - Línea Matriz Sector Partido. (Lote 2)
Contrato: 2022-097
Contratista: Ing. Edgar Teófilo De La Cruz Chovet.
Provincia: Dajabón \

Anexo : - Reporte de Cubicación No.1

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Red de Distribución Partido Arriba

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro y la colocación de 1,432.37 metros de Tubería Ø4" PVC SDR-26 y 1,034.49 Tubería Ø3" PVC SDR-26, Con su correspondiente corte de Asfalto y Movimiento de tierra.


Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Ruben Sanchez Robles
Supervisor



Anexos Lote B:

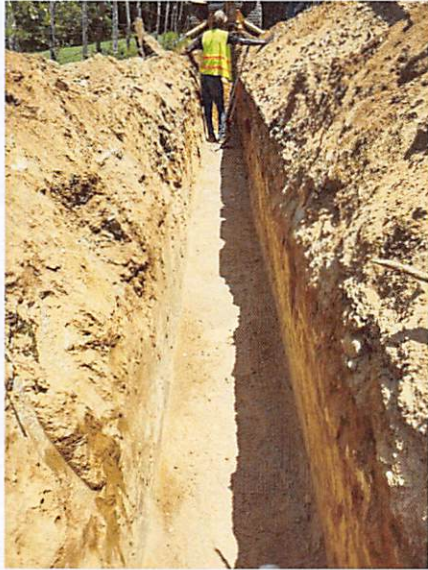



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

27 de marzo del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 10/3/2023 A 27/3/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido-La Gorra, Provincia Dajabón,
Zona I, Lote C, Línea Matriz Sector Partido Arriba (Lote 3)
Contrato: 098 / 2022
Contratista: Constructores Arquitectos e Ingenieros CONARING
Provincia: Dajabón

Anexo : - Reporte de Cubicación No.1
- Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de conducción.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro 580.00 mts y la colocación de 551.00 mts Tubería Ø16" PVC SDR-26, Corte y remoción de carpeta asfáltica y movimientos de tierra, etc.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Ruben Sanchez Robles
Supervisor





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Dajabón
12 de junio del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1 ✓
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 24/4/2023 A 12/5/2023 ✓

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. - Lote D – Red de distribución Sectores Partido y Villa García. (Lote 4) ✓
Contrato: 099 / 2022 ✓
Contratista: Ing. Leonardo Antonio Castillo Contreras ✓
Provincia: Dajabón \

Anexo : - Reporte de Cubicación No.1 ✓

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Red de Distribución Sectores Partido y Villa García en tubería de 6" PVC SDR-26, L=1,567.66 metros y en tubería de 3" PVC SDR-26, L=1,377.56 metros. ✓

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de 1,567.66 mts de Tubería Ø6" PVC SDR-26 C/J. G. y 1,377.56 mts de Tubería Ø6" PVC SDR-26 C/J. G. y Corte de Asfalto de 5,170.58 metros. ✓

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Ruben Sanchez Robles
Supervisor



ANEXO LOTE D





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Dajabón

3 de abril del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE DE CUB. NO. 1

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 01/2/2023 A 03/4/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. - Lote E - Red De Distribución Sectores Partido Y Villa García. (Lote 5).
Contrato: 100/ 2022
Contratista: SERVICIOS PROFESIONALES DE ING. Y CONST. DE OBRAS
Provincia: Dajabón

Anexo : Reporte de Cubicación No.1

-Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de distribución

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de 580.00 mts y la colocación de 562.60 Tubería Ø6" PVC SDR-26. También se está cubicando el Corte 1,125.20 m (2 lados), la remoción del Asfalto 421.95 m, con el Bote de material.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Gerardo Rafael Aquino P.
Supervisor



Anexos Lote E:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Dajabón
12 de junio del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 22/5/2023 A 9/6/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I, Lote F- Red De Distribución Sectores partido y la Piña. (Lote 6)
Contrato: 101 / 2022
Contratista: Ing. Yafreisy encarnación Sebastián
Provincia: Dajabón

Anexo : - Reporte de Cubicación No.1

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Red de Distribución

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de 1,450.00 mts de Tubería Ø4" PVC SDR-26 C/J. G. y el suministro de 4,640.00 mts de Tubería Ø3" PVC SDR-26 C/J. G la colocación de 1,421.57 mts de Tubería Ø4" PVC SDR-26 C/J. G. y 4,549.02 mts de Tubería Ø3" PVC SDR-26 C/J. G, Corte de Asfalto, excavación y movimiento de tierra correspondiente.


Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Ruben Sanchez Robles
Supervisor



Anexos Lote F:

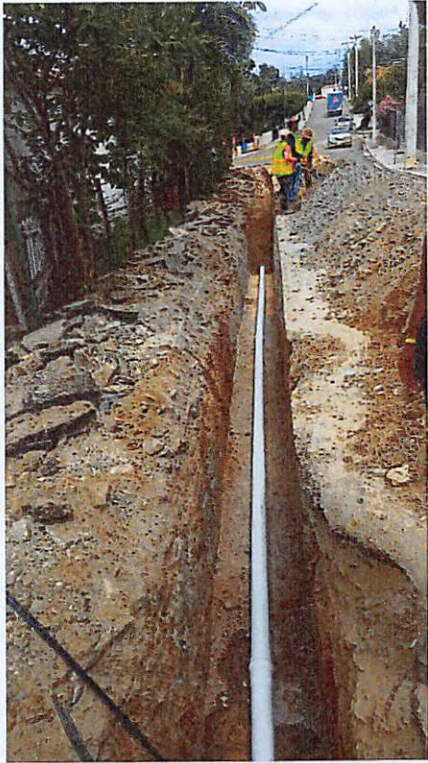



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Dajabón

12 de junio del 2023

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1**

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 13/3/2023 A 9/6/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabon Zona 1, Lote G- Red De Distribución Sector partido, (Lote 7).
Contrato: 102 / 2022
Contratista: Ing. Ramon Miguel Angel Campos Guzman
Provincia: Dajabón \

Anexo : - Reporte de Cubicación No.1 ✓

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de Distribución

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de 759.80 mts de Tubería Ø6" PVC SDR-26 C/J. G. y la colocación de 737.67mts Tubería Ø6" PVC SDR-26 C/J. G., con su Corte de asfalto, excavación y movimiento de tierra correspondiente

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Gerardo Rafael Aquino
Supervisor




Ing. Ruben Sanchez Robles
Supervisor



Anexos Lote G:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Dajabón
3 de abril del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 20/3/2023 A 03/4/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra,
Provincia Dajabon, zona i. - lote j - red de distribucion sector mata de tuna.
(lote 10)
Contrato: 105/ 2022
Contratista: IMPERMEABILIZANTES SANTO DOMINGO ISADOMI, S.R.L.
: Dajabón

Anexo : Reporte de Cubicación No.1

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de distribución

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de 576,80 mts y la colocación de 560.00 mts, Tubería Ø6" PVC SDR-26. También incluyendo todo el movimiento de tierra.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Gerardo Rafael Aquino


Supervisor






Ing. Rubén Darío Sánchez


Supervisor



Anexos Lote J:

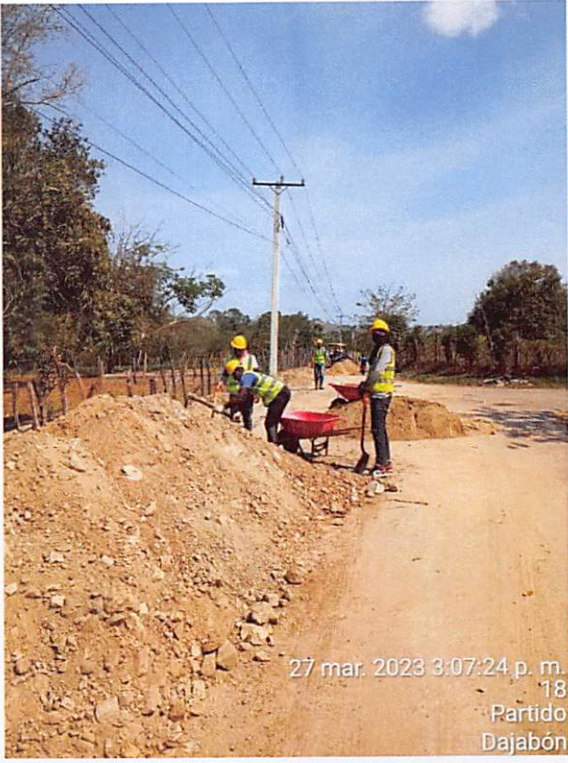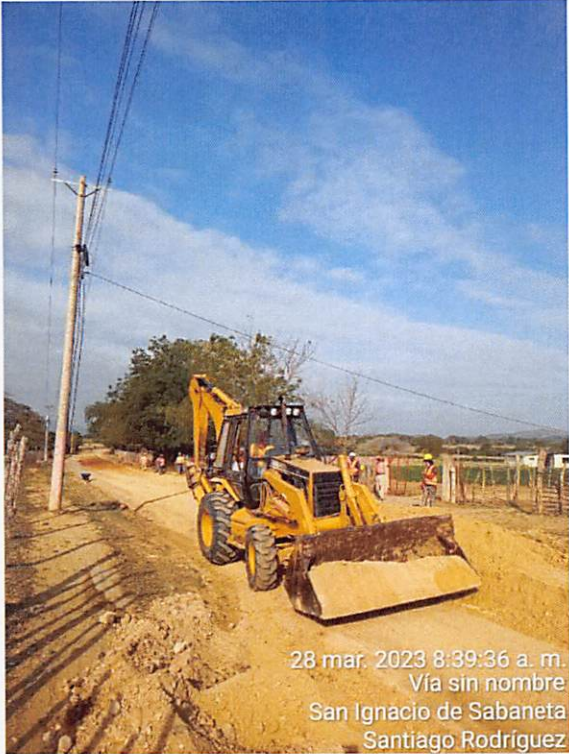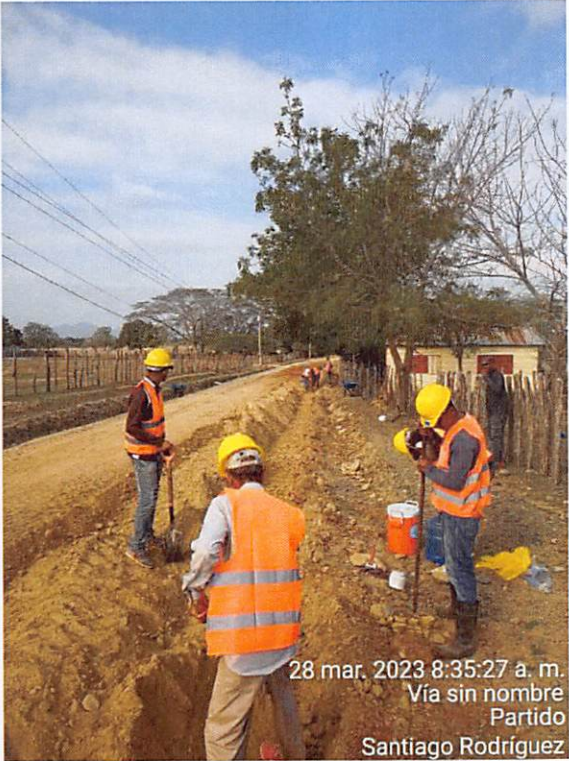



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

3 de abril del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 13/3/2023 A 27/3/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón,
Zona I. - Lote K - Red De Distribución Sector Los Babosos.(Lote II)
Contrato: 106 / 2022
Contratista: Ing. Cristian Tavaréz Gabino
Provincia: Dajabón

Anexo : - Reporte de Cubicación No.1
- Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de distribución

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro y la colocación de 1548.18 mts Tubería Ø4" PVC SDR-26 y 130.08 mts Tubería Ø3" PVC SDR-26.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Ruben Sanchez Robles
Supervisor



Anexos Lote K:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Dajabón
24 de abril del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 3/4/2023 A 21/4/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. - Lote L - Red De Distribución Sector Los Babosos (Lote 12) ✓
Contrato: 107 / 2022 ✓
Contratista: Ing. Maritza Josefa Adonis Tejeda ✓
Provincia: Dajabón \ ✓
Anexo : - Reporte de Cubicación No.1 ✓

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de Distribución

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de 2,030 mts de Tubería Ø3" PVC SDR-26 C/J. G. y la colocación de 1,990.20 mts Tubería Ø3" PVC SDR-26 C/J. G., con su excavación y movimiento de tierra correspondiente.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,



Ing. Gerardo Rafael Aquino
Supervisor




Ing. Ruben Sanchez Robles
Supervisor



Anexos Lote L:

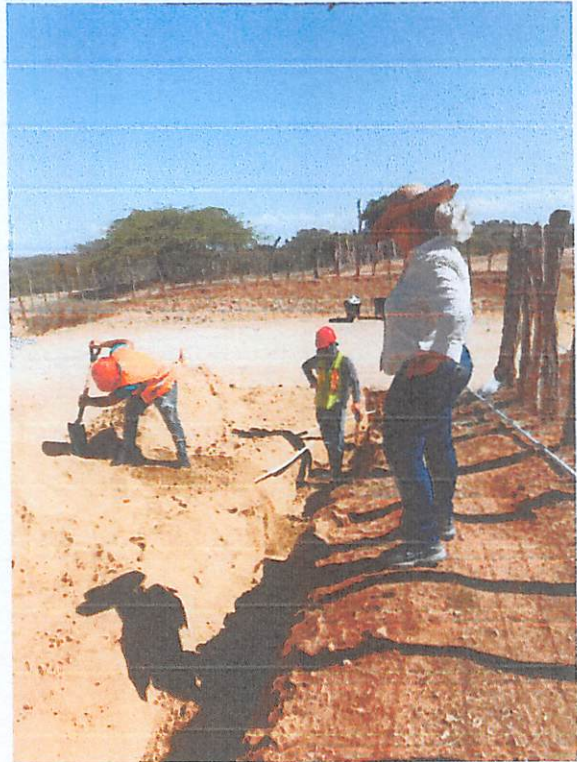



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Dajabón
12 junio del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 15/3/2023 A 21/4/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia No. SNIP 14766 - Lote N - Red De Distribución Sector La Gorra.
Contrato: 110 / 2022
Contratista: Ing. Ignacio Bolívar Ruiz
Provincia: Dajabón

Anexo : - Reporte de Cubicación No.1

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de Distribución

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de 2,900 mts de Tubería Ø3" PVC SDR-26 C/J. G. y la colocación de 2,843.14mts Tubería Ø3" PVC SDR-26 C/J. G., con su excavación y movimiento de tierra correspondiente.


Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,



Ing. Ruben Sanchez Robles
Supervisor

Anexos Lote N:

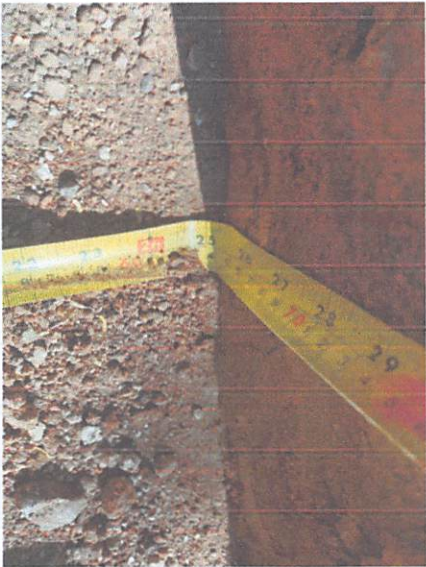



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Dajabón
12 de junio del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2 ✓
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 13/3/2023 A 9/6/2023 ✓

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón Zona I, Lote O- Red De Distribución Sector Aminilla, (Lote III).
Contrato: 111 / 2022
Contratista: Ing. Genaro Abreu Henríquez ✓
Provincia: Dajabón ✓

Anexo : - Reporte de Cubicación No.2 ✓

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Red de Distribución en Tubería de Ø8" PVC SDR-26, L=4,313.85 metros ✓

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de 1,740 mts de Tubería Ø8" PVC SDR-26 C/J. G. y la colocación de 1,689.32mts Tubería Ø8" PVC SDR-26 C/J. G., con su excavación y movimiento de tierra correspondiente.


Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Ruben Sanchez Robles
Supervisor



Anexos Lote O:

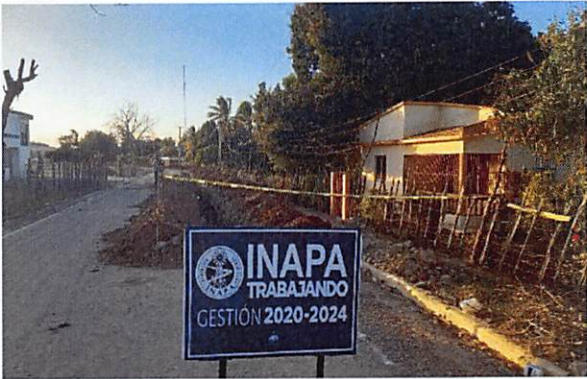



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Dajabón
3 de abril del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1 ✓
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 06/3/2023 A 03/4/2023 ✓

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón,
Zona I. No. Snip 14766 - Lote P - Red de Distribución Sector Aminilla.
Contrato: 112/ 2022 ✓
Contratista: Ing. Juan Ramón Moore Checo. ✓
Provincia: Dajabón

Anexo : Reporte de Cubicación No.1 ✓
-Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de distribución

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de 3,038.78 metros y la colocación de 2,451.00 metros de Tubería Ø3" PVC SDR-26 C/J.G.


Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,



Ing. Rubén Sánchez
Supervisor

Fotos Lote P:

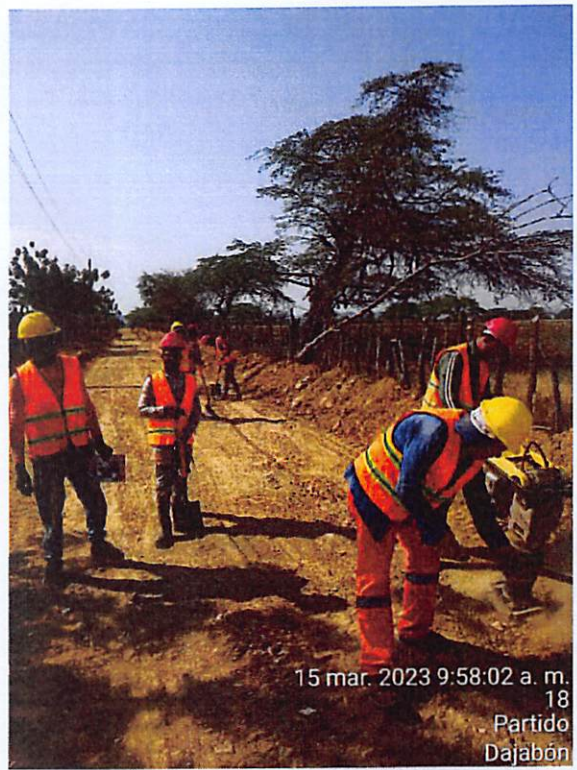



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Dajabón
3 de abril del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 20/3/2023 A 03/4/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra,
Provincia Dajabon, Zona I. No. Snip 14766 - Lote S - Red De Distribución Sector
Hatico Viejo.
Contrato: 115/ 2022
Contratista: Ing. Benito Mora Sánchez.
Provincia: Dajabón

Anexo : Reporte de Cubicación No.1
-Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de distribución

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de 1,044.00 mts y la colocación de 1,023.12 Tubería Ø3" PVC SDR-26. También se está cubicando la colocación de 33 acometidas rurales y colocación de piezas especiales incluyendo todo el movimiento de tierra.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Gerardo Rafael Aquino



Supervisor

Anexos Lote S:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.

20 de marzo de 2023

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1**

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 07/02/2023 A 10/03/2023

Referencia **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO-LA GORRA-PROVINCIA DAJABON, NO. SNIP 14766 LOTE T, LINEA DE CONDUCCION PARTIDO LA GORRA .
Contrato: 116-2022
Contratista: ING. TONY GRULLON MONTILLA
Provincia: DAJABON

Anexo : -Reporte de Cubicación
-Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la Construcción de los siguientes elementos:

- Corte, remoción y bote de carpeta de asfáltica de 2"
- Excavación de material compacto, Colocación colchón de arena con 0.10 m de esp.
- Relleno y compactación con material de mina.
- Suministro y Colocación de tuberías Ø8" SDR26.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:


Al momento de realizar este informe en esta obra se encuentra en un 30 % de ejecución.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe las actividades más destacadas son: la excavación y la colocación de 1,406.50 ml de tuberías de Ø 8" SDR 26


Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Pedro Bienvenido Sosa Hernández
Supervisor de Obras



FOTOS

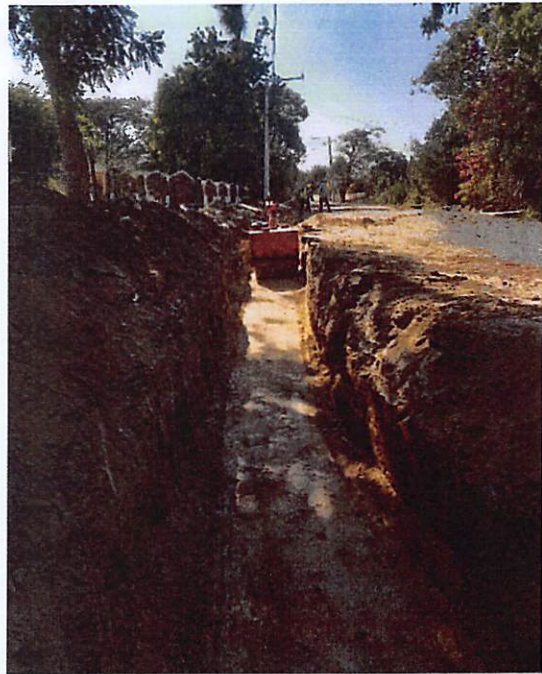



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Dajabón
1 de Mayo del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 1/2/2023 A 28/4/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 - Lote U- Línea De Conducción Partido - La Gorra. Lote 9.

Contrato: 2022-117

Contratista: Constructora IWOKA, S.R.L.

Provincia: Dajabón

Anexo : - Reporte de Cubicación No.1
:- Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de Conducción

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de 4,588.65 mts de Tubería Ø8" PVC SDR-26 C/J. G. y colocación de 4,455.00 mts Tubería Ø8" PVC SDR-26 C/J. G. con su excavación y movimiento de tierra correspondiente.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Ruben Sanchez Robles

Supervisor



Anexos Lote U:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Dajabón
13 de junio de 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 1
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 8/3/2023 A 21/4/2023

Referencia : Obra: Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia
Dajabón Zona I. No. SNIP 14766 - Lote V- Redes De Buen Gusto.
Contrato: 2022-118
Contratista: NUSALEX S.R.L.
Provincia: Dajabón.

Anexo : - Reporte de Cubicación No.1
:- Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de Conducción

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de 2,900 mts de Tubería Ø4" PVC SDR-26 C/J. G. y colocación de 2,843.14 mts Tubería Ø4" PVC SDR-26 C/J. G. con su excavación y movimiento de tierra correspondiente, También corte de asfalto.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Ruben Sanchez Robles
Supervisor



Anexos Lote V:

