



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**(INAPA)**  
**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS**  
**“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**

San Francisco de Macorís, R.D.  
26 de agosto del 2020

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**REPORTE DE CUB. NO. 4**  
**PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 20 DE JUN. - 29 DE JULIO.**

Referencia : **Obra:** Construcción Acueducto del sector Santa Rosa, como  
Extensión del acueducto de Cotui, Provincia Sánchez Ramírez.  
**Contrato:** 050-2019  
**Contratista:** Ing. Danilo José Jiménez Cabral.  
**Provincia:** Sánchez Ramírez

Anexo : - Fotos

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Conexión con deposito existente acueducto de Cotui.
- Estación de bombeo.
- Electrificación y Equipamiento.
- Línea de Impulsión. (Ø 8” PVC SDR-21)
- Construcción Depósito regulador, Capacidad 400 M<sup>3</sup> (Superficial).
- Línea Matriz.( Ø 8” PVC SDR-26)
- Línea de Distribución Y Línea de conducción.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra en proceso de construcción del Depósito regulador, teniendo la zapata completa y el acero para muros y columnas, a la espera de la colocación del encofrado de los muros.

Gran parte de la línea de impulsión colocada, así como de la línea matriz y la totalidad de la línea de distribución y conducción.

### III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe las partidas más importante que se cubica es la colocación del hormigón armado de la zapata de muros, columnas y fondo del deposito regulador, se colocaron en total unos 45.8 metros cúbicos.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


  
Ing. Cesareo Rosario cruz.  
Supervisor Zona III

sh

2



PROCESO TERMINADO

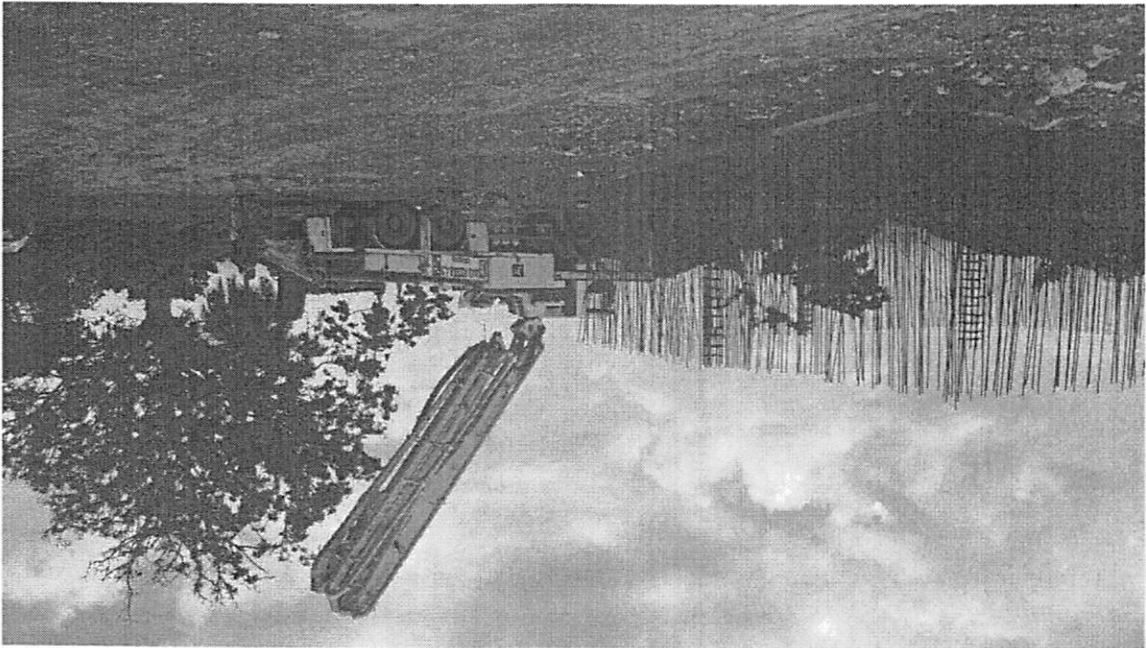

PROCESO COLOCACIÓN HORMIGÓN

FOTOS
