



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES

Santo Domingo, DN.
21 de Noviembre del 2022

INFORME DE CUBICACIÓN NO.1
PERIODO DE EJECUCIÓN: 08/06/2022 al 18/10/2022

Referencia : **Obra:** Ampliación Red De Acueducto Sabana De La Mar, Sector La
Aviación, Provincia Hato Mayor, Lote I
Contrato: 001-2022
Contratista: Ing. Ermenegilda Reyes Frometa
Provincia: Hato Mayor

Anexos : Reporte de Cubicación No.1
: Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Replanteo del terreno 6,936.86 M
- Suministro y colocación de tubería Ø6", Ø4" Y Ø3" PVC SDR-26 C/J.G.
- Suministro y colocación de piezas especiales.
- Suministro y colocación de válvulas.
- Corte y Reposición Carpeta Asfáltica (L=300.00 M)
- Acometidas urbanas Ø ½" (403 Unidades).

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Los avances actuales se corresponde a la colocación de líneas de Ø6", Ø4" y Ø3", acometidas y piezas especiales en algunos puntos. Esta obra se encuentra con un avance de ejecución en un 27.19%.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Entre las partidas a tomar en cuenta para esta cubicación No. 1, de Redes De La Aviación, Están la colocación de tuberías de Ø3'' PVC SDR-26 C/J.G. en una longitud total de 335.00 M, la tubería de Ø4'' en una longitud de 530.20 M de PVC SDR-26 6''C/J.G. y 1,033.80 M de tubería en tramo de Ø6'' PVC SDR-26 6''C/J.G., la colocación de piezas especiales, con 74 acometidas urbanas y 9 rurales ya colocadas.


Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,


Ing. Reyna C. Hernández
Supervisora de Obras



MEMORIA FOTOGRÁFICA

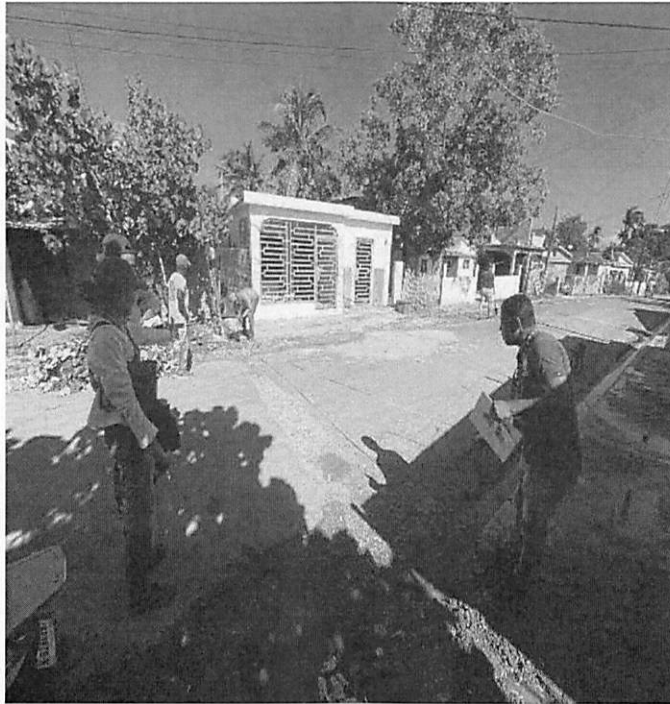



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

**Santo Domingo, D.N.
13 de Diciembre del 2022**

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2 ✓
PERIODO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS: 21/07/2022 al 12/08/2022 ✓**

Referencia : **Obra:** Ampliación De Red De Acueducto Sabana
De La Mar, Sector Los Solares, Provincia Hato Mayor ✓
Lote III
Contrato: 003-2022 ✓
Contratista: Ing. Emmanuel Enrique Peralta Sanabria ✓
Provincia: Hato Mayor ✓

Anexo : - Reporte de Cubicación No.2 d/f 13/12/2022
- Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

LOS TRABAJOS CONTEMPLAN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

A) RED SECTOR LOS SOLARES

- Replanteo De 7,525.69 M
- Movimiento De Tierra Con Un Vol= 5272.41 M3
- Excavación En Roca Con Equipo(Incluye Extracción) 30%
- Excavación Material Compacto Con Equipo)70%
- Suministro Material De Mina Para Relleno(Aprobación Supervisión) 30%
- Relleno Compactado A Cada 0.20 M
- Suministro Y Colocación De
- Asiento De Arena
- Bote De Material Con Camión A Una Distancia De 13Km(Incluye Carguío Y Esparcimiento

- Colocación De Tubería
- Suministro Y Colocación De Válvulas
- Prueba Hidrostática
- Cruce De Alcantarillado Ø 6 Acero L = 3.00 M (2 Ud)
- Acometidas Urbanas
- Señalización
- Varios

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En la actualidad podemos decir que está en un 34.93% y las colocación de unas 41 acometidas en el desarrollo de este proyecto.

ACTIVIDADES DESTACADAS:

Entre las actividades importantes de esta cubicación #2, destaca la partida de movimiento de tierra ocasionada por las fuertes lluvias en esta temporada, por lo que tuvimos que solicitar la remoción del lodo, el relleno y la nivelación de las calles en esta zona. También predominaron la Colocación de 211.40 M de tuberías del Ø3", y de 41 acometidas.

Atentamente,



Ing. Carlos Cuartos Tejeda Guerrero.
Supervisor de Obras



MEMORIA FOTOGRAFICA
