

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Gantt Chart											
						M	enero	P	F	M	marzo	P	F	M	mayo	P	F
1	LINEA DE CONDUCCION Y REDES LOMA DE CHIVO, EL SEIBO	391 días	mié 1/19/22	mié 7/19/23	\$8,514,234.57	[Gantt Chart for Task 1]											
2	Linea de conduccion	73 días	mié 1/19/22	vie 4/29/22	\$3,399,180.11	[Gantt Chart for Task 2]											
3	Replanteo	13 días	mié 1/19/22	vie 2/4/22	\$14,366.31	[Gantt Chart for Task 3]											
4	Corte carpeta asfaltica	56 días	lun 2/7/22	lun 4/25/22	\$56,997.30	[Gantt Chart for Task 4]											
5	Movimiento de tierra	56 días	vie 1/21/22	vie 4/8/22	\$948,424.41	[Gantt Chart for Task 5]											
6	Suministro de tubería	13 días	mié 1/19/22	vie 2/4/22	\$1,667,486.80	[Gantt Chart for Task 6]											
7	Colocación de tubería	56 días	vie 1/21/22	vie 4/8/22	\$40,105.65	[Gantt Chart for Task 7]											
8	Suministro y colocación de piezas especiales	56 días	vie 1/21/22	vie 4/8/22	\$156,054.48	[Gantt Chart for Task 8]											
9	Suministro y colocación de valvulas	56 días	vie 1/21/22	vie 4/8/22	\$206,061.77	[Gantt Chart for Task 9]											
10	Pruebas hidrostáticas en tuberías	2 días	lun 4/11/22	mar 4/12/22	\$17,103.58	[Gantt Chart for Task 10]											
11	Pavimento	13 días	mié 4/13/22	vie 4/29/22	\$271,621.81	[Gantt Chart for Task 11]											
12	Control y manejo tránsito (Incluye uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con	73 días	mié 1/19/22	vie 4/29/22	\$7,500.00	[Gantt Chart for Task 12]											
13	Senalización, control y seguridad en la obra	73 días	mié 1/19/22	vie 4/29/22	\$6,933.00	[Gantt Chart for Task 13]											
14	Limpieza continua y final	73 días	mié 1/19/22	vie 4/29/22	\$6,525.00	[Gantt Chart for Task 14]											
15	Redes de distribución	252 días	lun 5/2/22	mar 4/18/23	\$4,587,361.43	[Gantt Chart for Task 15]											
16	Replanteo	56 días	lun 5/2/22	lun 7/18/22	\$24,250.53	[Gantt Chart for Task 16]											
17	Movimiento de tierra	112 días	lun 5/23/22	mar 10/25/22	\$1,379,913.39	[Gantt Chart for Task 17]											
18	Suministro de tubería	13 días	lun 5/23/22	mié 6/8/22	\$1,061,974.55	[Gantt Chart for Task 18]											

Proyecto: Inapa KGK_ASCM Fecha: mié 11/16/22	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

YMA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Gantt Chart											
						M	P	F	M	P	F	M	P	F	M		
34	Valla anunciando obra 16'x8' Impresión full color conteniendo logo de Inapa, Nombre de Proyecto y Contratista	391 días	mié 1/19/22	mié 7/19/23	\$43,500.00	▶											

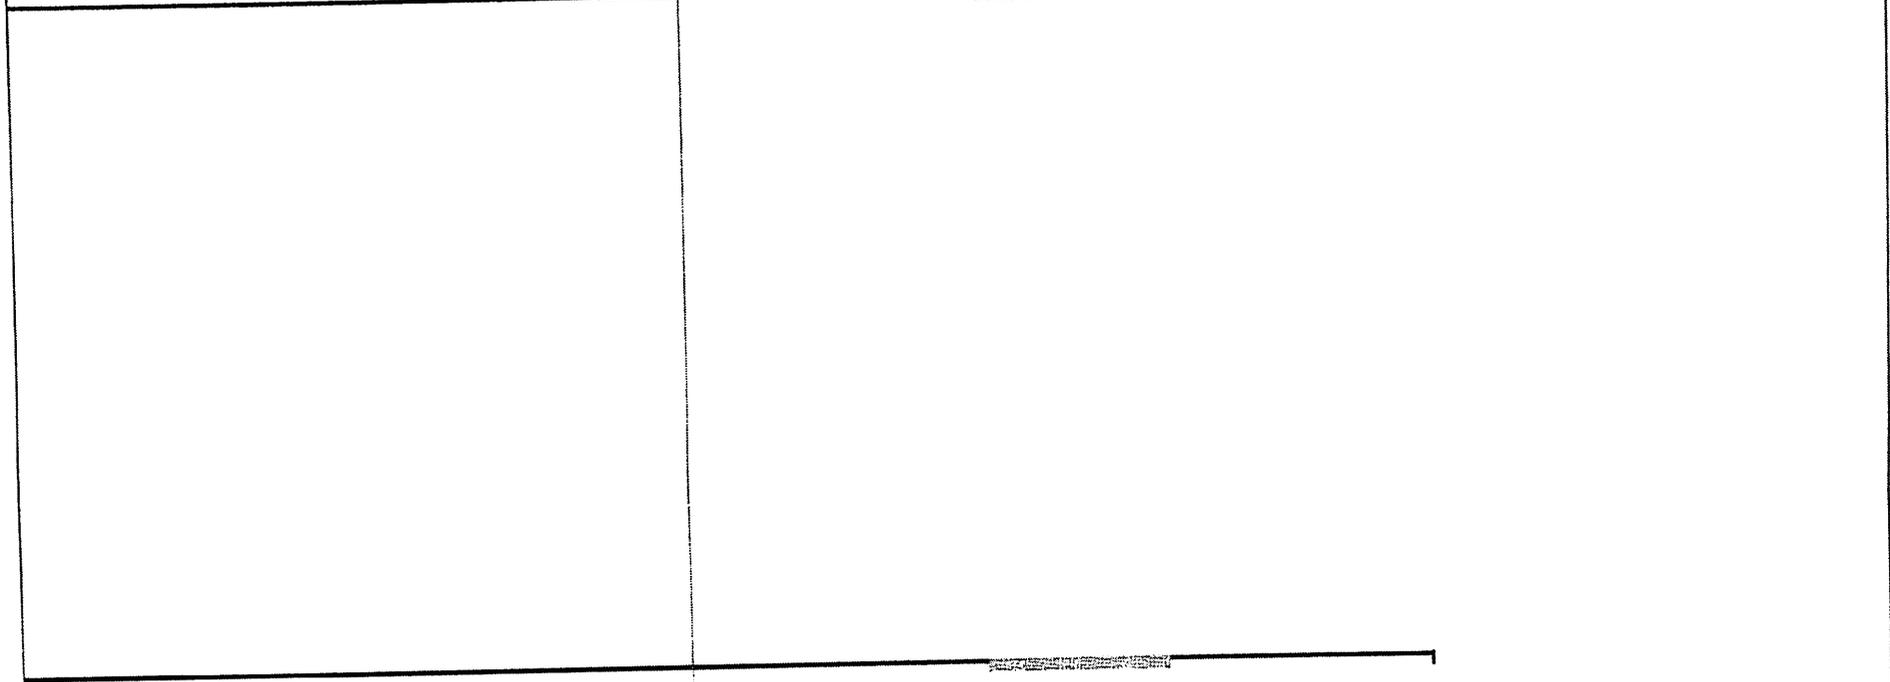
Proyecto: Inapa KGK_ASCM
Fecha: mié 11/16/22

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	\$
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

YAG




julio P F M | septiembre P F M | noviembre P F M | enero P F M | marzo P F M | mayo P F M | julio P



Proyecto: Inapa KGK_ASCM Fecha: mié 11/16/22	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	↓
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo	[Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin]	Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

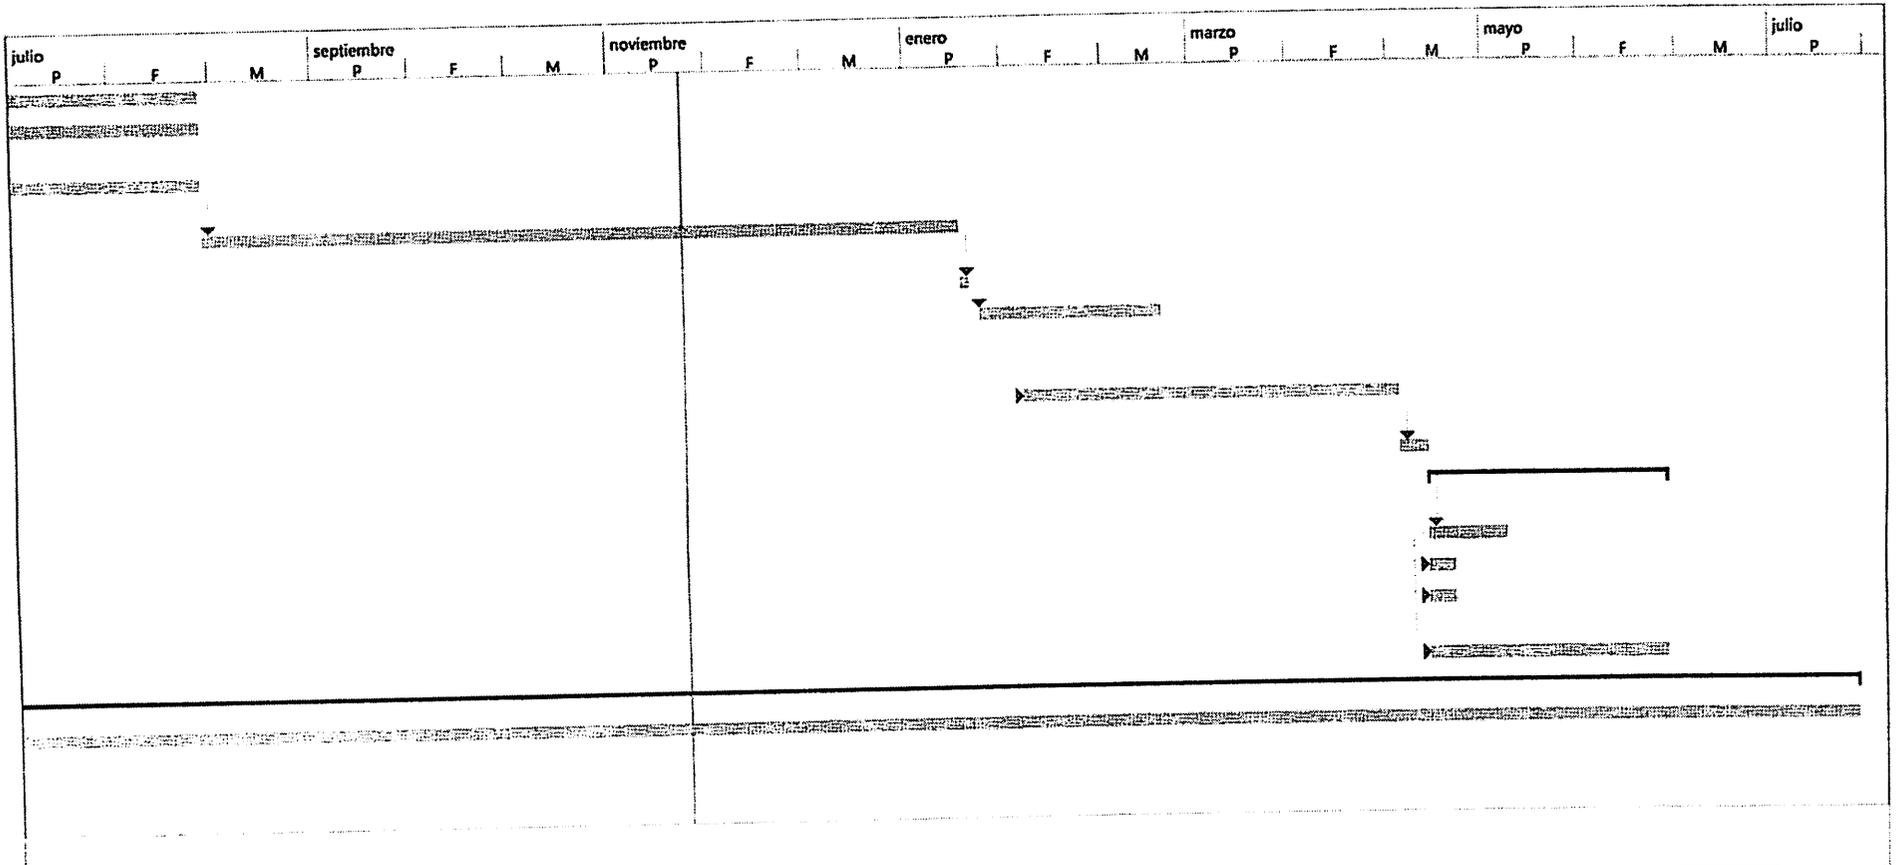Handwritten signature or initials





Proyecto: Inapa KGK_ASCM
 Fecha: mié 11/16/22




Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

9/17



julio P F M | septiembre P F M | noviembre P F M | enero P F M | marzo P F M | mayo P F M | julio P

--	--

Proyecto: Inapa KGK_ASCM Fecha: mié 11/16/22	Tarea  División  Hito  Resumen  Resumen del proyecto 	Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual  solo duración 	Informe de resumen manual  Resumen manual  solo el comienzo  solo fin  Tareas externas 	Hito externo  Fecha límite  Progreso  Progreso manual 
---	--	--	--	---

NY

