

ING. RAMÓN CLEMENTE MORETA TEJEDA
CONTRATISTA

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2023												2024	
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
1		AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO HIGUEY, SECTOR LAS CAOBAS (PARTE 1), PROVINCIA LA ALTAGRACIA	262 days	Wed 25/1/23	Thu 25/1/24	[Gantt bar spanning from Jan 2023 to Feb 2024]													
2		REDES DE DISTRIBUCIÓN	251 days	Wed 8/2/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar spanning from Feb 2023 to Feb 2024]													
3																			
4		Replanteo	35 days	Wed 8/2/23	Tue 28/3/23	[Gantt bar from Feb 2023 to Mar 2023]													
5																			
6		CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA L= 569.63 M	29 days	Wed 29/3/23	Mon 8/5/23	[Gantt bar from Mar 2023 to Apr 2023]													
7		Corte con disco de carpeta asfáltica 2", ambos lado Extracción carpeta asfáltica	21 days	Wed 29/3/23	Wed 26/4/23	[Gantt bar from Mar 2023 to Apr 2023]													
8		Extracción carpeta asfáltica 2"	7 days	Thu 27/4/23	Fri 5/5/23	[Gantt bar from Apr 2023 to May 2023]													
9		Bote de material con camión, incluye carguío D=15 km, (inc. Esparcimiento en lugar de botadero)	1 day	Mon 8/5/23	Mon 8/5/23	[Gantt bar from May 2023 to May 2023]													
10																			
11		MOVIMIENTO DE TIERRA	188 days	Mon 8/5/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar from May 2023 to Feb 2024]													
12		Excavación materia compacto c/equipo	20 days	Mon 8/5/23	Fri 2/6/23	[Gantt bar from May 2023 to Jun 2023]													
13		Excavación en roca c/equipo, Inc. Extracción de material	35 days	Mon 5/6/23	Fri 21/7/23	[Gantt bar from Jun 2023 to Jul 2023]													
14		Asiento de arena (caliza triturada)	17 days	Mon 3/7/23	Tue 25/7/23	[Gantt bar from Jul 2023 to Aug 2023]													
15		Suministro de material de mina para relleno (caliche) D=20 km	25 days	Wed 27/9/23	Tue 31/10/23	[Gantt bar from Sep 2023 to Oct 2023]													
16		Relleno compactado c/compactador mecánico en capa de 0.20 m	74 days	Fri 13/10/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar from Oct 2023 to Feb 2024]													
17		Bote material c/camión, incluye carguío D= 15KM, Inc. Esparcimiento en lugar de botadero	55 days	Wed 8/11/23	Tue 23/1/24	[Gantt bar from Nov 2023 to Feb 2024]													
18																			
19		SUMINISTRO DE TUBERIAS	22 days	Fri 7/7/23	Mon 7/8/23	[Gantt bar from Jul 2023 to Aug 2023]													
20		Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G + 3% pérdida por campana	10 days	Fri 7/7/23	Thu 20/7/23	[Gantt bar from Jul 2023 to Jul 2023]													
21		Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G + 3% pérdida por campana	5 days	Fri 21/7/23	Thu 27/7/23	[Gantt bar from Jul 2023 to Jul 2023]													
22		Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G + 2% pérdida por campana	7 days	Fri 28/7/23	Mon 7/8/23	[Gantt bar from Jul 2023 to Aug 2023]													
23																			

PCM7

Proyecto: CRONOGRAMA AMPLIACIÓN REDES AC. HIGUEY, SE Fecha: Tue 25/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual		

ING. RAMÓN CLEMENTE MORETA TEJEDA
CONTRATISTA

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2023												2024									
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb								
24		COLOCACIÓN DE TUBERÍAS:	22 days	Mon 17/7/23	Tue 15/8/23																						
25		Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G.	10 days	Mon 17/7/23	Fri 28/7/23																						
26		Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G.	5 days	Mon 31/7/23	Fri 4/8/23																						
27		Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.	7 days	Mon 7/8/23	Tue 15/8/23																						
28																											
29		PRUEBA HIDROSTÁTICA PARA TUBERÍA DE:	22 days	Thu 21/9/23	Fri 20/10/23																						
30		Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas	8 days	Thu 21/9/23	Mon 2/10/23																						
31		Ø6" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo sin acometidas	4 days	Tue 3/10/23	Fri 6/10/23																						
32		Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G. tramo con acometidas	10 days	Mon 9/10/23	Fri 20/10/23																						
33																											
34		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES	18 days	Mon 31/7/23	Wed 23/8/23																						
35		Yee Ø 8" X 8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva:	4 days	Mon 31/7/23	Thu 3/8/23																						
36		Yee Ø 8" X 3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva:	4 days	Fri 4/8/23	Wed 9/8/23																						
37		Tee Ø 8" X 8" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva:	2.5 days	Fri 4/8/23	Tue 8/8/23																						
38		Tee Ø 8" X 6" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva:	2.5 days	Tue 8/8/23	Thu 10/8/23																						
39		Tee Ø 8" X 3" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva:	3 days	Thu 10/8/23	Mon 14/8/23																						
40		Tee Ø 3" X 3" PVC Presión SCH-40	3 days	Thu 10/8/23	Mon 14/8/23																						
41		Cruz Ø 3" X 3" PVC Presión SCH-40	1.5 days	Tue 15/8/23	Wed 16/8/23																						
42		Codo de Ø 3" X 45° PVC Presión SCH-40	1.5 days	Wed 16/8/23	Thu 17/8/23																						
43		Junta Tapón de Ø 3" PVC Presión SCH-40	4 days	Fri 18/8/23	Wed 23/8/23																						
44		Junta mecánica tipo Dresser de Ø 3" DE 150 PSI	2.5 days	Thu 10/8/23	Mon 14/8/23																						
45		Junta mecánica tipo Dresser de Ø 6" DE 150 PSI	3 days	Mon 14/8/23	Thu 17/8/23																						
46		Junta mecánica tipo Dresser de Ø 8" DE 150 PSI	3.5 days	Tue 15/8/23	Fri 18/8/23																						
47		Anclajes H.S P/Piezas, según detalle	7 days	Fri 4/8/23	Mon 14/8/23																						
48																											


RCMT

Proyecto: CRONOGRAMA AMPLIACIÓN REDES AC. HIGUEY, SE
Fecha: Tue 25/4/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

ING. RAMÓN CLEMENTE MORETA TEJEDA
CONTRATISTA

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2023												2024			
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb		
49		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	13 days	Thu 24/8/23	Mon 11/9/23																
50		Válvula de compuerta Ø8" HF platillada completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y dos juntas mecánicas tipo Dresser)	5 days	Thu 24/8/23	Wed 30/8/23																
51		Válvula de compuerta Ø6" HF platillada completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y dos juntas mecánicas tipo Dresser)	4 days	Thu 31/8/23	Tue 5/9/23																
52		Válvula de compuerta Ø3" HF platillada completa 150 psi (inc. Tornillos, junta de goma, niples platillados y dos juntas mecánicas tipo Dresser)	4 days	Wed 6/9/23	Mon 11/9/23																
53		Cajas telescópicas en H.F. para válvula, según detalle	1.5 days	Thu 31/8/23	Fri 1/9/23																
54																					
55		ASFALTO	14.5 days	Wed 8/11/23	Tue 28/11/23																
56		Riesgo adherencia	2 days	Wed 8/11/23	Thu 9/11/23																
57		Imprimación con arena	5 days	Fri 10/11/23	Thu 16/11/23																
58		Suministro de asfalto en planta esponjado	1.5 days	Fri 17/11/23	Mon 20/11/23																
59		Colocación carpeta asfáltica 2"	5 days	Tue 21/11/23	Tue 28/11/23																
60		Transporte asfalto D= 30 km	5 days	Mon 20/11/23	Mon 27/11/23																
61																					
62		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE (INCLUYE HIDRANTE, JUNTAS DRESSER, VÁLVULAS DE COMPUERTA, NIPLE, TEE, CODO, MOV. DE B.TIERRA, ANCLAJE Y M.O)	7 days	Tue 12/9/23	Wed 20/9/23																
63		Hidrante en tubería de Ø 6" completo	7 days	Tue 12/9/23	Wed 20/9/23																
64																					
65		ACOMETIDAS	12 days	Mon 23/10/23	Tue 7/11/23																
66		Acometidas urbanas, incluye caja registro y valvula de paso c/tubería de polietileno	2 days	Mon 23/10/23	Tue 24/10/23																
67		Acometidas rural, incluye caja registro y valvula de paso c/tubería de polietileno	10 days	Wed 25/10/23	Tue 7/11/23																
68																					
69		REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES	5.5 days	Wed 8/11/23	Wed 15/11/23																

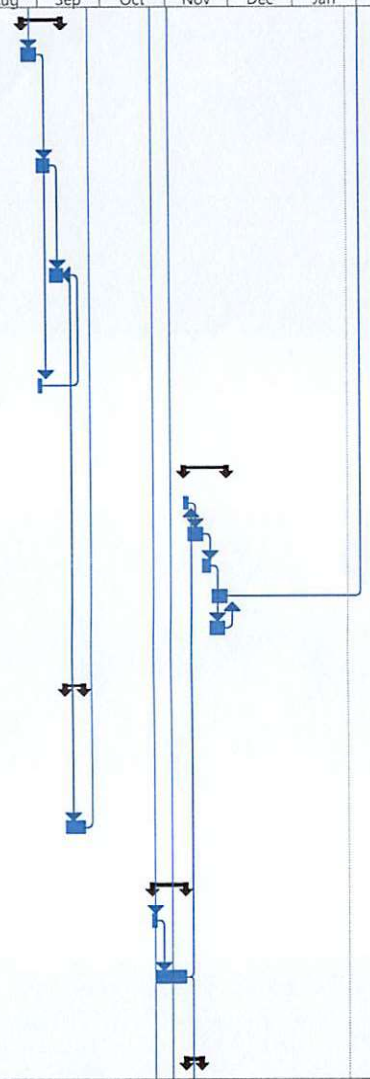

RCMT

Proyecto: CRONOGRAMA AMPLIACIÓN REDES AC. HIGUEY, SE Fecha: Tue 25/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso		
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual		

ING. RAMÓN CLEMENTE MORETA TEJEDA
CONTRATISTA

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2023												2024				
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb			
70																						
71		DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONTENES Y ACERAS	5.5 days	Wed 8/11/23	Wed 15/11/23																	
72																						
73						DEMOLICIÓN:	2.5 days	Wed 8/11/23	Fri 10/11/23													
74						De contenes y aceras	2 days	Wed 8/11/23	Thu 9/11/23													
75						Bote de material con camión D= 15 km, (incluye carguo y esparcimiento en lugar de botadero)	0.5 days	Fri 10/11/23	Fri 10/11/23													
76																						
77		REPOSICIÓN DE:	3 days	Fri 10/11/23	Wed 15/11/23																	
78		Acera perimetral 0.80 m (hormigon industrial 210 kg/cm2, reforzado con fibra de polipropileno)	1.5 days	Tue 14/11/23	Wed 15/11/23																	
79		Contenes	1.5 days	Fri 10/11/23	Mon 13/11/23																	
80																						
81		EMPALME A TUBERIA EXISTENTE	2 days	Mon 23/10/23	Tue 24/10/23																	
82		Empalme, inc. Movimiento de tierra, personal, equipos y herramientas	2 days	Mon 23/10/23	Tue 24/10/23																	
83																						
84		Señalización, control, manejo de tránsito y seguridad en la via, (incluye uso de letrero con base en angulares, uso de conos refractarios, luces intermitentes color ambar con cargadores solares, bbarrera de peligro naranja y hombres con banderolas)	215 days	Wed 29/3/23	Tue 23/1/24																	
85		Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas menores) con tramos de alta pendiente	53 days	Thu 9/11/23	Mon 22/1/24																	
86																						
87		VARIOS	261 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24																	
88		Valla anunciando obra 16' x 8' impresión full color, conteniendo logo de INAPA, nombre del proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 11/2" x 1" y soportes en tubo 4" x 4".	7 days	Wed 1/2/23	Thu 9/2/23																	

Proyecto: CRONOGRAMA AMPLIACIÓN REDES AC. HIGUEY, SE
Fecha: Tue 25/4/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas
División		Tarea manual		Hito externo
Hito		solo duración		Fecha límite
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual

RCMT

ING. RAMÓN CLEMENTE MORETA TEJEDA
CONTRATISTA

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2023												2024	
						Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
89		Campamento, (incluye: Alquiler de casa o sin solar, baños portatil y caseta de materiales)	261 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar for task 89]													
90																			
91		GASTOS INDIRECTOS	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar for task 91]													
92		Honorarios profesionales	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar for task 92]													
93		Transporte	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar for task 93]													
94		Supervisión de la obra	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar for task 94]													
95		Ley 6-86	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar for task 95]													
96		Seguro póliza y fianza	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar for task 96]													
97		Gastos administrativo	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar for task 97]													
98		ITBIS (ley 07-2007)	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar for task 98]													
99		CODIA	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar for task 99]													
100		Imprevistos	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar for task 100]													
101		Mantenimiento y Operación de Sistemas INAPA	260.5 days	Wed 25/1/23	Wed 24/1/24	[Gantt bar for task 101]													



Proyecto: CRONOGRAMA AMPLIACIÓN REDES AC. HIGUEY, SE Fecha: Tue 25/4/23	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	
