



ID	Task Mode	Name	Duration	Start	Finish	Half 2, 2021					Half 1, 2022					Half 2, 2022				
						J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S
0		CRONOGRAMA ACUEDUCTO EL LIMON	314 days	Wed 8/18/21	Thu 8/18/22															
1		LÍNEA DE IMPULSIÓN	314 days	Wed 8/18/21	Thu 8/18/22															
2		Replanteo	42 days	Wed 8/18/21	Tue 10/5/21															
3		MOVIMIENTO DE TIERRA	152 days	Wed 10/6/21	Thu 3/31/22															
4		Excavación de material no clasificado c/equipo	42 days	Wed 10/6/21	Tue 11/23/21															
5		Asiento de arena	14 days	Wed 11/24/21	Thu 12/9/21															
6		Compactado de material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20m	21 days	Mon 2/28/22	Wed 3/23/22															
7		Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en lugar de botadero)	7 days	Thu 3/24/22	Thu 3/31/22															
8		SUMINISTRO DE TUBERÍA	21 days	Wed 11/24/21	Fri 12/17/21															
9		De Ø6 PVC (SDR-21) c/J.G. + 3% pérdida por campana	21 days	Wed 11/24/21	Fri 12/17/21															
10		COLOCACIÓN DE TUBERÍA	61 days	Sat 12/18/21	Sat 2/26/22															
11		De Ø6 PVC (SDR-21) c/J. G.	61 days	Sat 12/18/21	Sat 2/26/22															
12		EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE	148 days	Mon 2/28/22	Thu 8/18/22															
13		Desde Pozo No. 2 a tubería existente de Ø6 PVC (SDR-21) (Incluye movimiento de tierra, corte de tubería, 2Ud Tee 6x6 SCH-40, 1Ud Codo 6x90° SCH-40)	42 days	Mon 2/28/22	Sat 4/16/22															
14		Recubrimiento Tubería de Ø6 PVC (SDR-21) existente (Incluye movimiento de tierra, corte de tubería y colocación pieza)	70 days	Mon 5/30/22	Thu 8/18/22															
15		PRUEBA HIDROSTÁTICA	36 days	Mon 4/18/22	Sat 5/28/22															
16		Tubería de Ø6 PVC (SDR-21)	36 days	Mon 4/18/22	Sat 5/28/22															
17		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	6 days	Mon 2/28/22	Sat 3/5/22															
18		Codo de Ø6 x 90° SCH-40	1 day	Mon 2/28/22	Mon 2/28/22															
19		Codo de Ø6 x 20° SCH-40	1 day	Tue 3/1/22	Tue 3/1/22															
20		Tee de Ø6 x Ø6 SCH-40	1 day	Wed 3/2/22	Wed 3/2/22															
21		Junta mecánica Tipo Dresser Ø6 150 PSI	1 day	Thu 3/3/22	Thu 3/3/22															

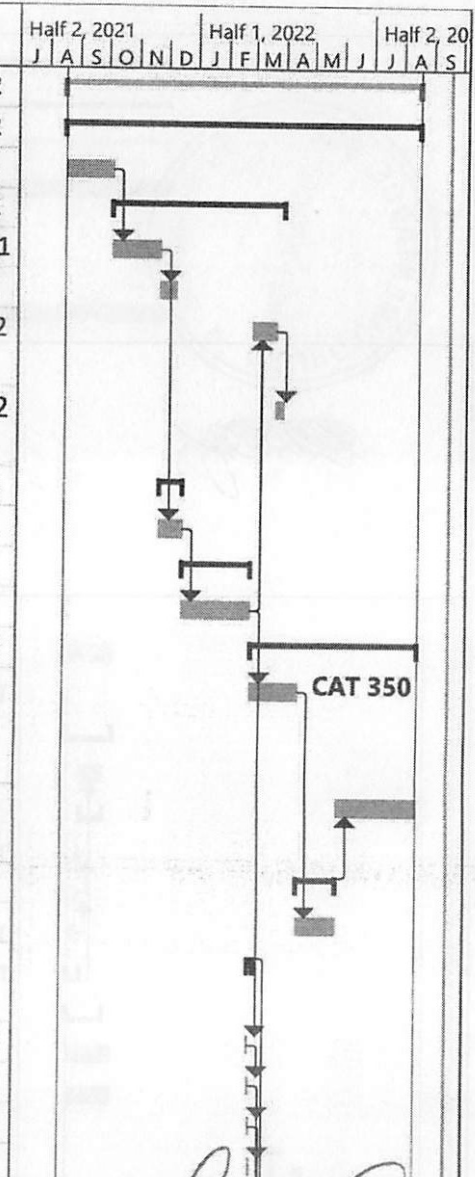

Project: CRONOGRAMA ACUED Date: Mon 9/19/22	Task	█	Inactive Summary	▤	External Tasks	█
	Split	⋯	Manual Task	█	External Milestone	◆
	Milestone	◆	Duration-only	█	Deadline	↓
	Summary	▬	Manual Summary Rollup	█	Critical	█
	Project Summary	▬	Manual Summary	▬	Critical Split	⋯
	Inactive Task	□	Start-only	⌈	Progress	▬
	Inactive Milestone	⊕	Finish-only	⌋	Manual Progress	▬



ID	Task Mode	Name	Duration	Start	Finish	Half 2, 2021					Half 1, 2022					Half 2, 2022					
						J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	
22		Anclaje de H. A. para Codos (Según diseño)	3 days	Wed 3/2/22	Fri 3/4/22																
23		Anclaje de H. A. para Tee (Según diseño)	3 days	Thu 3/3/22	Sat 3/5/22																
24		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	38 days	Mon 3/7/22	Tue 4/19/22																
25		Válvula de Aire simple de Ø1 H.F. 150 PSI, a colocar en tubería de Ø6 completa (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas y junta de	3 days	Mon 3/7/22	Wed 3/9/22																
26		Válvula de Desagüe de Ø4 H.F. 150 PSI platillada completa en tub	7 days	Thu 3/10/22	Thu 3/17/22																
27		Registro para Válvula (Según diseño)	21 days	Fri 3/18/22	Mon 4/11/22																
28		Caja Telescópica para Válvula de Desagüe (Según diseño)	7 days	Tue 4/12/22	Tue 4/19/22																
29		Uso de de Bomba de Achique Ø3	5 days	Thu 3/10/22	Tue 3/15/22																
30		SEÑALIZACIÓN, CONTROL, MANEJO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD EN	40 days	Wed 8/18/21	Sat 10/2/21																
31		LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramien	40 days	Wed 8/18/21	Sat 10/2/21																
32		ACONDICIONAMIENTO CAMPO DE POZO NO. 3	32 days	Wed 8/18/21	Thu 9/23/21																
33		PRELIMINARES	11 days	Wed 8/18/21	Mon 8/30/21																
34		Limpieza y desbroce de malezas	7 days	Wed 8/18/21	Wed 8/25/21																
35		Bote de material c/camión distancia 5KM (incluye esparcimiento	2 days	Thu 8/26/21	Fri 8/27/21																
36		Pintura acrílica calidad superior Caseta de Bombeo	2 days	Sat 8/28/21	Mon 8/30/21																
37		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA	21 days	Tue 8/31/21	Thu 9/23/21																
38		Instalación de Equipo de Bombeo y Accesorios	21 days	Tue 8/31/21	Thu 9/23/21																
39		VARIOS	40 days	Wed 8/18/21	Sat 10/2/21																
40		Valla anunciando Obra 20' x 10' Impresión Full Color conteniendo lo	1 day	Wed 8/18/21	Wed 8/18/21																
41		Campamento (Incluye alquiler solar y casa de materiales)	40 days	Wed 8/18/21	Sat 10/2/21																

L E G E N D A

[Handwritten Signature]



Project: CRONOGRAMA ACUED
Date: Mon 9/19/22

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	
