



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)**

**DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES**

**I. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

<b>INFORMACIÓN</b>	
Nombre del proyecto	-ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROVINCIA VALVERDE
Provincia	Valverde
Contrato	080-2003
Contratista	-ING. MILTON A. FRANCO B Y JUAN PORTALATÍN
Monto contratado	RD\$225,164,167.66
Duración del proyecto	2.5 años
Periodo de ejecución	Trimestre Octubre – Diciembre 2023
Monto ejecutado	RD\$2,041,225,283.39
% Avance financiero de las obras	65.00%
% Avance físico	48.0%



# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

---




Imágenes





# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

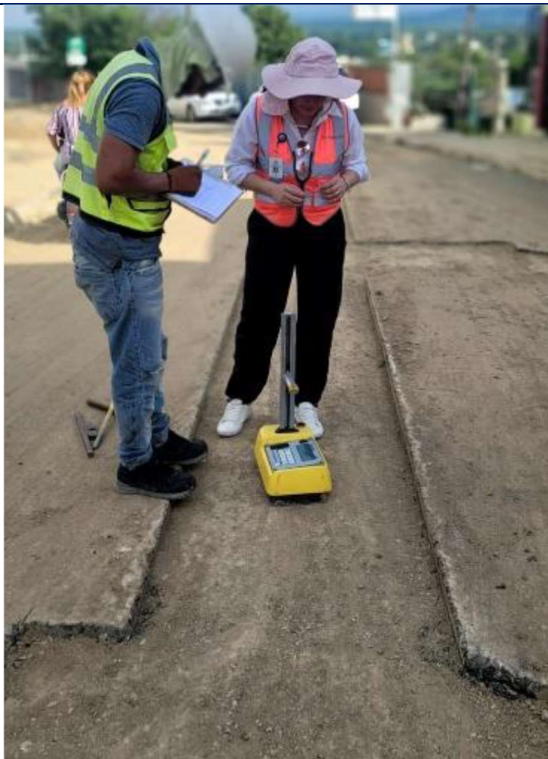





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)



*Cristian Feliz*

**Ing. Cristian Félix Pérez**

Coordinador de Proyectos

Dirección de Programas y Proyectos Especiales

