



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

*** INAPA ***

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

INFORME TÉCNICO

Proyecto:

- AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE AZUA, EXTENSIÓN SECTOR EL HOYO, PROVINCIA AZUA

Contrato:

- 021/2021

Contratista:

- Juan José Contreras

Fecha Período:

- Del 03/9/21 al 18/04/22

I-Descripción General del Proyecto

Este proyecto surge por la ausencia de sistema de alcantarillado sanitario, lo que podría provocar el brote de enfermedades, si las aguas residuales no son colectadas y tratadas adecuadamente, afectando de este modo a los habitantes y fuentes de agua potable de la comunidad.

Con el proyecto se busca dotar a la comunidad del servicio de alcantarillado sanitario, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida de los moradores del entorno, mediante la reducción de la presencia de enfermedades hídricas en la zona.

A continuación, Descripción del sistema:

Tipo de sistema: Por gravedad.

- **N° de acometidas:** 120 unidades, 8"x4" PVC
 - **Línea colectora:** Ø8" PVC (SDR-32.5), con J. G., Long. = 1,350.00m,
 - Ø8" Acero Cruce Canaleta, Long. = 30.00 m.
 - **Registros de inspección:** 34 unidades, H.A. Prefabricados
- Tratamiento:** Planta Depuradora municipal de Azua (Tecnología lagunas de Estabilización)

Objetivos principales:

Se propone ampliación la red colectora municipal, dentro de lo cual se ejecutarán las siguientes actividades:

- Colocación de Tuberías
- Construcción Registro H.A. prefabricados.
- Además considerar:

Reposición de asfalto longitud 200m, colocación acometidas domiciliaria 120 unidades 8x4, reparación de servicios existentes potables, Reposición de canaleta y proteger con torta de hormigón espesor 10cm tramo entre registro R-24 al R-25 longitud 45m



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS


***** INAPA *****

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

II-Avance actual de la obra.

A la fecha el contratista en la provincia de Azua ha avanzado en el suministro y colocación de tuberías en la Red Colectora e instalación de acometidas Domiciliarias, dentro de este período de cubicación se a realizaron las siguientes actividades: Excavación de zanja, regularización de zanja, colocación de tuberías, construcción de registros, instalaciones de acometidas de s. La obra tiene un avance de 100%.

IV -Resumen Fotográfico

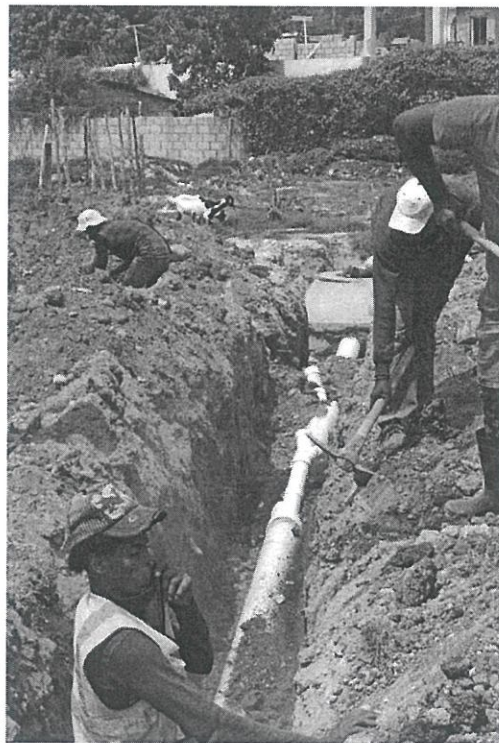




INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

*** INAPA ***

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

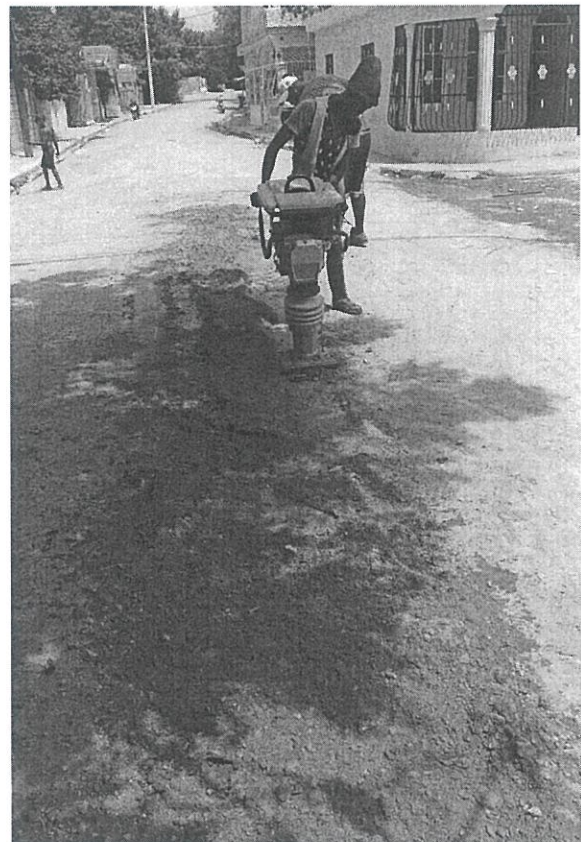

Preparado por:

Amelia Rodríguez
Ing. Amelia Rodríguez

Coordinadora de Proyectos

Dirección de Programas y Proyectos Especiales
