CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, S.R.L

No. EXPEDIENTE
INAPA-CCC--CP-2020-0017

31-ago.-21

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS - INAPA -**
**LICITACION INAPA-CCC-CP-2020-0017**
**RECONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS - GALEON, PARTE LAS TABLAS, ACUEDUCTO PERAVIA, PROVINCIA PERAVIA..**

## CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

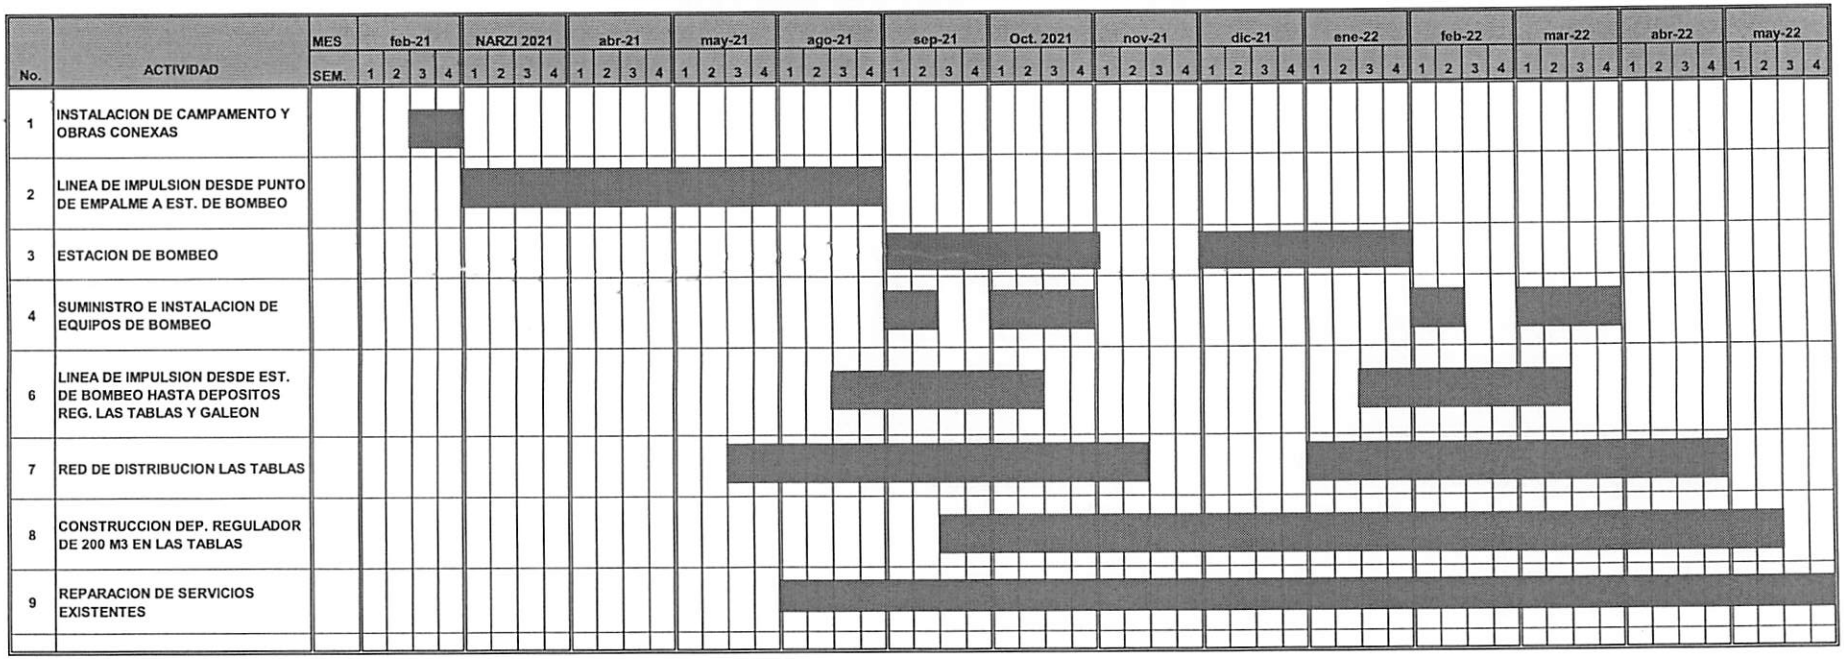


Firma _____
Sello:
**Ing. Carlos José Leal Arias.**

31 de Agosto del 2021

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SANITARIOS, S.R.L

No. EXPEDIENTE
INAPA-CCC--CP-2020-0017

31-ago.-21

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS - INAPA -**
**LICITACION INAPA-CCC-CP-2020-0017**
**RECONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS TABLAS - GALEON, PARTE LAS TABLAS, ACUEDUCTO PERAVIA, PROVINCIA PERAVIA..**

## CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

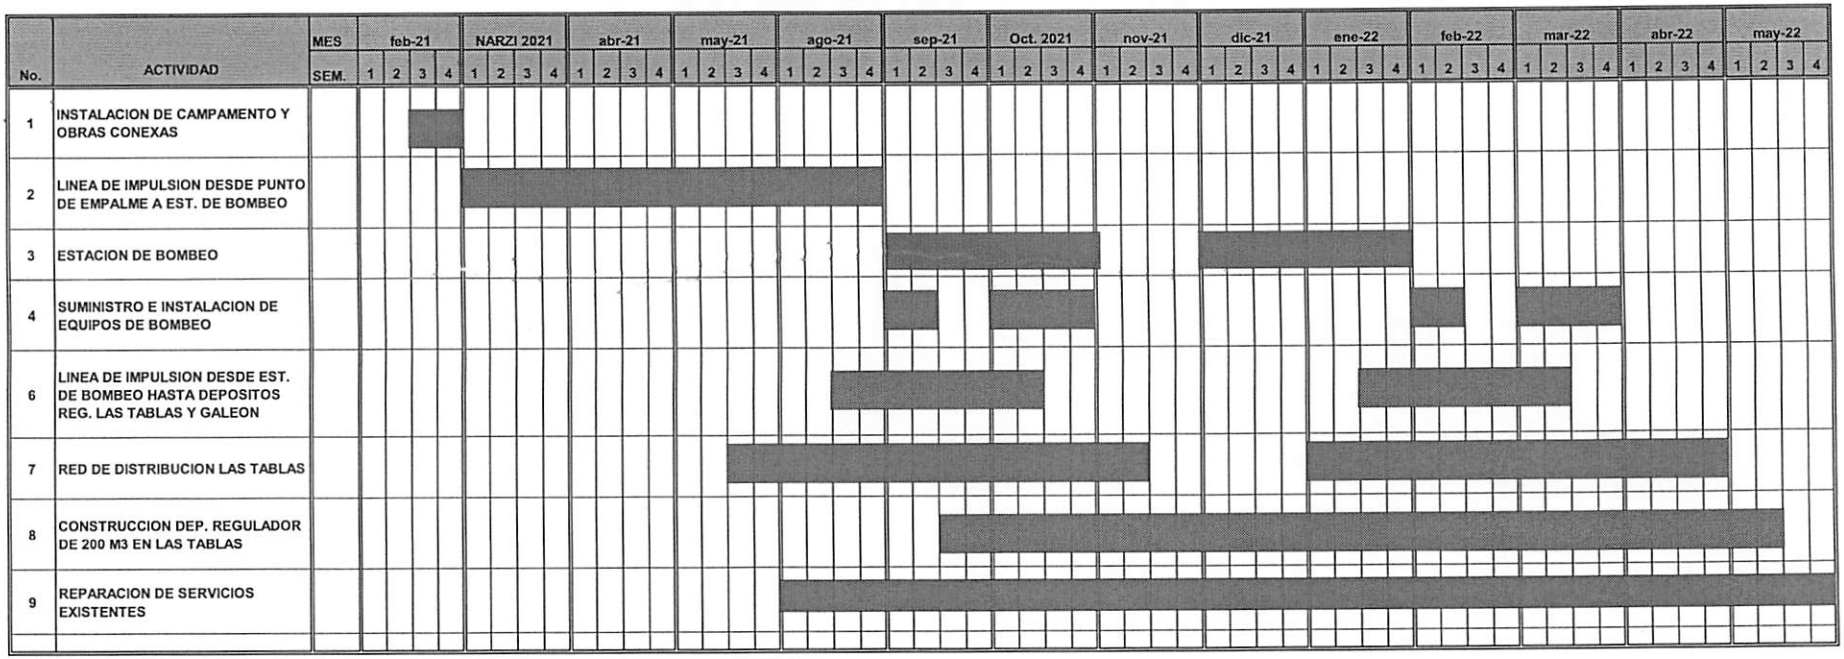


Firma _____
Sello:
**Ing. Carlos José Leal Arias.**

31 de Agosto del 2021

| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % completado | % físico completado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROYECTO 19-00385- LINEA SANITARIA | 435 días | lun 30/11/20 | mar 17/5/22 | 34% | 0% |
| 2 | ACTA DE INICIO | 1 día | lun 30/11/20 | lun 30/11/20 | 100% | 0% |
| 3 | PROCURAS COMPLETADA | 57 días | jue 25/3/21 | lun 10/5/21 | 100% | 0% |
| 4 | COMPRA DE TUBERIA DE 30" FALTANTE | 0 días | vie 9/4/21 | vie 9/4/21 | 100% | 0% |
| 5 | COMPRA DE TUBERIA DE 24" PVC SDR 26 | 0 días | lun 10/5/21 | lun 10/5/21 | 100% | 0% |
| 6 | FABRICACION DE REGISTROS SANITARIOS | 0 días | jue 25/3/21 | jue 25/3/21 | 100% | 0% |
| 7 | COMPRA DE INSERTATEE Y MATERIALES ACOMETIDAS | 0 días | vie 26/3/21 | vie 26/3/21 | 100% | 0% |
| 8 | CONSTRUCCION | 389 días | mié 10/2/21 | mar 17/5/22 | 34% | 0% |
| 9 | INSTALACION DE LINEA 30" HDPE | 122 días | mié 10/2/21 | jue 2/9/21 | 90% | 33% |
| 10 | INSTALACION DE REGISTROS DE H.A DE LINEA 30" (1,5 mt x 2 mt ) | 45 días | lun 29/3/21 | sáb 25/9/21 | 90% | 0% |
| 11 | INSTALACION DE LINEA 24" PVC SDR-26 | 19 días | sáb 30/10/21 | lun 22/11/21 | 0% | 0% |
| 12 | INSTALACION DE ACOMETIDAS SANITARIAS EN LINEA DE 30" | 33 días | mar 21/9/21 | jue 28/10/21 | 0% | 0% |
| 13 | ASFALTADO | 15 días | lun 1/11/21 | jue 18/11/21 | 0% | 0% |
| 14 | INSTALACION DE NUEVOS REGISTROS PRESURL LINEA DE 24" | 25 días | mié 17/11/21 | mié 15/12/21 | 0% | 0% |
| 15 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO | 265 días | jue 1/4/21 | mar 17/5/22 | 10% | 0% |

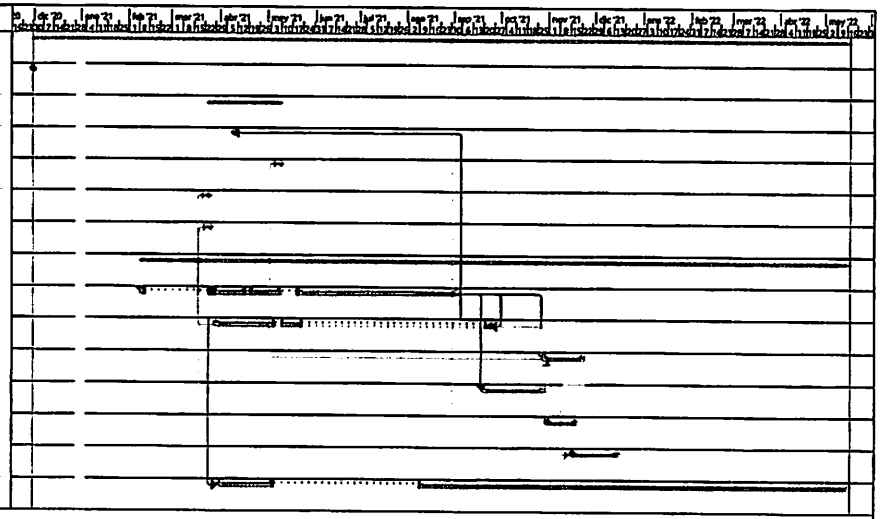


ABI-KARAM MORLLA
INGENIEROS ARQUITECTOS

Proyecto: CRONOGRAMA BAN
Fecha: mar 31/8/21

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Hito | | Resumen del proyecto | | Tareas críticas | | Progreso | |
| División | | Resumen | | Fecha límite | | División crítica | | Tareas divididas | |
