ID	Task Mode	Name	Duration	Start	Finish
0		**CRONOGRAMA ACUEDUCTO EL LIMON**	**314 days**	**Wed 8/18/21**	**Thu 8/18/22**
1		**LÍNEA DE IMPULSIÓN**	**314 days**	**Wed 8/18/21**	**Thu 8/18/22**
2		Replanteo	42 days	Wed 8/18/21	Tue 10/5/21
3		**MOVIMIENTO DE TIERRA**	**152 days**	**Wed 10/6/21**	**Thu 3/31/22**
4		Excavación de material no clasificado c/equipo	42 days	Wed 10/6/21	Tue 11/23/21
5		Asiento de arena	14 days	Wed 11/24/21	Thu 12/9/21
6		Compactado de material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20m	21 days	Mon 2/28/22	Wed 3/23/22
7		Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en lugar de botadero)	7 days	Thu 3/24/22	Thu 3/31/22
8		**SUMINISTRO DE TUBERÍA**	**21 days**	**Wed 11/24/21**	**Fri 12/17/21**
9		De Ø6 PVC (SDR-21) c/J.G. + 3% pérdida por campana	21 days	Wed 11/24/21	Fri 12/17/21
10		**COLOCACIÓN DE TUBERÍA**	**61 days**	**Sat 12/18/21**	**Sat 2/26/22**
11		De Ø6 PVC (SDR-21) c/J. G.	61 days	Sat 12/18/21	Sat 2/26/22
12		**EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE**	**148 days**	**Mon 2/28/22**	**Thu 8/18/22**
13		Desde Pozo No. 2 a tubería existente de Ø6 PVC (SDR-21) (Incluye movimiento de tierra, corte de tubería, 2Ud Tee 6x6 SCH-40, 1Ud Codo 6x90° SCH-40)	42 days	Mon 2/28/22	Sat 4/16/22
14		Recubrimiento Tuberia de Ø6 PVC (SDR-21) existente (Incluye movimiento de tierra, corte de tubería y colocación pieza)	70 days	Mon 5/30/22	Thu 8/18/22
15		**PRUEBA HIDROSTÁTICA**	**36 days**	**Mon 4/18/22**	**Sat 5/28/22**
16		Tubería de Ø6 PVC (SDR-21)	36 days	Mon 4/18/22	Sat 5/28/22
17		**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA**	**6 days**	**Mon 2/28/22**	**Sat 3/5/22**
18		Codo de Ø6 x 90º SCH-40	1 day	Mon 2/28/22	Mon 2/28/22
19		Codo de Ø6 x 20º SCH-40	1 day	Tue 3/1/22	Tue 3/1/22
20		Tee de Ø6 x Ø6 SCH-40	1 day	Wed 3/2/22	Wed 3/2/22
21		Junta mecánica Tipo Dresser Ø6 150 PSI	1 day	Thu 3/3/22	Thu 3/3/22

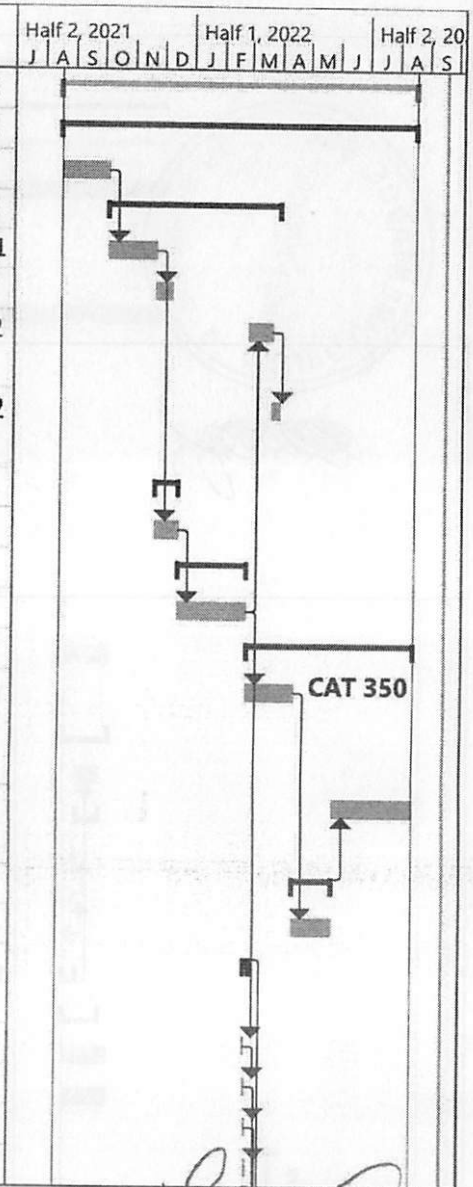

Project: CRONOGRAMA ACUED
Date: Mon 9/19/22

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

GRUPO CIMENTADOS, SRL
RNC: 1-31-97336-1
Santo Domingo, R.D.

ID	Task Mode	Name	Duration	Start	Finish
22		Anclaje de H. A. para Codos (Según diseño)	3 days	Wed 3/2/22	Fri 3/4/22
23		Anclaje de H. A. para Tee (Según diseño)	3 days	Thu 3/3/22	Sat 3/5/22
24		**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS**	**38 days**	**Mon 3/7/22**	**Tue 4/19/22**
25		Válvula de Aire simple de Ø1 H.F. 150 PSI, a colocar en tubería de Ø6 completa (Incluye niple platillado, tornillos, tuercas y junta de	3 days	Mon 3/7/22	Wed 3/9/22
26		Válvula de Desagüe de Ø4 H.F. 150 PSI platillada completa en tub	7 days	Thu 3/10/22	Thu 3/17/22
27		Registro para Válvula (Según diseño)	21 days	Fri 3/18/22	Mon 4/11/22
28		Caja Telescópica para Válvula de Desagüe (Según diseño)	7 days	Tue 4/12/22	Tue 4/19/22
29		Uso de de Bomba de Achique Ø3	5 days	Thu 3/10/22	Tue 3/15/22
30		SEÑALIZACIÓN, CONTROL, MANEJO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD EN	40 days	Wed 8/18/21	Sat 10/2/21
31		LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramien	40 days	Wed 8/18/21	Sat 10/2/21
32		**ACONDICIONAMIENTO CAMPO DE POZO NO. 3**	**32 days**	**Wed 8/18/21**	**Thu 9/23/21**
33		**PRELIMINARES**	**11 days**	**Wed 8/18/21**	**Mon 8/30/21**
34		Limpieza y desbroce de malezas	7 days	Wed 8/18/21	Wed 8/25/21
35		Bote de material c/camión distancia 5KM (incluye esparcimiento	2 days	Thu 8/26/21	Fri 8/27/21
36		Pintura acrílica calidad superior Caseta de Bombeo	2 days	Sat 8/28/21	Mon 8/30/21
37		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA**	**21 days**	**Tue 8/31/21**	**Thu 9/23/21**
38		Instalación de Equipo de Bombeo y Accesorios	21 days	Tue 8/31/21	Thu 9/23/21
39		**VARIOS**	**40 days**	**Wed 8/18/21**	**Sat 10/2/21**
40		Valla anunciando Obra 20' x 10' Impresión Full Color conteniendo lo	1 day	Wed 8/18/21	Wed 8/18/21
41		Campamento (Incluye alquiler solar y casa de materiales)	40 days	Wed 8/18/21	Sat 10/2/21

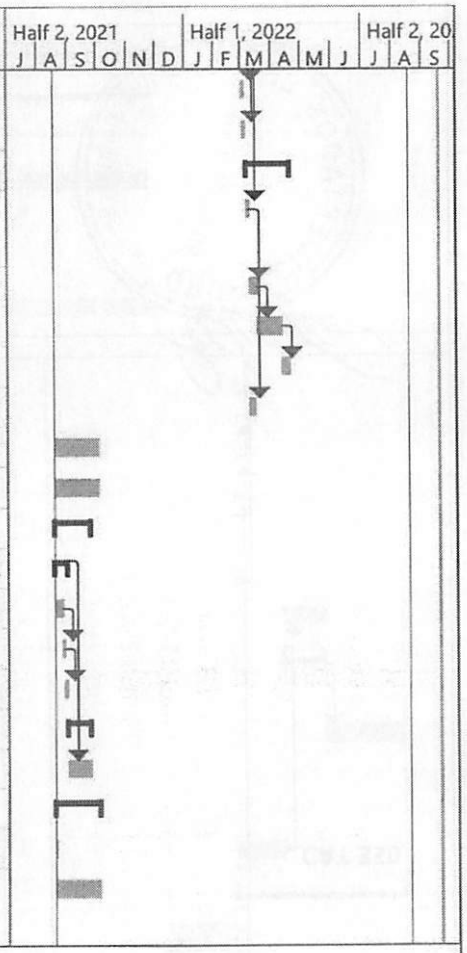

Project: CRONOGRAMA ACUED
Date: Mon 9/19/22

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

GRUPO CIMENTADOS, S.R.L.
RNC: 1-31-97336-1
Santo Domingo, R.D.
