

| Id | Modo de | Fase | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **CANALIZACION ARROYO GURABO** | **727 días** | **jue 31/3/22** |
| 2 | | | **PRELIMINARES** | **31 días** | **jue 31/3/22** |
| 3 | | | Notificacion de adjudicación | 0 días | jue 31/3/22 |
| 4 | | | Constitución de garantías | 0 días | jue 31/3/22 |
| 5 | | | Firma del Contrato | 0 días | jue 31/3/22 |
| 6 | | | Recepción del anticipo | 31 días | jue 31/3/22 |
| 7 | | | **INICIO DE LA OBRA** | **7 días** | **jue 5/5/22** |
| 8 | | | MOVILIZACION | 7 días | jue 5/5/22 |
| 9 | | | **TRABAJOS CONTRACTUALES** | **689 días** | **jue 12/5/22** |
| 10 | | | **CONSTRUCCION DE CANAL TRAPEZOIDAL** | **689 días** | **jue 12/5/22** |
| 11 | | | **DESDE EST-3+692 HASTA EST-2+620** | **186 días** | **jue 12/5/22** |
| 12 | | | **PRELIMINARES** | **17 días** | **jue 12/5/22** |
| 13 | | | Acceso provicional para equipos pesados desde Av 27 de Febrero EST-3+340 | 1 día | jue 12/5/22 |
| 14 | | | Corte de arboles y acondicionamiento de area de trabajo | 2 días | vie 13/5/22 |
| 15 | | | Replanteo topografico | 2 días | lun 16/5/22 |
| 16 | | | Excavaciones en acera sur para acceso camiones de bote | 10 días | lun 16/5/22 |
| 17 | | | Saneamiento de acera sur para camino de acceso camiones de bote | 4 días | jue 26/5/22 |
| 18 | | | **TRAMO DESDE EST-3+692 HASTA EST-3+600** | **19 días** | **jue 19/5/22** |
| 19 | | | Ataguia en EST-3+600 | 1 día | jue 19/5/22 |
| 20 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 20/5/22 |
| 21 | | | Excavaciones de material no clasificado | 2 días | sáb 21/5/22 |
| 22 | | | Bote | 2 días | sáb 21/5/22 |
| 23 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | mar 24/5/22 |
| 24 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | vie 27/5/22 |
| 25 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | lun 30/5/22 |
| 26 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 3 días | mié 1/6/22 |
| 27 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mié 1/6/22 |
| 28 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | vie 27/5/22 |
| 29 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | mié 1/6/22 |
| 30 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | vie 3/6/22 |
| 31 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 3 días | lun 6/6/22 |
| 32 | | | **TRAMO DESDE EST-3+600 HASTA EST-3+500** | **19 días** | **lun 6/6/22** |
| 33 | | | Ataguia en EST-3+500 | 1 día | lun 6/6/22 |
| 34 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mar 7/6/22 |
| 35 | | | Excavaciones de material no clasificado | 2 días | mar 7/6/22 |
| 36 | | | Bote | 2 días | jue 9/6/22 |
| 37 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | jue 9/6/22 |
| 38 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | mar 14/6/22 |
| 39 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mié 15/6/22 |
| 40 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 3 días | lun 20/6/22 |
| 41 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | lun 20/6/22 |
| 42 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | mar 14/6/22 |

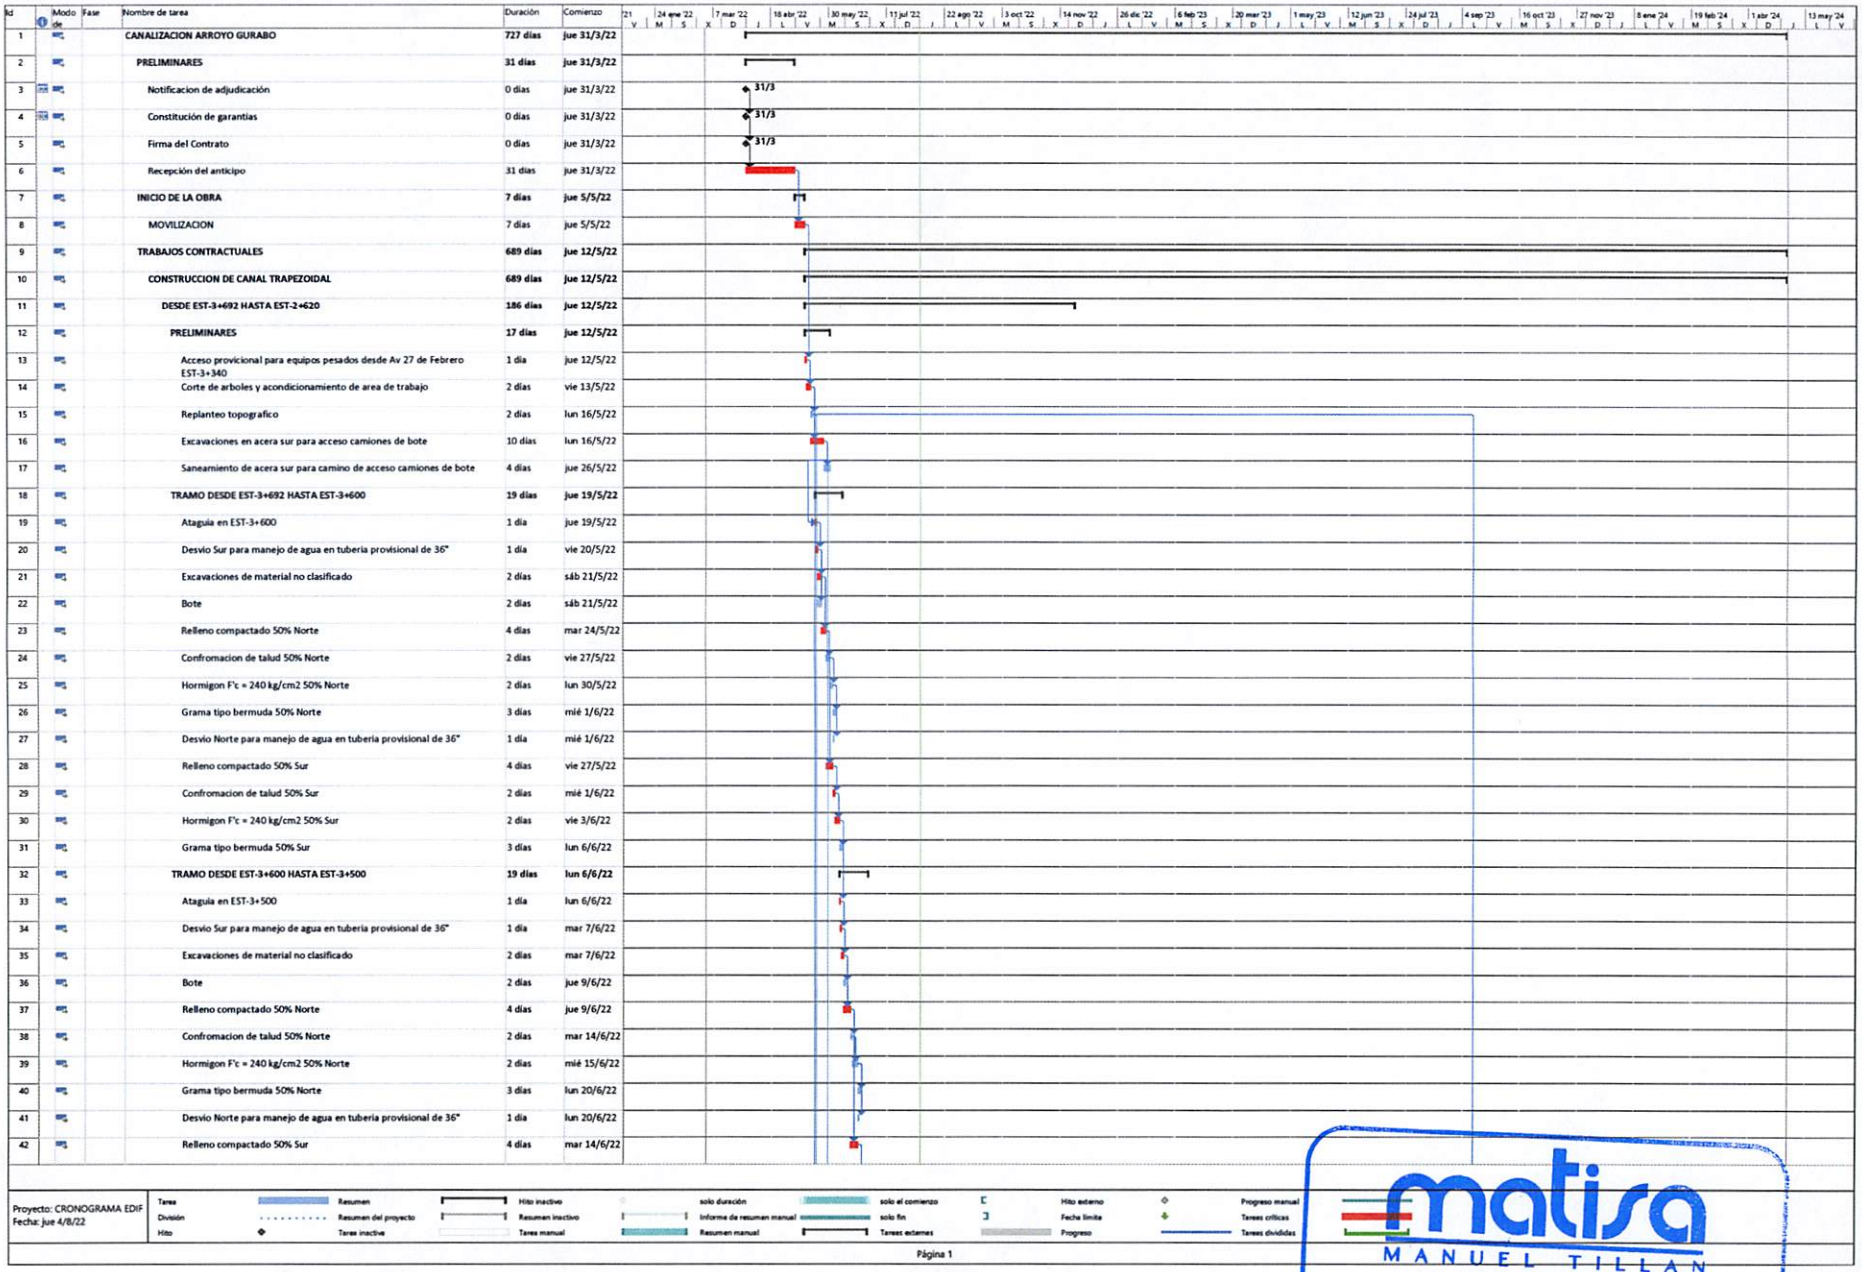

Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
Fecha: jue 4/8/22

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual · Tareas críticas · Tareas divididas

Página 1

matisa
MANUEL TILLAN
RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.

| Id | Modo de | Fase | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | lun 20/6/22 |
| 44 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | mar 21/6/22 |
| 45 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 3 días | jue 23/6/22 |
| 46 | | | **TRAMO DESDE EST-3+500 HASTA EST-3+400** | **19 días** | **jue 23/6/22** |
| 47 | | | Ataguia en EST-3+400 | 1 día | jue 23/6/22 |
| 48 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 24/6/22 |
| 49 | | | Excavaciones de material no clasificado | 2 días | vie 24/6/22 |
| 50 | | | Bote | 2 días | mar 28/6/22 |
| 51 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | mar 28/6/22 |
| 52 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | vie 1/7/22 |
| 53 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | lun 4/7/22 |
| 54 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 3 días | mié 6/7/22 |
| 55 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mié 6/7/22 |
| 56 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | vie 1/7/22 |
| 57 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | mié 6/7/22 |
| 58 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | jue 7/7/22 |
| 59 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 3 días | sáb 9/7/22 |
| 60 | | | **TRAMO DESDE EST-3+400 HASTA EST-3+300** | **19 días** | **sáb 9/7/22** |
| 61 | | | Ataguia en EST-3+300 | 1 día | sáb 9/7/22 |
| 62 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | lun 11/7/22 |
| 63 | | | Excavaciones de material no clasificado | 2 días | mar 12/7/22 |
| 64 | | | Bote | 2 días | jue 14/7/22 |
| 65 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | jue 14/7/22 |
| 66 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | lun 18/7/22 |
| 67 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mié 20/7/22 |
| 68 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 3 días | vie 22/7/22 |
| 69 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 22/7/22 |
| 70 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | lun 18/7/22 |
| 71 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | vie 22/7/22 |
| 72 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | lun 25/7/22 |
| 73 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 3 días | mar 26/7/22 |
| 74 | | | **TRAMO DESDE EST-3+300 HASTA EST-3+200** | **19 días** | **mar 26/7/22** |
| 75 | | | Ataguia en EST-3+200 | 1 día | mar 26/7/22 |
| 76 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mié 27/7/22 |
| 77 | | | Excavaciones de material no clasificado | 2 días | jue 28/7/22 |
| 78 | | | Bote | 2 días | sáb 30/7/22 |
| 79 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | sáb 30/7/22 |
| 80 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | mié 3/8/22 |
| 81 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | vie 5/8/22 |
| 82 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 3 días | lun 8/8/22 |
| 83 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | lun 8/8/22 |
| 84 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | mié 3/8/22 |

Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
Fecha: jue 4/8/22

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual · Tareas críticas · Tareas divididas



matisa
MANUEL TILLAN
RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.



| Id | Modo de | Fase | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | lun 8/8/22 |
| 86 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | mié 10/8/22 |
| 87 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 3 días | jue 11/8/22 |
| 88 | | | **TRAMO DESDE EST-3+200 HASTA EST-3+100** | **19 días** | **jue 11/8/22** |
| 89 | | | Ataguia en EST-3+100 | 1 día | jue 11/8/22 |
| 90 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 12/8/22 |
| 91 | | | Excavaciones de material no clasificado | 2 días | lun 15/8/22 |
| 92 | | | Bote | 2 días | mié 17/8/22 |
| 93 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | mié 17/8/22 |
| 94 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | lun 22/8/22 |
| 95 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mié 24/8/22 |
| 96 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 3 días | jue 25/8/22 |
| 97 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | jue 25/8/22 |
| 98 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | lun 22/8/22 |
| 99 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | jue 25/8/22 |
| 100 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | sáb 27/8/22 |
| 101 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 3 días | mar 30/8/22 |
| 102 | | | **TRAMO DESDE EST-3+100 HASTA EST-3+000** | **19 días** | **mar 30/8/22** |
| 103 | | | Ataguia en EST-3+000 | 1 día | mar 30/8/22 |
| 104 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mié 31/8/22 |
| 105 | | | Excavaciones de material no clasificado | 2 días | jue 1/9/22 |
| 106 | | | Bote | 2 días | vie 2/9/22 |
| 107 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | vie 2/9/22 |
| 108 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | mié 7/9/22 |
| 109 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | vie 9/9/22 |
| 110 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 3 días | lun 12/9/22 |
| 111 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | lun 12/9/22 |
| 112 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | mié 7/9/22 |
| 113 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | lun 12/9/22 |
| 114 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | mar 13/9/22 |
| 115 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 3 días | jue 15/9/22 |
| 116 | | | **TRAMO DESDE EST-3+000 HASTA EST-2+900** | **19 días** | **jue 15/9/22** |
| 117 | | | Ataguia en EST-2+900 | 1 día | jue 15/9/22 |
| 118 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 16/9/22 |
| 119 | | | Excavaciones de material no clasificado | 2 días | sáb 17/9/22 |
| 120 | | | Bote | 2 días | mar 20/9/22 |
| 121 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | mar 20/9/22 |
| 122 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | vie 23/9/22 |
| 123 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mar 27/9/22 |
| 124 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 3 días | mié 28/9/22 |
| 125 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mié 28/9/22 |
| 126 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | vie 23/9/22 |

Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
Fecha: jue 4/8/22

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual · Tareas críticas · Tareas divididas



matisa
MANUEL TILLAN
RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.
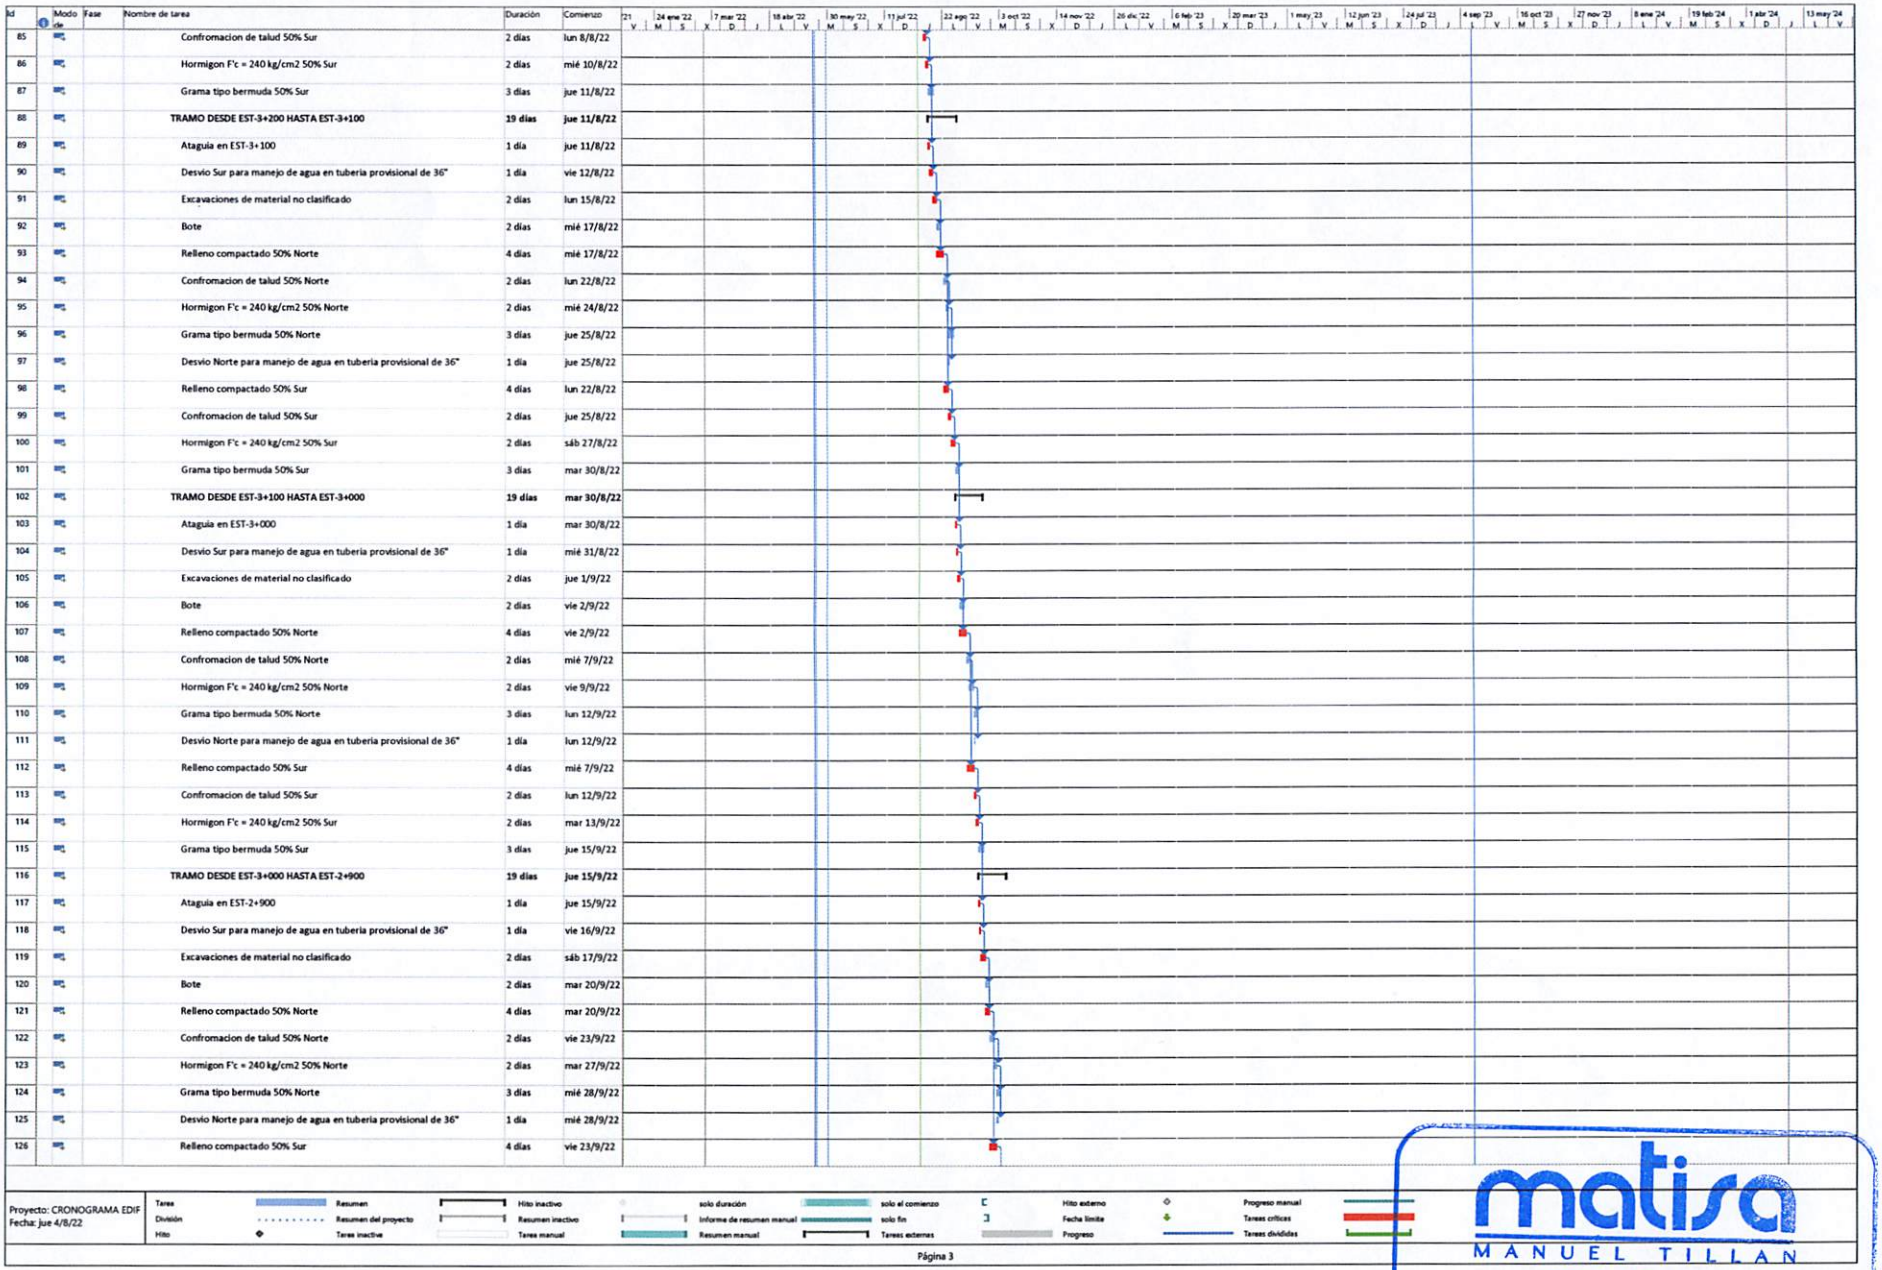
| Id | Modo de | Fase | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | mié 28/9/22 |
| 128 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | vie 30/9/22 |
| 129 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 3 días | lun 3/10/22 |
| 130 | | | **TRAMO DESDE EST-2+900 HASTA EST-2+800** | **19 días** | **lun 3/10/22** |
| 131 | | | Ataguia en EST-2+800 | 1 día | lun 3/10/22 |
| 132 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mar 4/10/22 |
| 133 | | | Excavaciones de material no clasificado | 2 días | mié 5/10/22 |
| 134 | | | Bote | 2 días | jue 6/10/22 |
| 135 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | jue 6/10/22 |
| 136 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | mar 11/10/2 |
| 137 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | jue 13/10/22 |
| 138 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 3 días | vie 14/10/22 |
| 139 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 14/10/22 |
| 140 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | mar 11/10/2 |
| 141 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | vie 14/10/22 |
| 142 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | lun 17/10/22 |
| 143 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 3 días | mié 19/10/2 |
| 144 | | | **TRAMO DESDE EST-2+800 HASTA EST-2+700** | **19 días** | **mié 19/10/2** |
| 145 | | | Ataguia en EST-2+700 | 1 día | mié 19/10/2 |
| 146 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | jue 20/10/22 |
| 147 | | | Excavaciones de material no clasificado | 2 días | vie 21/10/22 |
| 148 | | | Bote | 2 días | lun 24/10/22 |
| 149 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | lun 24/10/22 |
| 150 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | jue 27/10/22 |
| 151 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | sáb 29/10/22 |
| 152 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 3 días | mar 1/11/22 |
| 153 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mar 1/11/22 |
| 154 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | jue 27/10/22 |
| 155 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | mar 1/11/22 |
| 156 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | mié 2/11/22 |
| 157 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 3 días | vie 4/11/22 |
| 158 | | | **TRAMO DESDE EST-2+700 HASTA EST-2+620** | **19 días** | **vie 4/11/22** |
| 159 | | | Ataguia en EST-2+620 | 1 día | vie 4/11/22 |
| 160 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | sáb 5/11/22 |
| 161 | | | Excavaciones de material no clasificado | 2 días | lun 7/11/22 |
| 162 | | | Bote | 2 días | mié 9/11/22 |
| 163 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | mié 9/11/22 |
| 164 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | lun 14/11/22 |
| 165 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mar 15/11/2 |
| 166 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 3 días | jue 17/11/22 |
| 167 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | jue 17/11/22 |
| 168 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | lun 14/11/22 |

Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
Fecha: jue 4/8/22

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Tareas críticas
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso | Tareas divididas



matisa
MANUEL TILLAN
RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.

| Id | Modo de | Fase | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | jue 17/11/22 |
| 170 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | vie 18/11/22 |
| 171 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 3 días | mar 22/11/22 |
| 172 | | | **DESDE EST-2+620 HASTA EST-0+880** | **474 días** | **lun 16/5/22** |
| 173 | | | **PRELIMINARES** | **46 días** | **lun 16/5/22** |
| 174 | | | Corte de arboles y acondicionamiento de area de trabajo | 3 días | lun 16/5/22 |
| 175 | | | Replanteo topografico | 3 días | mié 18/5/22 |
| 176 | | | Excavaciones en acera sur para acceso camiones de bote | 30 días | jue 26/5/22 |
| 177 | | | Saneamiento de acera sur para camino de acceso camiones de bote | 6 días | mar 28/6/22 |
| 178 | | | **TRAMO DESDE EST-2+620 HASTA EST-2+500** | **23 días** | **mar 22/11/22** |
| 179 | | | Ataguia en EST-2+500 | 1 día | mar 22/11/22 |
| 180 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mar 22/11/22 |
| 181 | | | Excavaciones de material no clasificado | 4 días | mié 23/11/22 |
| 182 | | | Bote | 4 días | lun 28/11/22 |
| 183 | | | Relleno compactado 50% Norte | 5 días | lun 28/11/22 |
| 184 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | vie 2/12/22 |
| 185 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | lun 5/12/22 |
| 186 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 3 días | mié 7/12/22 |
| 187 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mié 7/12/22 |
| 188 | | | Relleno compactado 50% Sur | 5 días | vie 2/12/22 |
| 189 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | jue 8/12/22 |
| 190 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | vie 9/12/22 |
| 191 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 3 días | lun 12/12/22 |
| 192 | | | **TRAMO DESDE EST-2+500 HASTA EST-2+400** | **19 días** | **lun 12/12/22** |
| 193 | | | Ataguia en EST-2+400 | 1 día | lun 12/12/22 |
| 194 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mar 13/12/22 |
| 195 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | mié 14/12/22 |
| 196 | | | Bote | 3 días | vie 16/12/22 |
| 197 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | vie 16/12/22 |
| 198 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | mié 21/12/22 |
| 199 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | vie 23/12/22 |
| 200 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | lun 26/12/22 |
| 201 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | lun 26/12/22 |
| 202 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | mié 21/12/22 |
| 203 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | lun 26/12/22 |
| 204 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | mié 28/12/22 |
| 205 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | jue 29/12/22 |
| 206 | | | **TRAMO DESDE EST-2+400 HASTA EST-2+300** | **19 días** | **jue 29/12/22** |
| 207 | | | Ataguia en EST-2+300 | 1 día | jue 29/12/22 |
| 208 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 30/12/22 |
| 209 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | sáb 31/12/22 |
| 210 | | | Bote | 3 días | mié 4/1/23 |




Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
Fecha: jue 4/8/22

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Tareas críticas
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso | Tareas divididas



matisa
MANUEL TILLAN
RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.
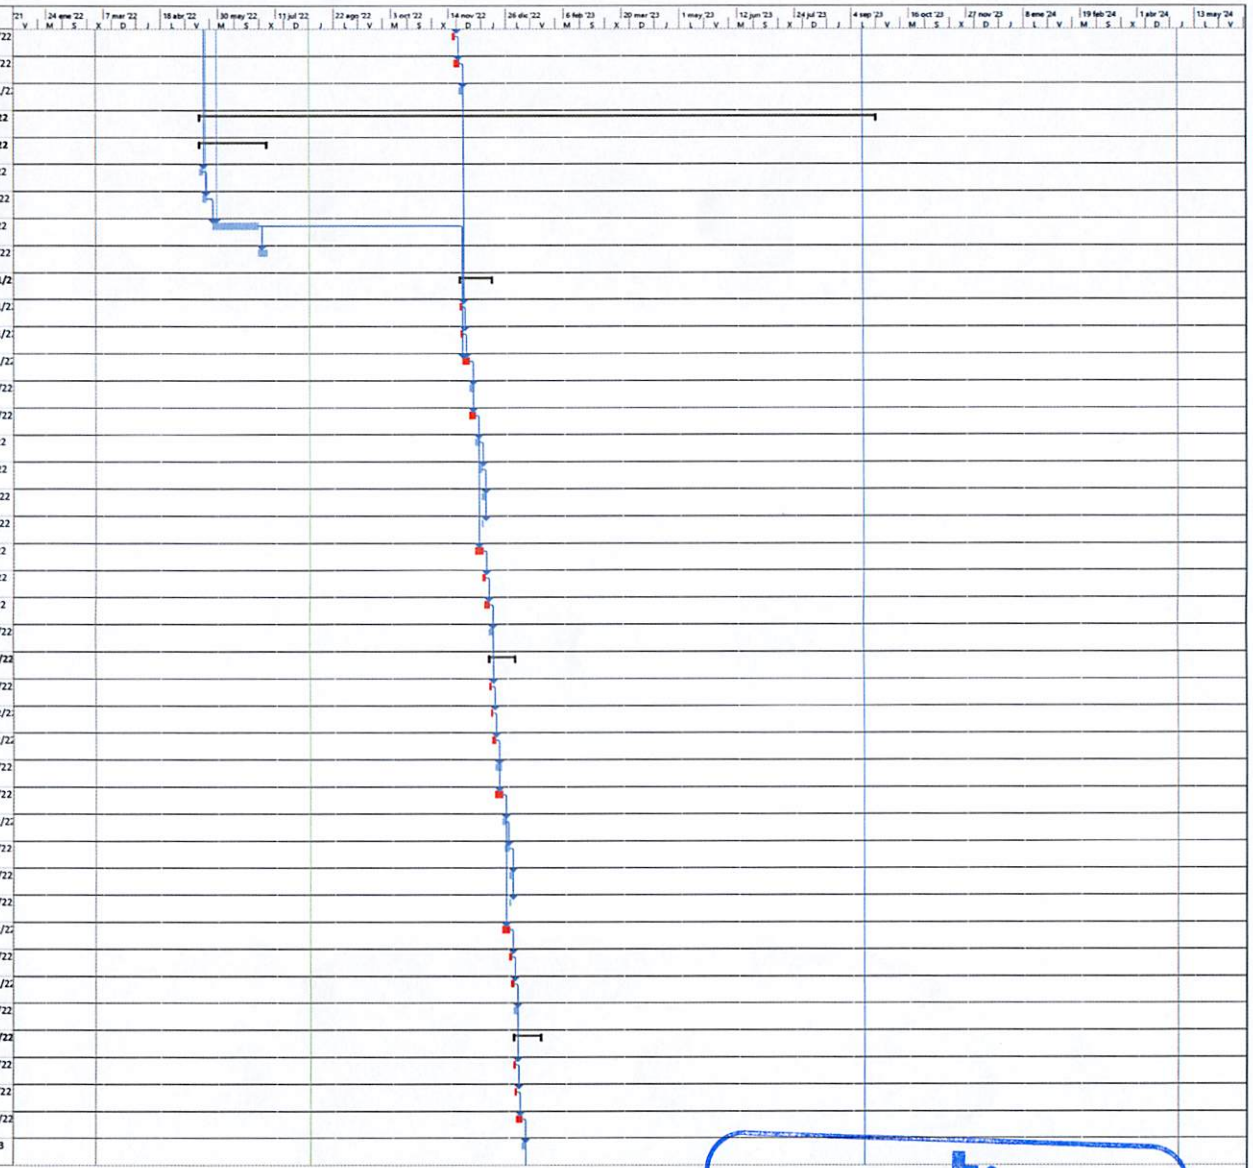
| Id | Modo de | Fase | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | mié 4/1/23 |
| 212 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | lun 9/1/23 |
| 213 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mar 10/1/23 |
| 214 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | jue 12/1/23 |
| 215 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | jue 12/1/23 |
| 216 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | lun 9/1/23 |
| 217 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | jue 12/1/23 |
| 218 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | vie 13/1/23 |
| 219 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | mar 17/1/23 |
| 220 | | | **TRAMO DESDE EST-2+300 HASTA EST-2+200** | **19 días** | **mar 17/1/23** |
| 221 | | | Ataguia en EST-2+200 | 1 día | mar 17/1/23 |
| 222 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mar 17/1/23 |
| 223 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | mié 18/1/23 |
| 224 | | | Bote | 3 días | sáb 21/1/23 |
| 225 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | sáb 21/1/23 |
| 226 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | mié 25/1/23 |
| 227 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | vie 27/1/23 |
| 228 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | lun 30/1/23 |
| 229 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | lun 30/1/23 |
| 230 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | mié 25/1/23 |
| 231 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | lun 30/1/23 |
| 232 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | mié 1/2/23 |
| 233 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | jue 2/2/23 |
| 234 | | | **TRAMO DESDE EST-2+200 HASTA EST-2+100** | **19 días** | **jue 2/2/23** |
| 235 | | | Ataguia en EST-2+100 | 1 día | jue 2/2/23 |
| 236 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 3/2/23 |
| 237 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | lun 6/2/23 |
| 238 | | | Bote | 3 días | mié 8/2/23 |
| 239 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | mié 8/2/23 |
| 240 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | lun 13/2/23 |
| 241 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mar 14/2/23 |
| 242 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | jue 16/2/23 |
| 243 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | jue 16/2/23 |
| 244 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | lun 13/2/23 |
| 245 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | jue 16/2/23 |
| 246 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | sáb 18/2/23 |
| 247 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | mar 21/2/23 |
| 248 | | | **TRAMO DESDE EST-2+100 HASTA EST-2+000** | **19 días** | **mar 21/2/23** |
| 249 | | | Ataguia en EST-2+000 | 1 día | mar 21/2/23 |
| 250 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mié 22/2/23 |
| 251 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | mié 22/2/23 |
| 252 | | | Bote | 3 días | sáb 25/2/23 |

Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
Fecha: jue 4/8/22

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Tareas críticas
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso | Tareas divididas



matisa
MANUEL TILLAN
RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.

| Id | Modo de | Fase | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | sáb 25/2/23 |
| 254 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | jue 2/3/23 |
| 255 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | vie 3/3/23 |
| 256 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | lun 6/3/23 |
| 257 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | lun 6/3/23 |
| 258 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | jue 2/3/23 |
| 259 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | lun 6/3/23 |
| 260 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | mié 8/3/23 |
| 261 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | vie 10/3/23 |
| 262 | | | **TRAMO DESDE EST-2+000 HASTA EST-1+900** | **19 días** | **vie 10/3/23** |
| 263 | | | Ataguia en EST-1+900 | 1 día | vie 10/3/23 |
| 264 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 10/3/23 |
| 265 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | lun 13/3/23 |
| 266 | | | Bote | 3 días | mié 15/3/23 |
| 267 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | mié 15/3/23 |
| 268 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | lun 20/3/23 |
| 269 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mié 22/3/23 |
| 270 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | jue 23/3/23 |
| 271 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | jue 23/3/23 |
| 272 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | lun 20/3/23 |
| 273 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | jue 23/3/23 |
| 274 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | sáb 25/3/23 |
| 275 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | mar 28/3/23 |
| 276 | | | **TRAMO DESDE EST-1+900 HASTA EST-1+800** | **19 días** | **mar 28/3/23** |
| 277 | | | Ataguia en EST-1+800 | 1 día | mar 28/3/23 |
| 278 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mié 29/3/23 |
| 279 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | jue 30/3/23 |
| 280 | | | Bote | 3 días | lun 3/4/23 |
| 281 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | lun 3/4/23 |
| 282 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | jue 6/4/23 |
| 283 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | vie 7/4/23 |
| 284 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | mar 11/4/23 |
| 285 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mar 11/4/23 |
| 286 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | jue 6/4/23 |
| 287 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | mar 11/4/23 |
| 288 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | mié 12/4/23 |
| 289 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | vie 14/4/23 |
| 290 | | | **TRAMO DESDE EST-1+800 HASTA EST-1+700** | **19 días** | **vie 14/4/23** |
| 291 | | | Ataguia en EST-1+700 | 1 día | vie 14/4/23 |
| 292 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | sáb 15/4/23 |
| 293 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | lun 17/4/23 |
| 294 | | | Bote | 3 días | mié 19/4/23 |

Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
Fecha: jue 4/8/22

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Tareas críticas
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso | Tareas divididas



natisa
MANUEL TILLAN
RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.

| Id | Modo de | Fase | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 295 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | mié 19/4/23 |
| 296 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | lun 24/4/23 |
| 297 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mié 26/4/23 |
| 298 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | jue 27/4/23 |
| 299 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | jue 27/4/23 |
| 300 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | lun 24/4/23 |
| 301 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | jue 27/4/23 |
| 302 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | lun 1/5/23 |
| 303 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | mar 2/5/23 |
| 304 | | | **TRAMO DESDE EST-1+700 HASTA EST-1+600** | **19 días** | **mar 2/5/23** |
| 305 | | | Ataguia en EST-1+600 | 1 día | mar 2/5/23 |
| 306 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mié 3/5/23 |
| 307 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | jue 4/5/23 |
| 308 | | | Bote | 3 días | lun 8/5/23 |
| 309 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | lun 8/5/23 |
| 310 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | jue 11/5/23 |
| 311 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | sáb 13/5/23 |
| 312 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | mar 16/5/23 |
| 313 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mar 16/5/23 |
| 314 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | jue 11/5/23 |
| 315 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | mar 16/5/23 |
| 316 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | mié 17/5/23 |
| 317 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | vie 19/5/23 |
| 318 | | | **TRAMO DESDE EST-1+600 HASTA EST-1+500** | **19 días** | **vie 19/5/23** |
| 319 | | | Ataguia en EST-1+500 | 1 día | vie 19/5/23 |
| 320 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | sáb 20/5/23 |
| 321 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | lun 22/5/23 |
| 322 | | | Bote | 3 días | jue 25/5/23 |
| 323 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | jue 25/5/23 |
| 324 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | lun 29/5/23 |
| 325 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mié 31/5/23 |
| 326 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | vie 2/6/23 |
| 327 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 2/6/23 |
| 328 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | lun 29/5/23 |
| 329 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | vie 2/6/23 |
| 330 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | lun 5/6/23 |
| 331 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | mar 6/6/23 |
| 332 | | | **TRAMO DESDE EST-1+500 HASTA EST-1+400** | **19 días** | **mar 6/6/23** |
| 333 | | | Ataguia en EST-1+400 | 1 día | mar 6/6/23 |
| 334 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mié 7/6/23 |
| 335 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | jue 8/6/23 |
| 336 | | | Bote | 3 días | lun 12/6/23 |

Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
Fecha: jue 4/8/22

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Tareas críticas
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso | Tareas divididas



matisa
MANUEL TILLAN
RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.

| Id | Modo de | Fase | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 337 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | lun 12/6/23 |
| 338 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | jue 15/6/23 |
| 339 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | sáb 17/6/23 |
| 340 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | mar 20/6/23 |
| 341 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mar 20/6/23 |
| 342 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | jue 15/6/23 |
| 343 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | mar 20/6/23 |
| 344 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | jue 22/6/23 |
| 345 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | vie 23/6/23 |
| 346 | | | **TRAMO DESDE EST-1+400 HASTA EST-1+300** | **19 días** | **vie 23/6/23** |
| 347 | | | Ataguia en EST-1+300 | 1 día | vie 23/6/23 |
| 348 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | lun 26/6/23 |
| 349 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | lun 26/6/23 |
| 350 | | | Bote | 3 días | jue 29/6/23 |
| 351 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | jue 29/6/23 |
| 352 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | mar 4/7/23 |
| 353 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mié 5/7/23 |
| 354 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | vie 7/7/23 |
| 355 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 7/7/23 |
| 356 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | mar 4/7/23 |
| 357 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | vie 7/7/23 |
| 358 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | lun 10/7/23 |
| 359 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | mié 12/7/23 |
| 360 | | | **TRAMO DESDE EST-1+300 HASTA EST-1+200** | **19 días** | **mié 12/7/23** |
| 361 | | | Ataguia en EST-1+200 | 1 día | mié 12/7/23 |
| 362 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mié 12/7/23 |
| 363 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | jue 13/7/23 |
| 364 | | | Bote | 3 días | lun 17/7/23 |
| 365 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | lun 17/7/23 |
| 366 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | jue 20/7/23 |
| 367 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | lun 24/7/23 |
| 368 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | mar 25/7/23 |
| 369 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mar 25/7/23 |
| 370 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | jue 20/7/23 |
| 371 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | mar 25/7/23 |
| 372 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | jue 27/7/23 |
| 373 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | vie 28/7/23 |
| 374 | | | **TRAMO DESDE EST-1+200 HASTA EST-1+100** | **19 días** | **vie 28/7/23** |
| 375 | | | Ataguia en EST-1+100 | 1 día | vie 28/7/23 |
| 376 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | lun 31/7/23 |
| 377 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | mar 1/8/23 |
| 378 | | | Bote | 3 días | jue 3/8/23 |




Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
Fecha: jue 4/8/22

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Tareas críticas
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso | Tareas divididas



matisa
MANUEL TILLAN
RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.
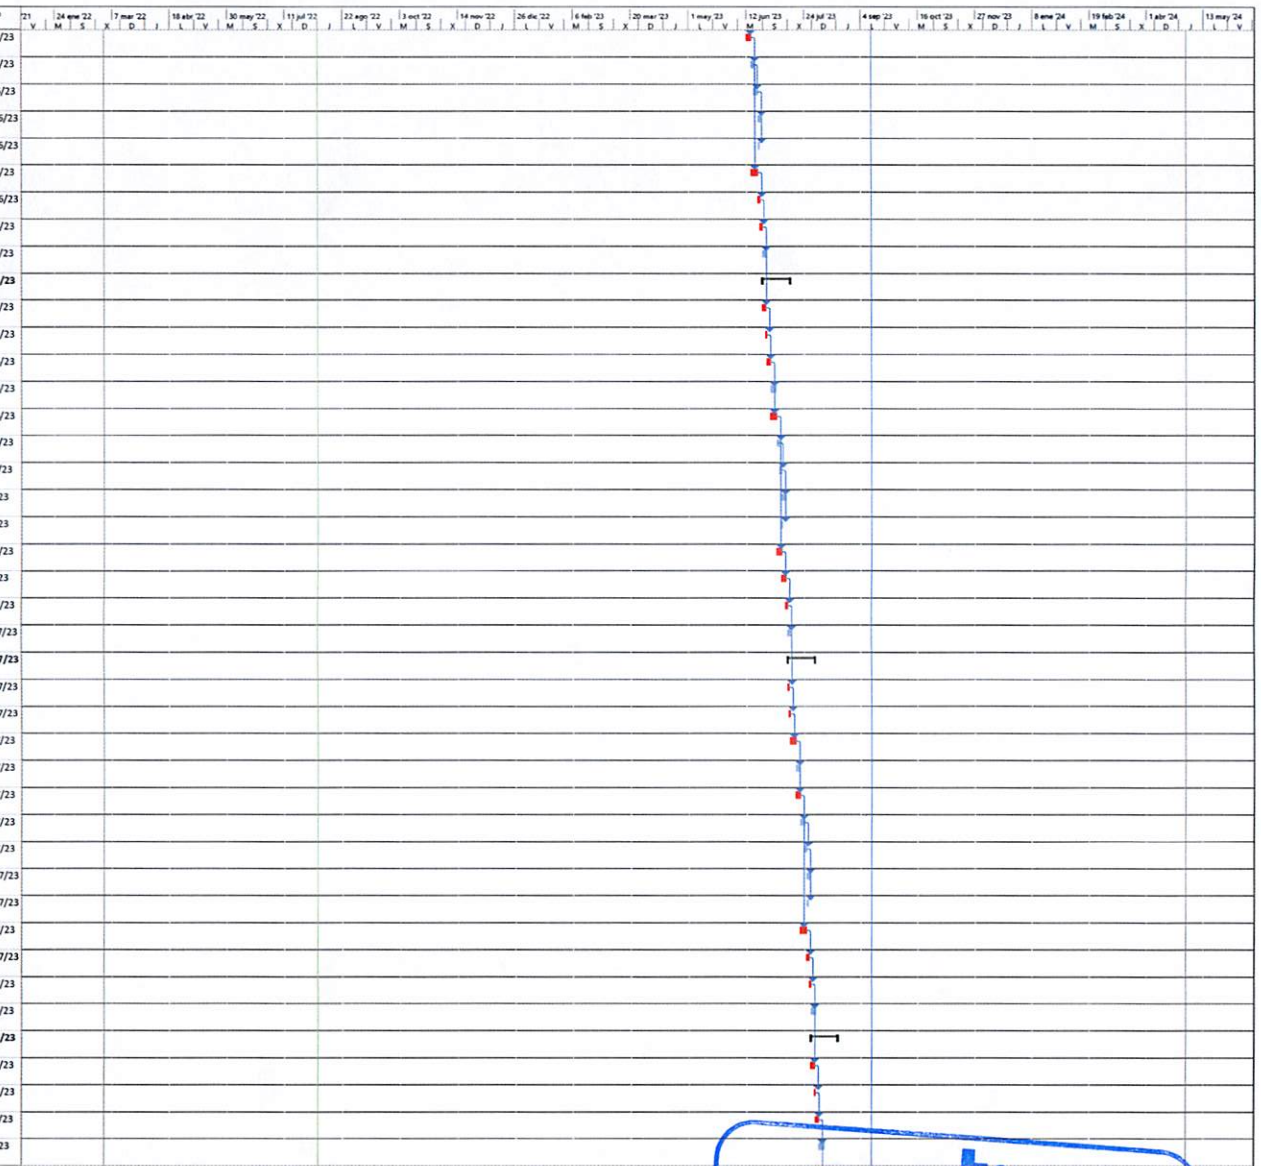
| Id | Modo de | Fase | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | jue 3/8/23 |
| 380 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | mar 8/8/23 |
| 381 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mié 9/8/23 |
| 382 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | vie 11/8/23 |
| 383 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 11/8/23 |
| 384 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | mar 8/8/23 |
| 385 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | vie 11/8/23 |
| 386 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | lun 14/8/23 |
| 387 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | mié 16/8/23 |
| 388 | | | **TRAMO DESDE EST-1+100 HASTA EST-1+000** | **19 días** | **mié 16/8/23** |
| 389 | | | Ataguia en EST-1+000 | 1 día | mié 16/8/23 |
| 390 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | jue 17/8/23 |
| 391 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | jue 17/8/23 |
| 392 | | | Bote | 3 días | lun 21/8/23 |
| 393 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | lun 21/8/23 |
| 394 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | vie 25/8/23 |
| 395 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | lun 28/8/23 |
| 396 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | mar 29/8/23 |
| 397 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mar 29/8/23 |
| 398 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | vie 25/8/23 |
| 399 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | mar 29/8/23 |
| 400 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | jue 31/8/23 |
| 401 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | sáb 2/9/23 |
| 402 | | | **TRAMO DESDE EST-1+000 HASTA EST-0+880** | **19 días** | **sáb 2/9/23** |
| 403 | | | Ataguia en EST-0+880 | 1 día | sáb 2/9/23 |
| 404 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | lun 4/9/23 |
| 405 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | mar 5/9/23 |
| 406 | | | Bote | 3 días | jue 7/9/23 |
| 407 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | jue 7/9/23 |
| 408 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | mar 12/9/23 |
| 409 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | jue 14/9/23 |
| 410 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | vie 15/9/23 |
| 411 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 15/9/23 |
| 412 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | mar 12/9/23 |
| 413 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | vie 15/9/23 |
| 414 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | lun 18/9/23 |
| 415 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | mié 20/9/23 |
| 416 | | | **DESDE EST-0+880 HASTA EST-0+000** | **161 días** | **jue 7/9/23** |
| 417 | | | **PRELIMINARES** | **6 días** | **jue 7/9/23** |
| 418 | | | Corte de arboles y acondicionamiento de area de trabajo | 3 días | jue 7/9/23 |
| 419 | | | Replanteo topografico | 3 días | lun 11/9/23 |
| 420 | | | **TRAMO DESDE EST-0+680 HASTA EST-0+800** | **19 días** | **jue 14/9/23** |




Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
Fecha: jue 4/8/22

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Tareas críticas
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso | Tareas divididas



matisa
MANUEL TILLAN
RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.
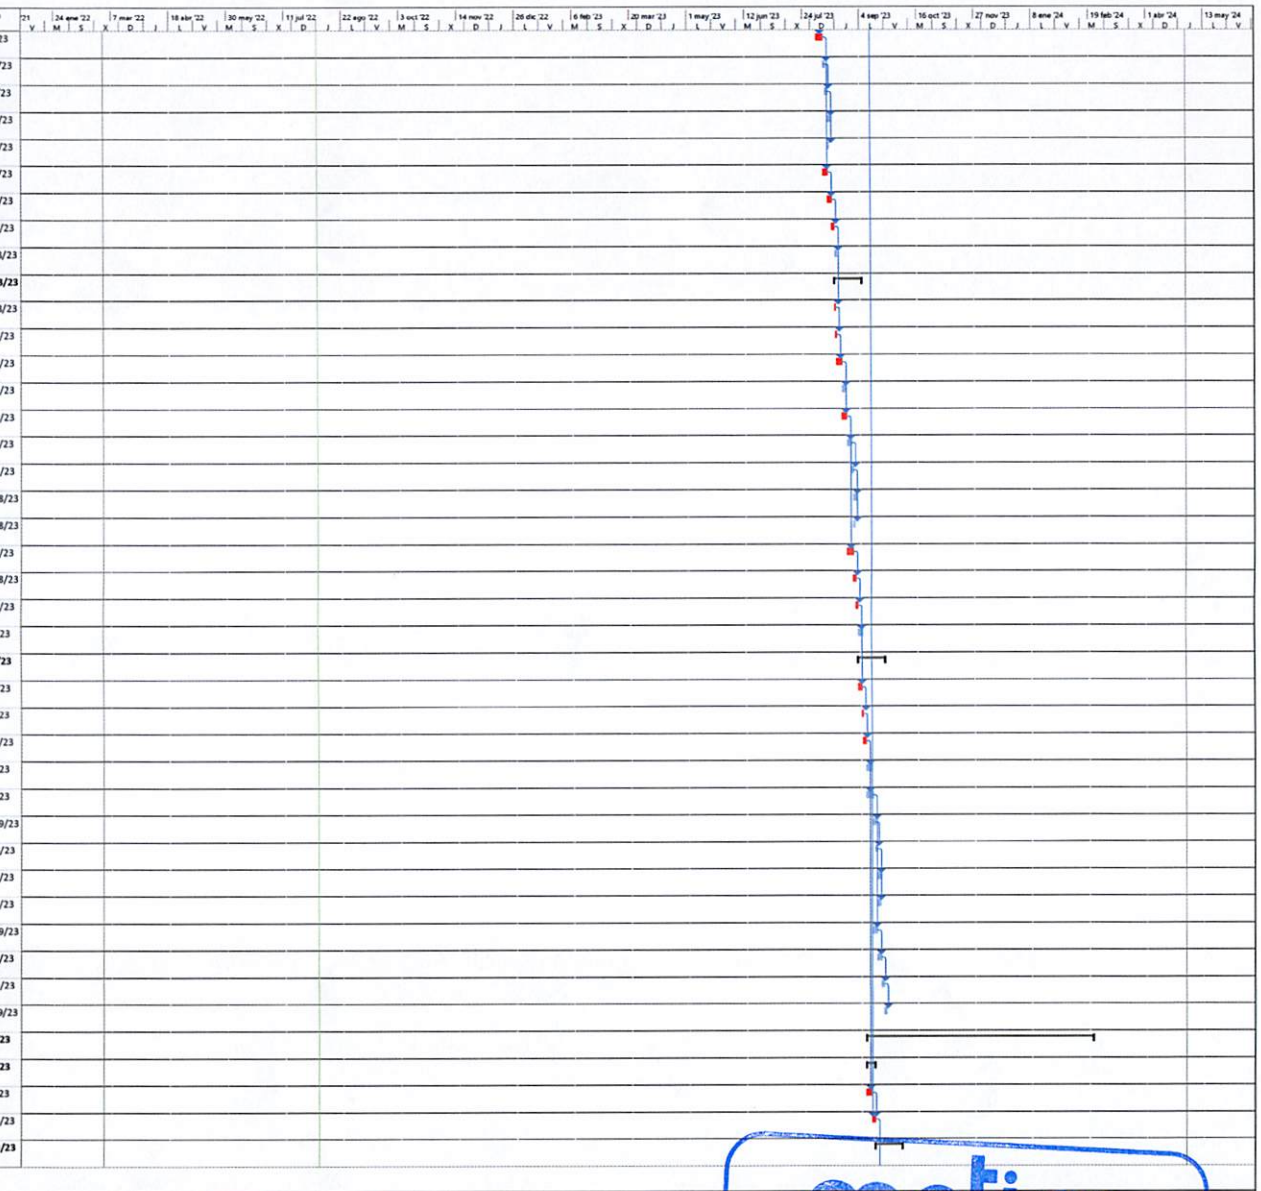
| Id | Modo de | Fase | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | | | Ataguia en EST-0+800 | 1 día | jue 14/9/23 |
| 422 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | jue 14/9/23 |
| 423 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | vie 15/9/23 |
| 424 | | | Bote | 3 días | mar 19/9/23 |
| 425 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | mar 19/9/23 |
| 426 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | vie 22/9/23 |
| 427 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mar 26/9/23 |
| 428 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | mié 27/9/23 |
| 429 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mié 27/9/23 |
| 430 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | vie 22/9/23 |
| 431 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | mié 27/9/23 |
| 432 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | vie 29/9/23 |
| 433 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | lun 2/10/23 |
| 434 | | | **TRAMO DESDE EST-0+800 HASTA EST-0+700** | **19 días** | **lun 2/10/23** |
| 435 | | | Ataguia en EST-0+700 | 1 día | lun 2/10/23 |
| 436 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mar 3/10/23 |
| 437 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | mié 4/10/23 |
| 438 | | | Bote | 3 días | vie 6/10/23 |
| 439 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | vie 6/10/23 |
| 440 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | mié 11/10/2 |
| 441 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | jue 12/10/23 |
| 442 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | lun 16/10/23 |
| 443 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | lun 16/10/23 |
| 444 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | mié 11/10/2 |
| 445 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | lun 16/10/23 |
| 446 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | mar 17/10/2 |
| 447 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | jue 19/10/23 |
| 448 | | | **TRAMO DESDE EST-0+700 HASTA EST-0+600** | **19 días** | **jue 19/10/23** |
| 449 | | | Ataguia en EST-0+600 | 1 día | jue 19/10/23 |
| 450 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 20/10/23 |
| 451 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | vie 20/10/23 |
| 452 | | | Bote | 3 días | mar 24/10/2 |
| 453 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | mar 24/10/2 |
| 454 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | sáb 28/10/23 |
| 455 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mar 31/10/2 |
| 456 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | mié 1/11/23 |
| 457 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mié 1/11/23 |
| 458 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | sáb 28/10/23 |
| 459 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | mié 1/11/23 |
| 460 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | vie 3/11/23 |
| 461 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | lun 6/11/23 |
| 462 | | | **TRAMO DESDE EST-0+600 HASTA EST-0+500** | **19 días** | **lun 6/11/23** |




Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
Fecha: jue 4/8/22

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual · Tareas críticas · Tareas divididas



matisa
MANUEL TILLAN
RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.
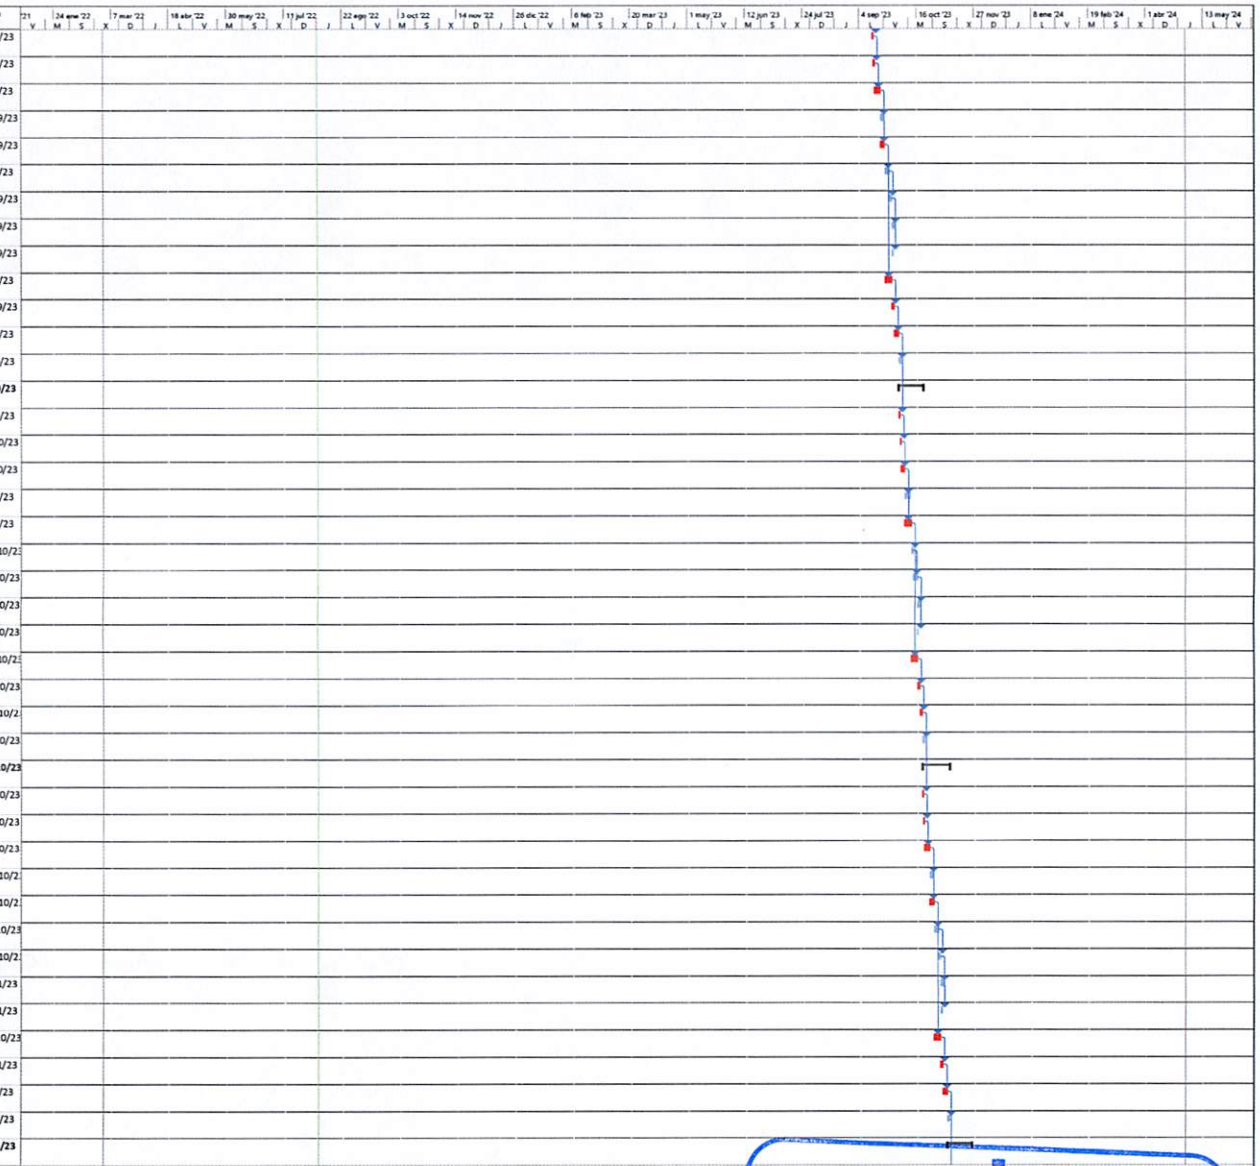
| Id | Modo de | Fase | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 463 | | | Ataguia en EST-0+500 | 1 día | lun 6/11/23 |
| 464 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mar 7/11/23 |
| 465 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | mié 8/11/23 |
| 466 | | | Bote | 3 días | vie 10/11/23 |
| 467 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | vie 10/11/23 |
| 468 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | mié 15/11/2 |
| 469 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | vie 17/11/23 |
| 470 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | lun 20/11/23 |
| 471 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | lun 20/11/23 |
| 472 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | mié 15/11/2 |
| 473 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | lun 20/11/23 |
| 474 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | mar 21/11/2 |
| 475 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | jue 23/11/23 |
| 476 | | | **TRAMO DESDE EST-0+500 HASTA EST-0+400** | **19 días** | **jue 23/11/23** |
| 477 | | | Ataguia en EST-0+400 | 1 día | jue 23/11/23 |
| 478 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 24/11/23 |
| 479 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | sáb 25/11/23 |
| 480 | | | Bote | 3 días | mié 29/11/2 |
| 481 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | mié 29/11/2 |
| 482 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | sáb 2/12/23 |
| 483 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mar 5/12/23 |
| 484 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | jue 7/12/23 |
| 485 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | jue 7/12/23 |
| 486 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | sáb 2/12/23 |
| 487 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | jue 7/12/23 |
| 488 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | vie 8/12/23 |
| 489 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | lun 11/12/23 |
| 490 | | | **TRAMO DESDE EST-0+400 HASTA EST-0+300** | **19 días** | **lun 11/12/23** |
| 491 | | | Ataguia en EST-0+300 | 1 día | lun 11/12/23 |
| 492 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mar 12/12/2 |
| 493 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | mié 13/12/2 |
| 494 | | | Bote | 3 días | vie 15/12/23 |
| 495 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | vie 15/12/23 |
| 496 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | mié 20/12/2 |
| 497 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | vie 22/12/23 |
| 498 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | lun 25/12/23 |
| 499 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | lun 25/12/23 |
| 500 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | mié 20/12/2 |
| 501 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | lun 25/12/23 |
| 502 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | mié 27/12/2 |
| 503 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | jue 28/12/23 |
| 504 | | | **TRAMO DESDE EST-0+300 HASTA EST-0+200** | **19 días** | **jue 28/12/23** |

Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
Fecha: jue 4/8/22

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Tareas críticas
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso · Tareas divididas



matisa
MANUEL TILLAN
RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.

| Id | Modo de | Fase | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | | | Ataguia en EST-0+200 | 1 día | jue 28/12/23 |
| 506 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 29/12/23 |
| 507 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | sáb 30/12/23 |
| 508 | | | Bote | 3 días | mié 3/1/24 |
| 509 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | mié 3/1/24 |
| 510 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | lun 8/1/24 |
| 511 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mar 9/1/24 |
| 512 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | jue 11/1/24 |
| 513 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | jue 11/1/24 |
| 514 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | lun 8/1/24 |
| 515 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | jue 11/1/24 |
| 516 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | vie 12/1/24 |
| 517 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | mar 16/1/24 |
| 518 | | | **TRAMO DESDE EST-0+200 HASTA EST-0+100** | **19 días** | **mar 16/1/24** |
| 519 | | | Ataguia en EST-0+100 | 1 día | mar 16/1/24 |
| 520 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | mar 16/1/24 |
| 521 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | mié 17/1/24 |
| 522 | | | Bote | 3 días | sáb 20/1/24 |
| 523 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | sáb 20/1/24 |
| 524 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | mié 24/1/24 |
| 525 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | vie 26/1/24 |
| 526 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | lun 29/1/24 |
| 527 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | lun 29/1/24 |
| 528 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | mié 24/1/24 |
| 529 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | lun 29/1/24 |
| 530 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | mié 31/1/24 |
| 531 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | jue 1/2/24 |
| 532 | | | **TRAMO DESDE EST-0+100 HASTA EST-0+000** | **19 días** | **jue 1/2/24** |
| 533 | | | Ataguia en EST-0+000 | 1 día | jue 1/2/24 |
| 534 | | | Desvio Sur para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | vie 2/2/24 |
| 535 | | | Excavaciones de material no clasificado | 3 días | lun 5/2/24 |
| 536 | | | Bote | 3 días | mié 7/2/24 |
| 537 | | | Relleno compactado 50% Norte | 4 días | mié 7/2/24 |
| 538 | | | Confromacion de talud 50% Norte | 2 días | lun 12/2/24 |
| 539 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Norte | 2 días | mar 13/2/24 |
| 540 | | | Grama tipo bermuda 50% Norte | 2 días | jue 15/2/24 |
| 541 | | | Desvio Norte para manejo de agua en tuberia provisional de 36" | 1 día | jue 15/2/24 |
| 542 | | | Relleno compactado 50% Sur | 4 días | lun 12/2/24 |
| 543 | | | Confromacion de talud 50% Sur | 2 días | jue 15/2/24 |
| 544 | | | Hormigon F'c = 240 kg/cm2 50% Sur | 2 días | sáb 17/2/24 |
| 545 | | | Grama tipo bermuda 50% Sur | 2 días | mar 20/2/24 |
| 546 | | | **FINALIZACION** | **67 días** | **mar 20/2/24** |

Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
Fecha: jue 4/8/22

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Tareas críticas
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso | Tareas divididas



matisa
MANUEL TILLAN
RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.

| Id | Modo de | Fase | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 547 | | | Limpieza Final | 15 días | mar 20/2/24 |
| 548 | | | Documentacion Cierre | 15 días | mié 6/3/24 |
| 549 | | | IMPREVISTOS | 37 días | jue 21/3/24 |
| 550 | | | FIN DE TRABAJOS | 0 días | lun 29/4/24 |




Proyecto: CRONOGRAMA EDIF
Fecha: jue 4/8/22

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Tareas críticas
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso · Tareas divididas



matisa
MANUEL TILLAN
RNC: 102310475
Santo Domingo, Rep. Dom.

1

# CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Construcción Sistemas de Recolección de Aguas Residuales y Distribución de Agua Potable** | **558 días** | | **18/2/2022** | **27/2/2024** |
| 2 | | | | | |
| 3 | **TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES** | **23 días** | | **18/2/2022** | **19/3/2022** |
| 4 | Notificación de adjudicación del Contrato | 1 día | | 18/2/2022 | 19/2/2022 |
| 5 | Firma del Contrato | 1 día | 4FC+20 días | 17/3/2022 | 18/3/2022 |
| 6 | Toma de posesión | 1 día | 5 | 18/3/2022 | 19/3/2022 |
| 7 | FIN DE ETAPA | 0 días | 6 | 19/3/2022 | 19/3/2022 |
| 8 | | | | | |
| 9 | **VARIOS (INICIO DE OBRA)** | **393 días** | **7** | **19/3/2022** | **15/8/2023** |
| 10 | Valla anunciando obra 20' x10' impresión Full Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1.1/2" x 1.1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4". | 393 días | | 19/3/2022 | 15/8/2023 |
| 11 | Campamento (Incluye oficinas, almacenes, talleres y unidades baños móviles). Sujeto a aprobación de la Supervisión | 393 días | 10CC | 19/3/2022 | 15/8/2023 |
| 12 | Limpieza final y continua | 393 días | 11CC | 19/3/2022 | 15/8/2023 |
| 13 | FIN DE ETAPA | 0 días | 12 | 15/8/2023 | 15/8/2023 |
| 14 | | | | | |
| 15 | **COLECTORES RESIDUALES PARALELOS AL CANAL: COLOCACIÓN TUBERÍA Ø12" PVC SDR-32.5 LONG. 6.00KM Y Ø16" PVC SDR-32.5 LONGITUD 4.4KM** | **280 días** | **9CC+7 días** | **14/11/2022** | **25/11/2023** |
| 16 | **PRELIMINARES** | **273 días** | | **14/11/2022** | **4/11/2023** |
| 17 | Replanteo y Control topográfico | 273 días | 155 | 14/11/2022 | 4/11/2023 |
| 18 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **194 días** | | **14/11/2022** | **26/7/2023** |
| 19 | Excavación material no clasificado c/equipo | 80 días | 16CC | 14/11/2022 | 28/2/2023 |
| 20 | Excavación material roca dura c/equipo | 78 días | 19CC+7 días | 22/11/2022 | 6/3/2023 |
| 21 | Suministro y colocación de asiento de arena | 69 días | 22CC+7 días | 9/12/2022 | 13/3/2023 |
| 22 | Regularización de la Zanja | 74 días | 20CC+7 días | 1/12/2022 | 9/3/2023 |
| 23 | Suministro de material de mina dist. aprox 20.00 km (sujeto a la aprobación del Supervisor) | 14 días | 31CC | 13/3/2023 | 30/3/2023 |
| 24 | Relleno compactado con compactador mecánico, en capas de 0.20m | 99 días | 23CC+5 días | 18/3/2023 | 26/7/2023 |
| 25 | Bote de material c/camion dist. 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 21 días | 24FF | 29/6/2023 | 26/7/2023 |
| 26 | **SUMINISTRO DE TUBERÍAS** | **15 días** | **21FC-15 días** | **20/2/2023** | **13/3/2023** |
| 27 | De Ø16" PVC SDR-32.5 C/J.G. +5% Pérdida P/Campana | 15 días | | 20/2/2023 | 13/3/2023 |
| 28 | De Ø12" PVC SDR-32.5 C/J.G. +4% Pérdida P/Campana | 15 días | 27CC | 20/2/2023 | 13/3/2023 |
| 29 | **COLOCACIÓN DE TUBERÍAS** | **100 días** | **28** | **13/3/2023** | **20/7/2023** |
| 30 | De Ø16" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 100 días | | 13/3/2023 | 20/7/2023 |
| 31 | De Ø12" PVC SDR-32.5 C/J.G. | 100 días | 30CC | 13/3/2023 | 20/7/2023 |
| 32 | **REGISTROS PREFABRICADOS DE INSPECCIÓN PARA COLECTORES CANAL** | **89 días** | **29CC+15 días** | **31/3/2023** | **26/7/2023** |
| 33 | Registros de inspección H.A. Profundidad promedio 1.50 a 2.50m. | 89 días | | 31/3/2023 | 26/7/2023 |
| 34 | Registros de inspección H.A. Profundidad promedio 3.8 a 6.00m. | 89 días | 33CC | 31/3/2023 | 26/7/2023 |
| 35 | **PASOS PEATONALES (7 UD)** | **86 días** | | **26/7/2023** | **25/11/2023** |
| 36 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **86 días** | | **26/7/2023** | **25/11/2023** |
| 37 | Excavación material compacto c/equipo | 14 días | 34 | 26/7/2023 | 12/8/2023 |
| 38 | Relleno de reposición compactado con equipos en capas de 0.20 m | 22 días | 43 | 17/10/2023 | 25/11/2023 |

Tarea | Resumen | Tarea resumida | Progreso resumido | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Fecha límite
División | Resumen del proyecto | Tarea crítica resumida | Tareas externas | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Tarea crítica
Hito | Agrupar por síntesis | Hito resumido | Hito externo | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Progreso

Antillean Construction Corporation SRL • RNC 1-22-02167-1

# CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Bote de material c/camion en sitio (incluido el esparcimiento) | 5 días | 38FF | 20/11/2023 | 25/11/2023 |
| 40 | **HORMIGON ARMADO INDUSTRIAL F`C=280 KG/CM2 EN:** | **60 días** | **37** | **12/8/2023** | **30/10/2023** |
| 41 | Zapatas 1.80 x1.80m e=0.60M - 2.12 QQ/M3 | 15 días | | 12/8/2023 | 1/9/2023 |
| 42 | Pilas de apoyo e=0.60- 2.0 QQ/M3 | 21 días | 41 | 1/9/2023 | 28/9/2023 |
| 43 | Muro posterior e=0.20m 3.44QQ/m3 | 14 días | 42 | 28/9/2023 | 17/10/2023 |
| 44 | Hormigón en Topping f´c=210 kg/cm² incluido fibra de polipropileno en el hormigon, espesor de 7cm, incluido adhesivo para unir hormigon del topping y la viga (según detalle) | 10 días | 43 | 17/10/2023 | 30/10/2023 |
| 45 | **ESTRUCTURAS PREFABRICADAS** | **5 días** | **44** | **30/10/2023** | **4/11/2023** |
| 46 | Viga Doble T (según detalle) (incluye suministro, colocación y Juntas de Neopreno) | 5 días | | 30/10/2023 | 4/11/2023 |
| 47 | **INSTALACIONES EN INTERIOR (SUMINISTRO Y COLOCACION )** | **7 días** | **46** | **4/11/2023** | **25/11/2023** |
| 48 | Barandas metalicas 1/2" hierro galvanizado H=1.0m | 7 días | | 4/11/2023 | 25/11/2023 |
| 49 | FIN DE ETAPA | 0 días | 48 | 25/11/2023 | 25/11/2023 |
| 50 | | | | | |
| 51 | **RED COLECTORA SECTORES RIBERA DEL ARROYO GURABO** | **72 días** | **49** | **25/11/2023** | **27/2/2024** |
| 52 | **SECTOR LA TERRACITA** | **70 días** | | **25/11/2023** | **23/2/2024** |
| 53 | Replanteo y control topográfico | 70 días | | 25/11/2023 | 23/2/2024 |
| 54 | **CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE ASFALTO** | **10 días** | | **25/11/2023** | **8/12/2023** |
| 55 | Corte de asfalto 2" (ambos lados) | 10 días | | 25/11/2023 | 8/12/2023 |
| 56 | Extracción de carpeta asfáltica | 8 días | 55CC+2 días | 28/11/2023 | 8/12/2023 |
| 57 | Bote de carpeta asfáltica, c/camión a una distancia promedio de 12 km (incluido el carguio y el esparcimiento en botadero) | 2 días | 56FF | 6/12/2023 | 8/12/2023 |
| 58 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **44 días** | **57** | **8/12/2023** | **3/2/2024** |
| 59 | Excavación material compacto c/equipo | 14 días | | 8/12/2023 | 27/12/2023 |
| 60 | Regularización de fondo de zanja | 14 días | 59CC+2 días | 11/12/2023 | 29/12/2023 |
| 61 | Asiento de arena, e=0.10 m | 5 días | 60 | 29/12/2023 | 5/1/2024 |
| 62 | Suministro de material de mina desde una distancia aproximada de 20.00 km | 3 días | 61 | 5/1/2024 | 9/1/2024 |
| 63 | Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m de espesor | 20 días | 62 | 9/1/2024 | 3/2/2024 |
| 64 | Bote de material c/camion dist. 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 4 días | 63FF | 30/1/2024 | 3/2/2024 |
| 65 | **SUMINISTRO DE TUBERÍA** | **3 días** | **58CC+7 días** | **18/12/2023** | **21/12/2023** |
| 66 | Ø8" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp. p/ camp. | 3 días | | 18/12/2023 | 21/12/2023 |
| 67 | **COLOCACIÓN DE TUBERÍA** | **34 días** | **66** | **21/12/2023** | **3/2/2024** |
| 68 | De Ø8" PVC SDR-32.5, c/J.G. | 34 días | | 21/12/2023 | 3/2/2024 |
| 69 | **REGISTROS PREFABRICADOS** | **35 días** | **68CC+7 días** | **1/1/2024** | **14/2/2024** |
| 70 | Registro Profundidad promedio entre 1.00-3.50 M | 35 días | | 1/1/2024 | 14/2/2024 |
| 71 | **ACOMETIDAS DOMICILIARIAS** | **45 días** | **70CC** | **1/1/2024** | **27/2/2024** |
| 72 | Acometidas Domiciliarias 8" x 4" PVC SDR - 32.5 (300 U) | 45 días | | 1/1/2024 | 27/2/2024 |
| 73 | Acometidas Domiciliarias 8" x 6" PVC SDR - 32.5 (5 U) | 1 día | 72FF | 26/2/2024 | 27/2/2024 |
| 74 | **REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES** | **15 días** | | **25/11/2023** | **14/12/2023** |
| 75 | **SUMINISTRO TUBERÍAS** | **15 días** | | **25/11/2023** | **14/12/2023** |
| 76 | De Ø1/2" PVC (SCH-40) | 15 días | | 25/11/2023 | 14/12/2023 |
| 77 | De Ø3/4" PVC (SCH-40) | 15 días | 76CC | 25/11/2023 | 14/12/2023 |
| 78 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 15 días | 77CC | 25/11/2023 | 14/12/2023 |
| 79 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 15 días | 78CC | 25/11/2023 | 14/12/2023 |
| 80 | De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 15 días | 79CC | 25/11/2023 | 14/12/2023 |
| 81 | **SUMINISTRO DE:** | **15 días** | **75CC** | **25/11/2023** | **14/12/2023** |




Tarea · Resumen · Tarea resumida · Progreso resumido · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Fecha límite
División · Resumen del proyecto · Tarea crítica resumida · Tareas externas · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Tarea crítica
Hito · Agrupar por síntesis · Hito resumido · Hito externo · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Progreso

Antillean Construction Corporation SRL · RNC 1-22-02167-1

# CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Coupling Ø1/2" PVC | 15 días | | 25/11/2023 | 14/12/2023 |
| 83 | CouplingOUPLING 3/4" PVC | 15 días | 82CC | 25/11/2023 | 14/12/2023 |
| 84 | Coupling 1" PVC | 15 días | 83CC | 25/11/2023 | 14/12/2023 |
| 85 | Coupling Ø2" PVC | 15 días | 84CC | 25/11/2023 | 14/12/2023 |
| 86 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 15 días | 85CC | 25/11/2023 | 14/12/2023 |
| 87 | **MANO DE OBRA** | **70 días** | | **25/11/2023** | **23/2/2024** |
| 88 | Maestro plomero (1H) | 70 días | | 25/11/2023 | 23/2/2024 |
| 89 | Peon (2H) | 70 días | | 25/11/2023 | 23/2/2024 |
| 90 | **USO BOMBAS DE ACHIQUE** | **9 días** | | **13/2/2024** | **23/2/2024** |
| 91 | Achique Ø3" (5,5 HP) | 9 días | 89FF | 13/2/2024 | 23/2/2024 |
| 92 | **MISCELÁNEOS** | **19 días** | | **25/11/2023** | **20/12/2023** |
| 93 | Demolición de aceras y contenes | 5 días | | 25/11/2023 | 1/12/2023 |
| 94 | Bote de escombros producto de la demolicion de aceras y contenes c/camión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) | 5 días | 93CC | 25/11/2023 | 1/12/2023 |
| 95 | Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm² y refuerzo de fibra de polipropileno | 5 días | 96CC+7 días | 11/12/2023 | 18/12/2023 |
| 96 | Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm² y refuerzo de fibra de polipropileno | 14 días | 94 | 1/12/2023 | 20/12/2023 |
| 97 | **REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA L= 1,029.58 M** | **9 días** | | **11/12/2023** | **22/12/2023** |
| 98 | Imprimación con arena | 7 días | 95CC | 11/12/2023 | 20/12/2023 |
| 99 | Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) | 7 días | 98CC+2 días | 13/12/2023 | 22/12/2023 |
| 100 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km | 7 días | 99CC | 13/12/2023 | 22/12/2023 |
| 101 | **SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DEL TRANSITO** | **70 días** | **52CC** | **25/11/2023** | **23/2/2024** |
| 102 | Limpieza continua y final | 70 días | | 25/11/2023 | 23/2/2024 |
| 103 | FIN DE ETAPA | 0 días | 102 | 23/2/2024 | 23/2/2024 |
| 104 | | | | | |
| 105 | **SECTOR VILLA ESPERANZA** | **206 días** | | **18/2/2022** | **14/11/2022** |
| 106 | Replanteo y control topográfico | 103 días | | 18/2/2022 | 4/7/2022 |
| 107 | **CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE ASFALTO** | **12 días** | | **4/7/2022** | **19/7/2022** |
| 108 | Corte de asfalto 2" (ambos lados) | 12 días | 106 | 4/7/2022 | 19/7/2022 |
| 109 | Extracción de carpeta asfáltica | 10 días | 108CC+2 días | 6/7/2022 | 19/7/2022 |
| 110 | Bote de carpeta asfáltica, c/camión a una distancia promedio de 12 km (incluido el carguio y el esparcimiento en botadero) | 3 días | 109FF | 14/7/2022 | 19/7/2022 |
| 111 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **52 días** | | **19/7/2022** | **23/9/2022** |
| 112 | Excavación material compacto c/equipo | 16 días | 110 | 19/7/2022 | 8/8/2022 |
| 113 | Regularización de fondo de zanja | 16 días | 112CC+2 días | 21/7/2022 | 10/8/2022 |
| 114 | Asiento de arena, e=0.10 m | 7 días | 113 | 10/8/2022 | 20/8/2022 |
| 115 | Suministro de material base dist. aprox 20.00 km (sujeto a la aprobación del Supervisor) | 5 días | 114 | 20/8/2022 | 26/8/2022 |
| 116 | Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m de espesor (incluido el esparcimiento) | 22 días | 115 | 26/8/2022 | 23/9/2022 |
| 117 | Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 5 días | 116FF | 17/9/2022 | 23/9/2022 |
| 118 | **SUMINISTRO DE TUBERÍA** | **4 días** | 111CC+7 días | **27/7/2022** | **2/8/2022** |
| 119 | Ø8" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp. p/ camp. | 4 días | | 27/7/2022 | 2/8/2022 |
| 120 | **COLOCACIÓN DE TUBERÍA** | **38 días** | **119** | **2/8/2022** | **20/9/2022** |
| 121 | De Ø8" PVC SDR-32.5, c/J.G. | 38 días | | 2/8/2022 | 20/9/2022 |
| 122 | **REGISTROS PREFABRICADOS** | **39 días** | 121CC+7 días | **10/8/2022** | **30/9/2022** |
| 123 | Registro Profundidad promedio 1.00-3.50 M | 39 días | | 10/8/2022 | 30/9/2022 |
| 124 | **ACOMETIDAS DOMICILIARIAS** | **20 días** | | **5/9/2022** | **30/9/2022** |
| 125 | Acometidas Domiciliarias 8" x 4" PVC SDR - 32.5 (120 U) | 20 días | 123FF | 5/9/2022 | 30/9/2022 |

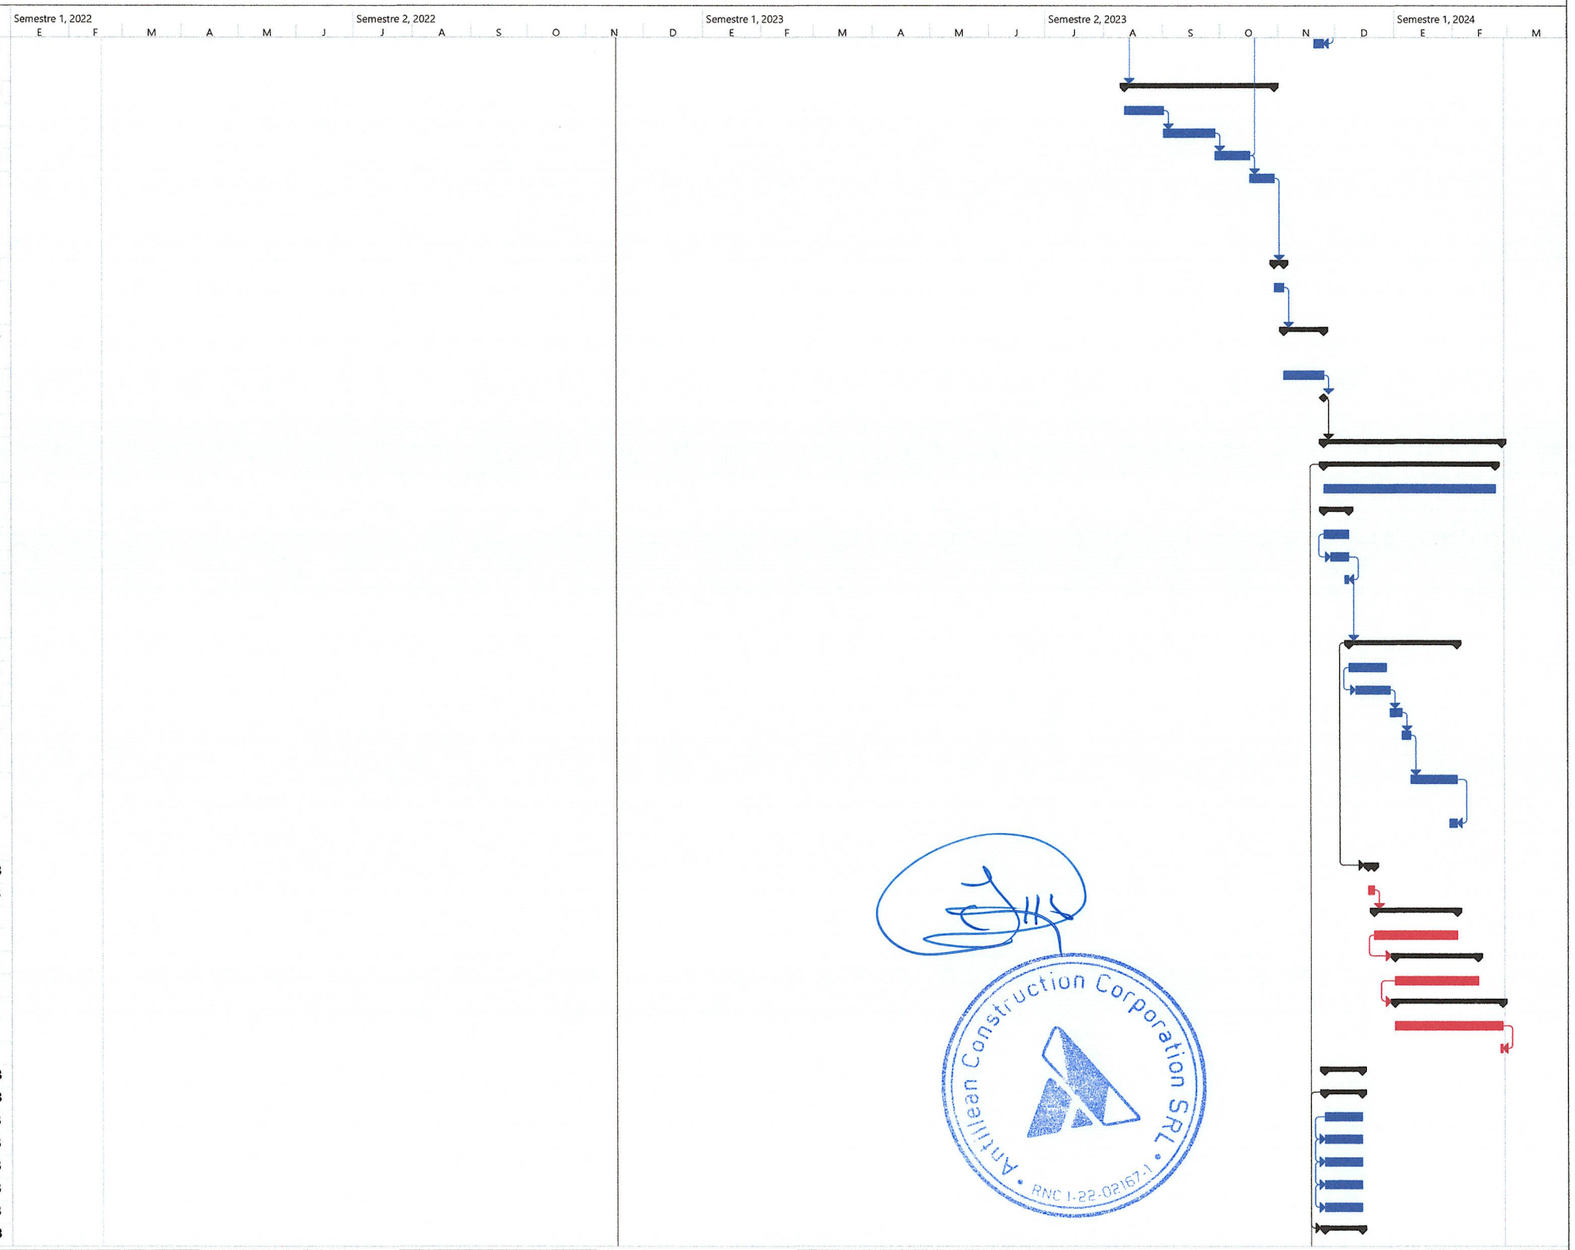


Tarea · Resumen · Tarea resumida · Progreso resumido · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Fecha límite
División · Resumen del proyecto · Tarea crítica resumida · Tareas externas · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Tarea crítica
Hito · Agrupar por síntesis · Hito resumido · Hito externo · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Progreso

Antillean Construction Corporation SRL · RNC 1-22-02167-1

# CRONOGRAMA DE
# CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | **REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES** | **5 días** | **125** | **30/9/2022** | **7/10/2022** |
| 127 | **SUMINISTRO TUBERÍAS** | **5 días** | | **30/9/2022** | **7/10/2022** |
| 128 | De Ø1/2" PVC (SCH-40) | 5 días | | 30/9/2022 | 7/10/2022 |
| 129 | De Ø3/4" PVC (SCH-40) | 5 días | 128CC | 30/9/2022 | 7/10/2022 |
| 130 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 5 días | 129CC | 30/9/2022 | 7/10/2022 |
| 131 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 5 días | 130CC | 30/9/2022 | 7/10/2022 |
| 132 | De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 5 días | 131CC | 30/9/2022 | 7/10/2022 |
| 133 | **SUMINISTRO DE:** | **5 días** | **127CC** | **30/9/2022** | **7/10/2022** |
| 134 | Coupling Ø1/2" PVC | 5 días | | 30/9/2022 | 7/10/2022 |
| 135 | CouplingOUPLING 3/4" PVC | 5 días | 134CC | 30/9/2022 | 7/10/2022 |
| 136 | Coupling 1" PVC | 5 días | 135CC | 30/9/2022 | 7/10/2022 |
| 137 | Coupling Ø2" PVC | 5 días | 136CC | 30/9/2022 | 7/10/2022 |
| 138 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 5 días | 137CC | 30/9/2022 | 7/10/2022 |
| 139 | **MANO DE OBRA** | **25 días** | **124CC** | **5/9/2022** | **7/10/2022** |
| 140 | Maestro plomero (1H) | 25 días | | 5/9/2022 | 7/10/2022 |
| 141 | Peon (2H) | 25 días | | 5/9/2022 | 7/10/2022 |
| 142 | **USO BOMBAS DE ACHIQUE** | **2 días** | | **5/10/2022** | **7/10/2022** |
| 143 | Achique Ø3" (5,5 HP) | 2 días | 141FF | 5/10/2022 | 7/10/2022 |
| 144 | **MISCELÁNEOS** | **17 días** | **142CC** | **5/10/2022** | **26/10/2022** |
| 145 | Demolición de aceras y contenes | 3 días | | 5/10/2022 | 8/10/2022 |
| 146 | Bote de escombros producto de la demolicion de aceras y contenes c/camión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) | 3 días | 145CC | 5/10/2022 | 8/10/2022 |
| 147 | Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm² y refuerzo de fibra de polipropileno | 7 días | 148 | 18/10/2022 | 26/10/2022 |
| 148 | Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm² y refuerzo de fibra de polipropileno | 7 días | 146 | 8/10/2022 | 18/10/2022 |
| 149 | **REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA L= 2,880.00 M** | **14 días** | **147** | **26/10/2022** | **14/11/2022** |
| 150 | Imprimación con arena | 12 días | | 26/10/2022 | 10/11/2022 |
| 151 | Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) | 12 días | 150CC+2 días | 28/10/2022 | 14/11/2022 |
| 152 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km | 12 días | 151CC | 28/10/2022 | 14/11/2022 |
| 153 | **SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DEL TRANSITO** | **103 días** | **107CC** | **4/7/2022** | **14/11/2022** |
| 154 | Limpieza continua y final | 103 días | | 4/7/2022 | 14/11/2022 |
| 155 | FIN DE ETAPA | 0 días | 154 | 14/11/2022 | 14/11/2022 |
| 156 | | | | | |
| 157 | **SECTOR SANTO ZAIDA** | **272 días** | **155** | **14/11/2022** | **3/11/2023** |
| 158 | Replanteo y control topográfico | 272 días | | 14/11/2022 | 3/11/2023 |
| 159 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **172 días** | | **14/11/2022** | **28/6/2023** |
| 160 | Excavación material compacto c/equipo | 65 días | | 14/11/2022 | 7/2/2023 |
| 161 | Regularización de fondo de zanja | 65 días | 160CC+2 día: | 16/11/2022 | 9/2/2023 |
| 162 | Asiento de arena, e=0.10 m | 33 días | 161 | 9/2/2023 | 24/3/2023 |
| 163 | Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m de espesor (incluido el esparcimiento) | 72 días | 162 | 24/3/2023 | 28/6/2023 |
| 164 | Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 15 días | 163FF | 7/6/2023 | 28/6/2023 |
| 165 | **SUMINISTRO DE TUBERÍA** | **10 días** | **162CC** | **9/2/2023** | **22/2/2023** |
| 166 | Ø8" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% pérdida por campana | 10 días | | 9/2/2023 | 22/2/2023 |
| 167 | **COLOCACIÓN DE TUBERÍA** | **90 días** | **166** | **22/2/2023** | **21/6/2023** |
| 168 | De Ø8" PVC SDR-32.5, c/J.G. | 90 días | | 22/2/2023 | 21/6/2023 |
| 169 | **REGISTROS PREFABRICADOS** | **95 días** | **168CC+7 día:** | **4/3/2023** | **6/7/2023** |
| 170 | Registro Profundidad promedio 1.00-3.50 M | 95 días | | 4/3/2023 | 6/7/2023 |
| 171 | Registro Profundidad promedio 3.50-6.00 M | 95 días | 170CC | 4/3/2023 | 6/7/2023 |

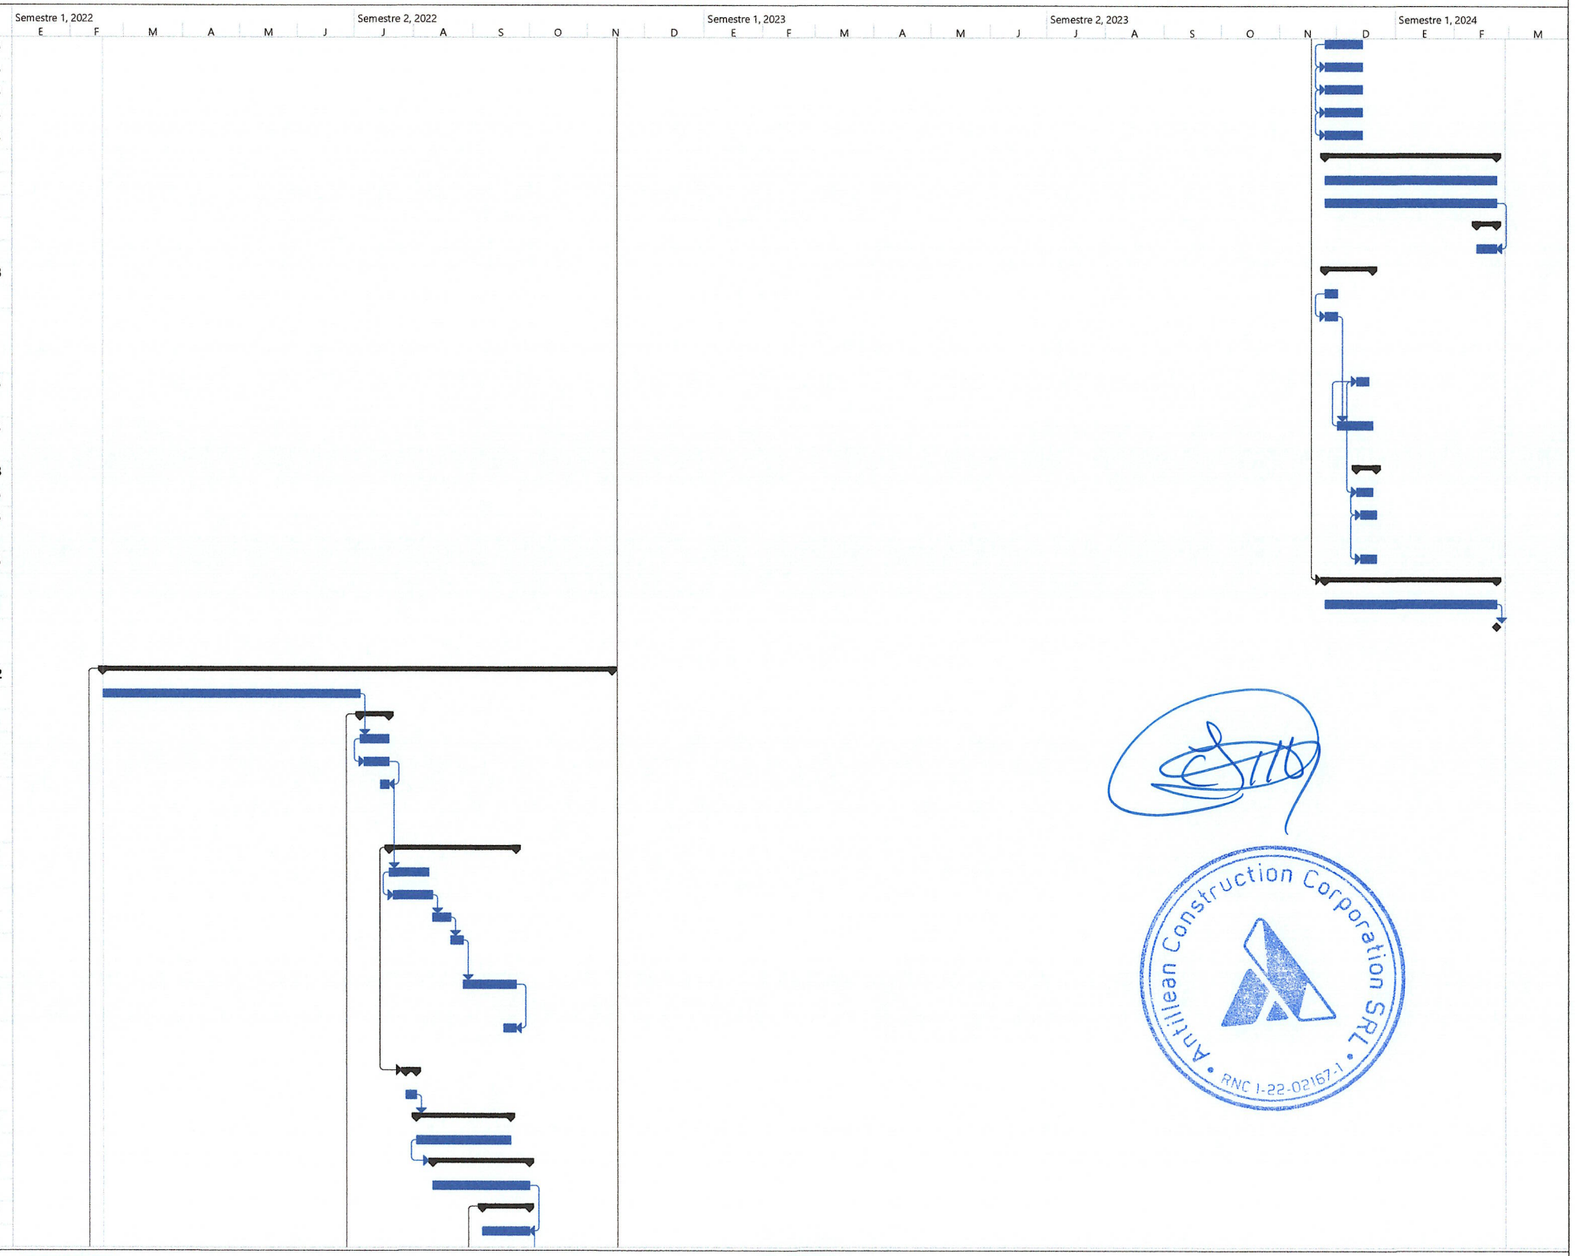


Tarea · Resumen · Tarea resumida · Progreso resumido · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Fecha límite
División · Resumen del proyecto · Tarea crítica resumida · Tareas externas · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Tarea crítica
Hito · Agrupar por síntesis · Hito resumido · Hito externo · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Progreso

Antillean Construction Corporation SRL · RNC 1-22-02167-1

# CRONOGRAMA DE
# CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | **ACOMETIDAS DOMICILIARIAS** | **70 días** | | **5/4/2023** | **6/7/2023** |
| 173 | Acometidas Domiciliarias 8" x 4" PVC SDR - 32.5 (700 U) | 70 días | 171FF | 5/4/2023 | 6/7/2023 |
| 174 | **REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES** | **40 días** | **173** | **6/7/2023** | **28/8/2023** |
| 175 | **SUMINISTRO TUBERÍAS** | **40 días** | | **6/7/2023** | **28/8/2023** |
| 176 | De Ø1/2" PVC (SCH-40) | 40 días | | 6/7/2023 | 28/8/2023 |
| 177 | De Ø3/4" PVC (SCH-40) | 40 días | 176CC | 6/7/2023 | 28/8/2023 |
| 178 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 40 días | 177CC | 6/7/2023 | 28/8/2023 |
| 179 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 40 días | 178CC | 6/7/2023 | 28/8/2023 |
| 180 | De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 40 días | 179CC | 6/7/2023 | 28/8/2023 |
| 181 | **SUMINISTRO DE:** | **40 días** | **175CC** | **6/7/2023** | **28/8/2023** |
| 182 | Coupling Ø1/2" PVC | 40 días | | 6/7/2023 | 28/8/2023 |
| 183 | CouplingOUPLING 3/4" PVC | 40 días | 182CC | 6/7/2023 | 28/8/2023 |
| 184 | Coupling 1" PVC | 40 días | 183CC | 6/7/2023 | 28/8/2023 |
| 185 | Coupling Ø2" PVC | 40 días | 184CC | 6/7/2023 | 28/8/2023 |
| 186 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 40 días | 185CC | 6/7/2023 | 28/8/2023 |
| 187 | **MANO DE OBRA** | **40 días** | **174CC** | **6/7/2023** | **28/8/2023** |
| 188 | Maestro plomero (1H) | 40 días | | 6/7/2023 | 28/8/2023 |
| 189 | Peon (2H) | 40 días | 188CC | 6/7/2023 | 28/8/2023 |
| 190 | **USO BOMBAS DE ACHIQUE** | **7 días** | | **18/8/2023** | **28/8/2023** |
| 191 | Achique Ø3" (5,5 HP) | 7 días | 189FF | 18/8/2023 | 28/8/2023 |
| 192 | **MISCELÁNEOS** | **60 días** | **190CC** | **18/8/2023** | **3/11/2023** |
| 193 | Demolición de aceras y contenes | 16 días | | 18/8/2023 | 8/9/2023 |
| 194 | Bote de escombros producto de la demolicion de aceras y contenes c/camión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) | 16 días | 193CC | 18/8/2023 | 8/9/2023 |
| 195 | Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm² y refuerzo de fibra de polipropileno | 37 días | 196CC+7 días | 18/9/2023 | 3/11/2023 |
| 196 | Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm² y refuerzo de fibra de polipropileno | 37 días | 194 | 8/9/2023 | 25/10/2023 |
| 197 | **SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DEL TRANSITO** | **272 días** | **159CC** | **14/11/2022** | **3/11/2023** |
| 198 | Limpieza continua y final | 272 días | | 14/11/2022 | 3/11/2023 |
| 199 | FIN DE ETAPA | 0 días | 198 | 3/11/2023 | 3/11/2023 |
| 200 | | | | | |
| 201 | **SECTOR MIRA FLOR II** | **146 días** | **105CC** | **18/2/2022** | **29/8/2022** |
| 202 | Replanteo y control topográfico | 146 días | | 18/2/2022 | 29/8/2022 |
| 203 | **CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE ASFALTO** | **18 días** | | **18/2/2022** | **14/3/2022** |
| 204 | Corte de asfalto 2" (ambos lados) | 18 días | | 18/2/2022 | 14/3/2022 |
| 205 | Extracción de carpeta asfáltica | 16 días | 204CC+2 días | 21/2/2022 | 14/3/2022 |
| 206 | Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 6 días | 205FF | 5/3/2022 | 14/3/2022 |
| 207 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **35 días** | **206** | **14/3/2022** | **28/4/2022** |
| 208 | Excavación material compacto c/equipo | 22 días | | 14/3/2022 | 11/4/2022 |
| 209 | Regularización de fondo de zanja | 22 días | 208CC+2 días | 16/3/2022 | 13/4/2022 |
| 210 | Asiento de arena, e=0.10 m | 10 días | | 14/3/2022 | 25/3/2022 |
| 211 | Suministro de material base dist. aprox 20.00 km (sujeto a la aprobación del Supervisor) | 7 días | | 14/3/2022 | 22/3/2022 |
| 212 | Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m de espesor (incluido el esparcimiento) | 35 días | | 14/3/2022 | 28/4/2022 |
| 213 | Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 8 días | | 14/3/2022 | 23/3/2022 |
| 214 | **SUMINISTRO DE TUBERÍA** | **5 días** | | **18/2/2022** | **24/2/2022** |
| 215 | Ø8" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp. p/ camp. | 5 días | | 18/2/2022 | 24/2/2022 |
| 216 | **COLOCACIÓN DE TUBERÍA** | **42 días** | | **18/2/2022** | **13/4/2022** |

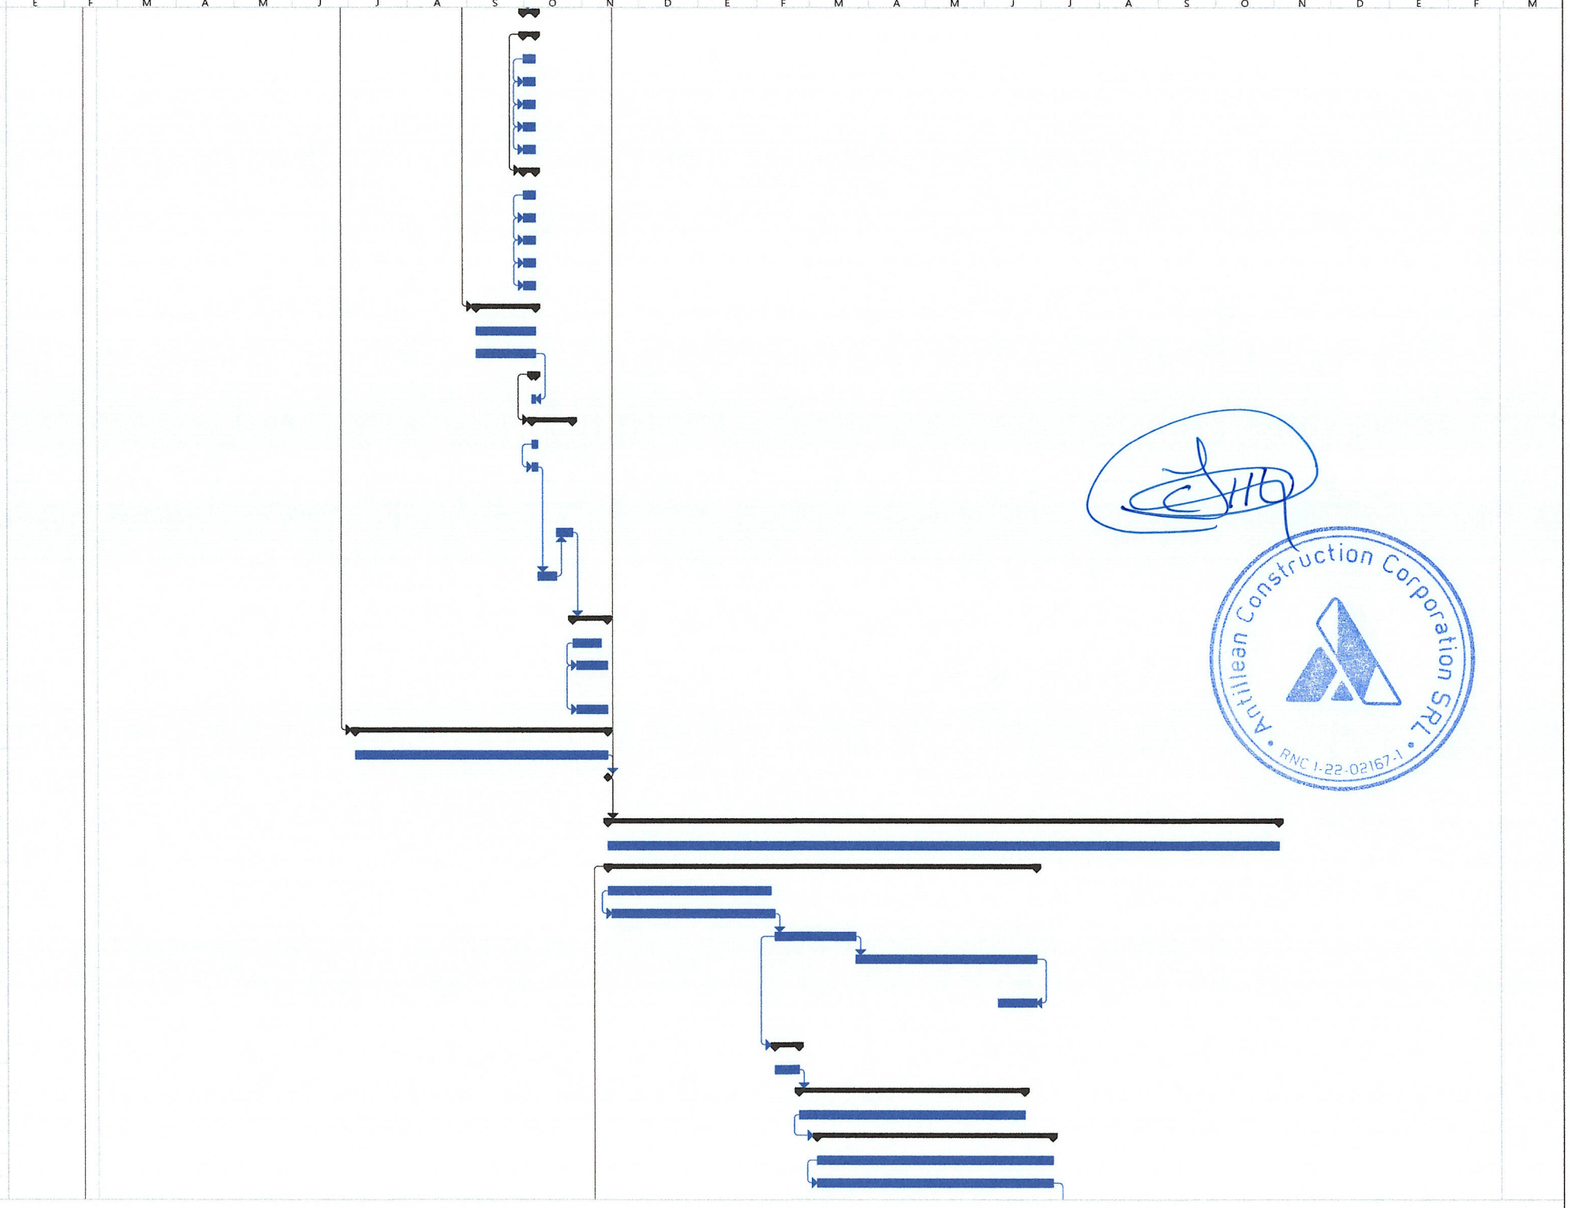


Tarea · Resumen · Tarea resumida · Progreso resumido · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Fecha límite
División · Resumen del proyecto · Tarea crítica resumida · Tareas externas · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Tarea crítica
Hito · Agrupar por síntesis · Hito resumido · Hito externo · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Progreso

Antillean Construction Corporation SRL · RNC 1-22-02167-1

# CRONOGRAMA DE
# CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | De Ø8" PVC SDR-32.5, c/J.G. | 42 días | | 18/2/2022 | 13/4/2022 |
| 218 | **REGISTROS PREFABRICADOS** | **40 días** | | **18/2/2022** | **11/4/2022** |
| 219 | Registro Profundidad promedio 1.00-4.00 M | 40 días | | 18/2/2022 | 11/4/2022 |
| 220 | **ACOMETIDAS DOMICILIARIAS** | **45 días** | | **18/2/2022** | **18/4/2022** |
| 221 | Acometidas Domiciliarias 8" x 4" PVC SDR - 32.5 (300 U) | 45 días | | 18/2/2022 | 18/4/2022 |
| 222 | Acometidas Domiciliarias 8" x 6" PVC SDR - 32.5 (5 U) | 1 día | | 18/2/2022 | 19/2/2022 |
| 223 | **REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES** | **20 días** | | **18/2/2022** | **16/3/2022** |
| 224 | **SUMINISTRO TUBERÍAS** | **20 días** | | **18/2/2022** | **16/3/2022** |
| 225 | De Ø1/2" PVC (SCH-40) | 20 días | | 18/2/2022 | 16/3/2022 |
| 226 | De Ø3/4" PVC (SCH-40) | 20 días | | 18/2/2022 | 16/3/2022 |
| 227 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 20 días | | 18/2/2022 | 16/3/2022 |
| 228 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 20 días | | 18/2/2022 | 16/3/2022 |
| 229 | De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 20 días | | 18/2/2022 | 16/3/2022 |
| 230 | **SUMINISTRO DE:** | **20 días** | | **18/2/2022** | **16/3/2022** |
| 231 | Coupling Ø1/2" PVC | 20 días | | 18/2/2022 | 16/3/2022 |
| 232 | CouplingOUPLING 3/4" PVC | 20 días | | 18/2/2022 | 16/3/2022 |
| 233 | Coupling 1" PVC | 20 días | | 18/2/2022 | 16/3/2022 |
| 234 | Coupling Ø2" PVC | 20 días | | 18/2/2022 | 16/3/2022 |
| 235 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 20 días | | 18/2/2022 | 16/3/2022 |
| 236 | **MANO DE OBRA** | **20 días** | | **18/2/2022** | **16/3/2022** |
| 237 | Maestro plomero (1H) | 20 días | | 18/2/2022 | 16/3/2022 |
| 238 | Peon (2H) | 20 días | | 18/2/2022 | 16/3/2022 |
| 239 | **USO BOMBAS DE ACHIQUE** | **5 días** | | **18/2/2022** | **24/2/2022** |
| 240 | Achique Ø3" (5,5 HP) | 5 días | | 18/2/2022 | 24/2/2022 |
| 241 | **MISCELÁNEOS** | **12 días** | | **18/2/2022** | **5/3/2022** |
| 242 | Demolición de aceras y contenes | 5 días | | 18/2/2022 | 24/2/2022 |
| 243 | Bote de escombros producto de la demolicion de aceras y contenes c/camión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) | 5 días | | 18/2/2022 | 24/2/2022 |
| 244 | Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm² y refuerzo de fibra de polipropileno | 12 días | | 18/2/2022 | 5/3/2022 |
| 245 | Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm² y refuerzo de fibra de polipropileno | 12 días | | 18/2/2022 | 5/3/2022 |
| 246 | **REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA** | **7 días** | | **18/2/2022** | **28/2/2022** |
| 247 | Imprimación con arena | 7 días | | 18/2/2022 | 28/2/2022 |
| 248 | Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye Riego de Adherencia) | 7 días | | 18/2/2022 | 28/2/2022 |
| 249 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km | 7 días | | 18/2/2022 | 28/2/2022 |
| 250 | **SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DEL TRANSITO** | **146 días** | | **18/2/2022** | **29/8/2022** |
| 251 | Limpieza continua y final | 146 días | | 18/2/2022 | 29/8/2022 |
| 252 | FIN DE ETAPA | 0 días | | 18/2/2022 | 18/2/2022 |
| 253 | | | | | |
| 254 | **SECTOR HOYO DE PUCHULA Y BARTOLA** | **366 días** | | **29/8/2022** | **29/12/2023** |
| 255 | Replanteo y control topográfico | 183 días | 202 | 29/8/2022 | 24/4/2023 |
| 256 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **125 días** | | **24/4/2023** | **4/10/2023** |
| 257 | Excavación material compacto c/equipo | 45 días | 255 | 24/4/2023 | 22/6/2023 |
| 258 | Regularización de fondo de zanja | 45 días | 257CC+2 días | 26/4/2023 | 26/6/2023 |
| 259 | Asiento de arena, e=0.10 m | 18 días | 258 | 26/6/2023 | 18/7/2023 |
| 260 | Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m de espesor (incluido el esparcimiento) | 60 días | 259 | 18/7/2023 | 4/10/2023 |
| 261 | Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 8 días | 260FF | 23/9/2023 | 4/10/2023 |
| 262 | **SUMINISTRO DE TUBERÍA** | **7 días** | **259CC** | **26/6/2023** | **4/7/2023** |

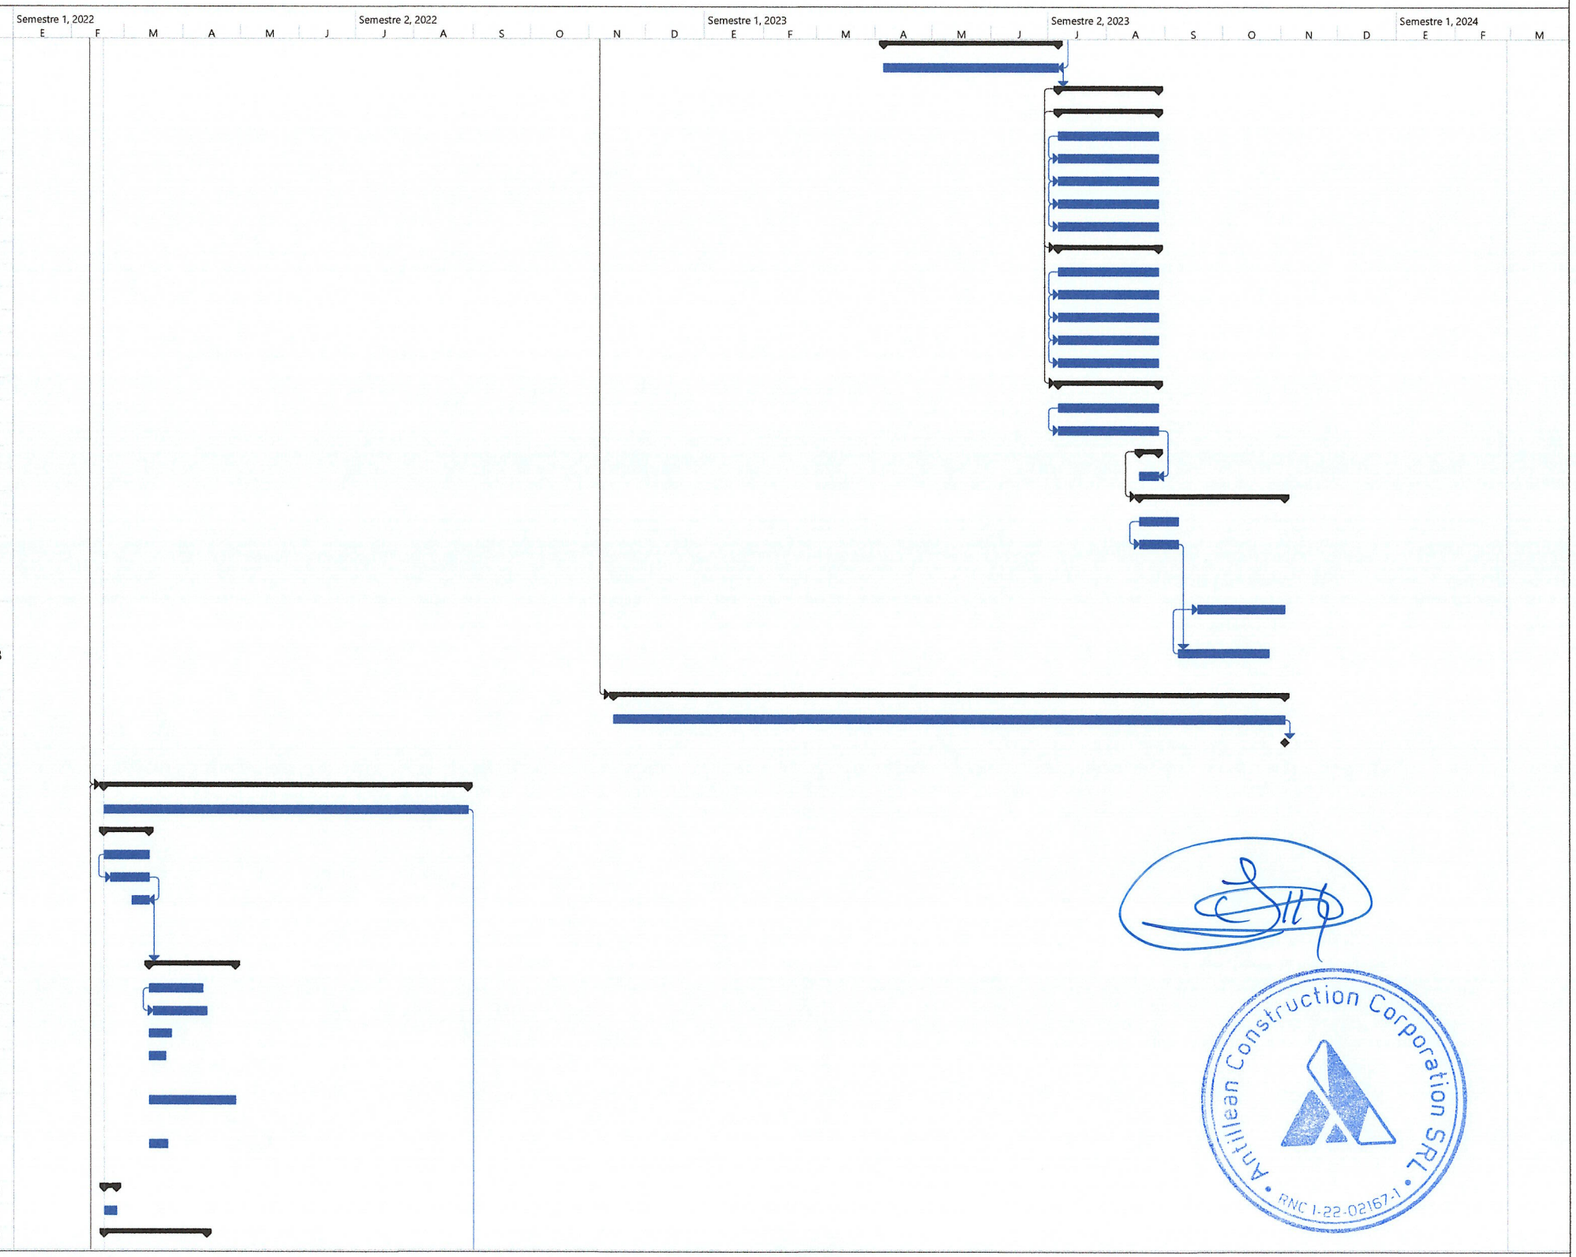





Tarea · Resumen · Tarea resumida · Progreso resumido · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Fecha límite
División · Resumen del proyecto · Tarea crítica resumida · Tareas externas · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Tarea crítica
Hito · Agrupar por síntesis · Hito resumido · Hito externo · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Progreso

# CRONOGRAMA DE
# CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Ø8" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desp. p/ camp. | 7 días | | 26/6/2023 | 4/7/2023 |
| 264 | **COLOCACIÓN DE TUBERÍA** | **69 días** | **263** | **4/7/2023** | **2/10/2023** |
| 265 | Ø8" PVC SDR-32.5, c/J.G. | 69 días | | 4/7/2023 | 2/10/2023 |
| 266 | **REGISTROS PREFABRICADOS** | **65 días** | **!65CC+7 día:** | **13/7/2023** | **5/10/2023** |
| 267 | Registro Profundidad promedio 1.00-3.50 M | 65 días | | 13/7/2023 | 5/10/2023 |
| 268 | Registro Profundidad promedio 3.50-6.00 M | 20 días | 267FF | 9/9/2023 | 5/10/2023 |
| 269 | **ACOMETIDAS DOMICILIARIAS** | **25 días** | | **4/9/2023** | **5/10/2023** |
| 270 | Acometidas Domiciliarias 8" x 4" PVC SDR - 32.5 (120 U) | 25 días | 268FF | 4/9/2023 | 5/10/2023 |
| 271 | **REPARACIÓN DE AVERIAS EN SERVICIOS EXISTENTES** | **40 días** | **270** | **5/10/2023** | **7/12/2023** |
| 272 | **SUMINISTRO TUBERÍAS** | **40 días** | | **5/10/2023** | **7/12/2023** |
| 273 | De Ø1/2" PVC (SCH-40) | 40 días | | 5/10/2023 | 7/12/2023 |
| 274 | De Ø3/4" PVC (SCH-40) | 40 días | 273CC | 5/10/2023 | 7/12/2023 |
| 275 | De Ø1" PVC (SCH-40) | 40 días | 274CC | 5/10/2023 | 7/12/2023 |
| 276 | De Ø2" PVC (SCH-40) | 40 días | 275CC | 5/10/2023 | 7/12/2023 |
| 277 | De Ø3" PVC SDR-26 C/ JG | 40 días | 276CC | 5/10/2023 | 7/12/2023 |
| 278 | **SUMINISTRO DE:** | **40 días** | **272CC** | **5/10/2023** | **7/12/2023** |
| 279 | Coupling Ø1/2" PVC | 40 días | | 5/10/2023 | 7/12/2023 |
| 280 | CouplingOUPLING 3/4" PVC | 40 días | 279CC | 5/10/2023 | 7/12/2023 |
| 281 | Coupling 1" PVC | 40 días | 280CC | 5/10/2023 | 7/12/2023 |
| 282 | Coupling Ø2" PVC | 40 días | 281CC | 5/10/2023 | 7/12/2023 |
| 283 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 40 días | 282CC | 5/10/2023 | 7/12/2023 |
| 284 | **MANO DE OBRA** | **40 días** | **271CC** | **5/10/2023** | **7/12/2023** |
| 285 | Maestro plomero (1H) | 40 días | | 5/10/2023 | 7/12/2023 |
| 286 | Peon (2H) | 40 días | 285CC | 5/10/2023 | 7/12/2023 |
| 287 | **USO BOMBAS DE ACHIQUE** | **8 días** | | **27/11/2023** | **7/12/2023** |
| 288 | Achique Ø3" (5,5 HP) | 8 días | 286FF | 27/11/2023 | 7/12/2023 |
| 289 | **MISCELÁNEOS** | **17 días** | **288** | **7/12/2023** | **29/12/2023** |
| 290 | Demolición de aceras y contenes | 3 días | | 7/12/2023 | 11/12/2023 |
| 291 | Bote de escombros producto de la demolicion de aceras y contenes c/camión a 12 km (incluye el carguio y el esparcimiento en el botadero) | 3 días | 290CC | 7/12/2023 | 11/12/2023 |
| 292 | Reposición de acera con hormigon 210 kg/cm² y refuerzo de fibra de polipropileno | 7 días | 293 | 20/12/2023 | 29/12/2023 |
| 293 | Reposición de contenes con hormigon 210 kg/cm² y refuerzo de fibra de polipropileno | 7 días | 291 | 11/12/2023 | 20/12/2023 |
| 294 | **SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DEL TRANSITO** | **183 días** | **256CC** | **24/4/2023** | **29/12/2023** |
| 295 | Limpieza continua y final | 183 días | | 24/4/2023 | 29/12/2023 |
| 296 | FIN DE ETAPA | 0 días | 295 | 29/12/2023 | 29/12/2023 |
| 297 | | | | | |
| 298 | **RED COLECTORA CONDOMINIAL** | **45 días** | **296** | **29/12/2023** | **26/2/2024** |
| 299 | Replanteo y control topográfico | 45 días | | 29/12/2023 | 26/2/2024 |
| 300 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **43 días** | | **29/12/2023** | **22/2/2024** |
| 301 | Excavación material compacto c/equipo | 9 días | | 29/12/2023 | 10/1/2024 |
| 302 | Regularización de fondo de zanja | 9 días | 301CC+2 días | 2/1/2024 | 12/1/2024 |
| 303 | Asiento de arena, e=0.10 m | 7 días | 302 | 12/1/2024 | 22/1/2024 |
| 304 | Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m de espesor (incluido el esparcimiento) | 25 días | 303 | 22/1/2024 | 22/2/2024 |
| 305 | Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 3 días | 304FF | 19/2/2024 | 22/2/2024 |
| 306 | **SUMINISTRO DE TUBERÍA** | **2 días** | **303CC** | **12/1/2024** | **16/1/2024** |
| 307 | Ø6" PVC SDR-32.5, c/J.G.+ 3% desperdicio por campana | 2 días | | 12/1/2024 | 16/1/2024 |
| 308 | **COLOCACIÓN DE TUBERÍA** | **30 días** | **307** | **16/1/2024** | **22/2/2024** |
| 309 | Ø6" PVC SDR-32.5, c/J.G. | 30 días | | 16/1/2024 | 22/2/2024 |

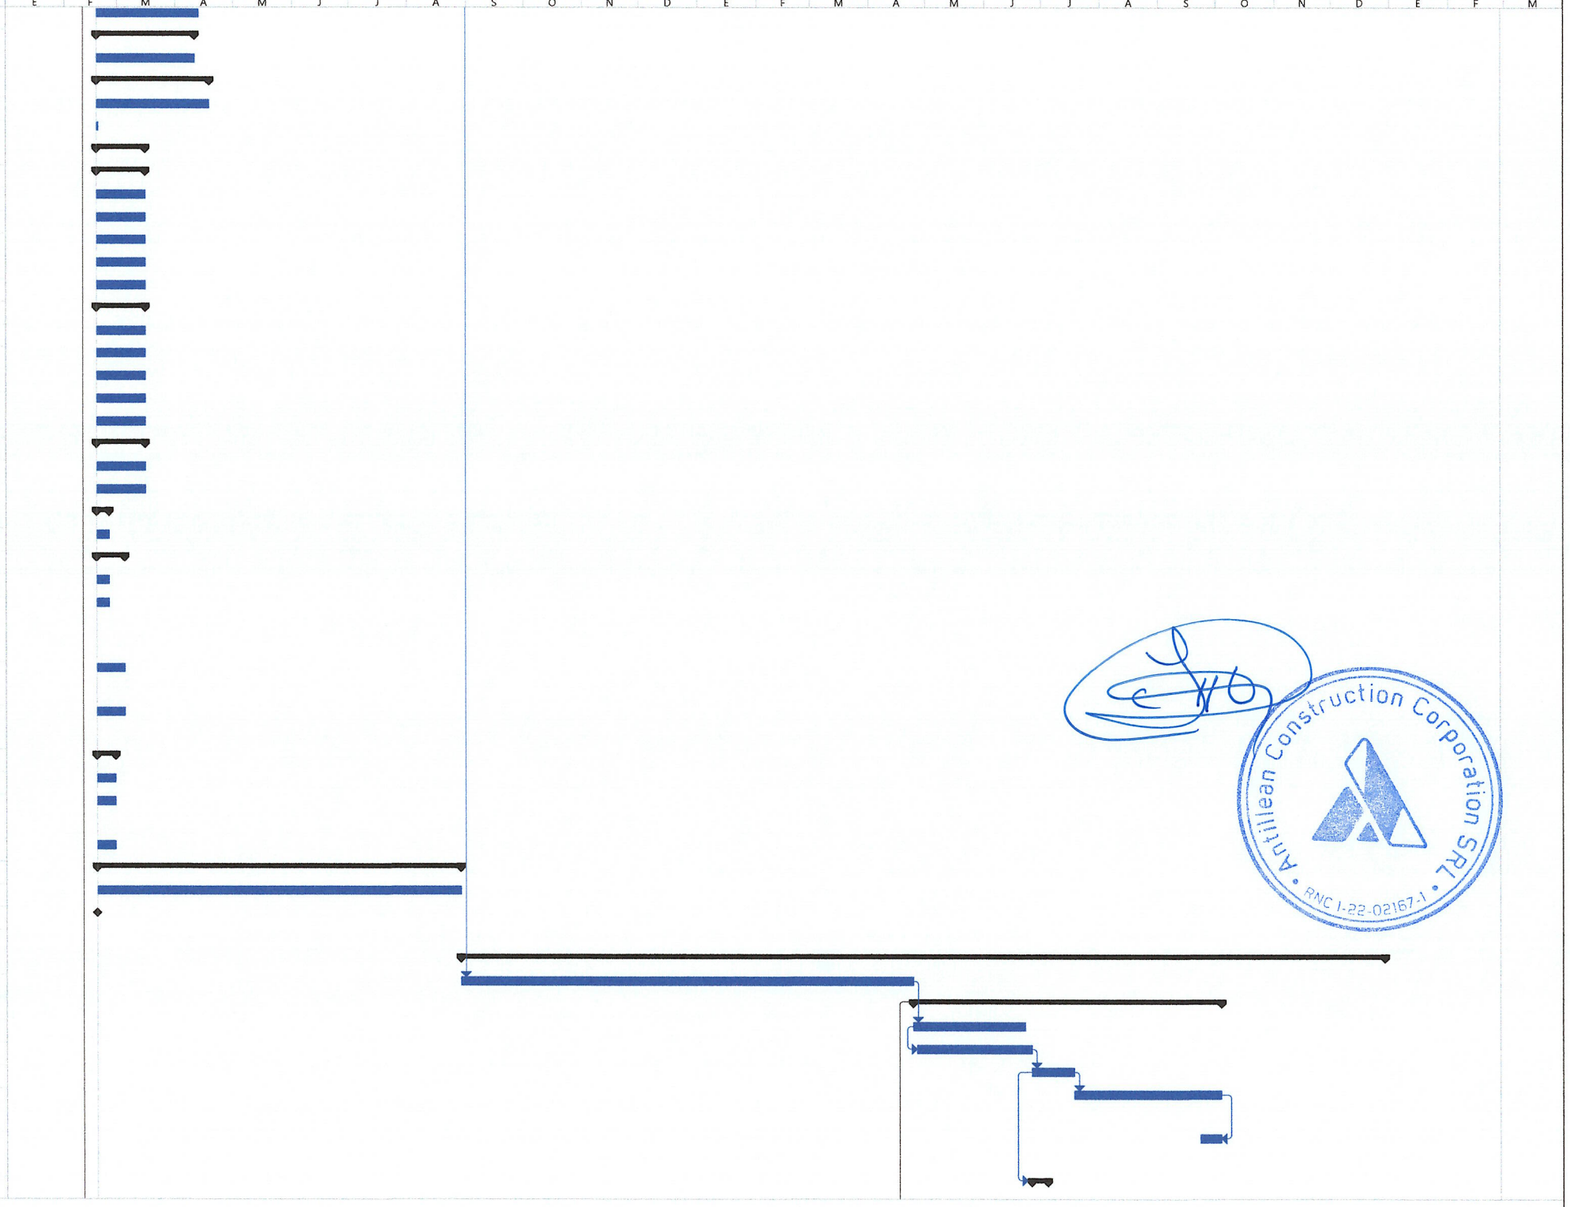


Tarea · Resumen · Tarea resumida · Progreso resumido · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Fecha límite
División · Resumen del proyecto · Tarea crítica resumida · Tareas externas · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Tarea crítica
Hito · Agrupar por síntesis · Hito resumido · Hito externo · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Progreso

# CRONOGRAMA DE
# CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | **CAMARAS DE INSPECCÓN** | **30 días** | | **16/1/2024** | **22/2/2024** |
| 311 | Construcción de camaras de inspeccion de 60 x 60cm | 30 días | 309FF | 16/1/2024 | 22/2/2024 |
| 312 | **ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 6" x 4" PVC SDR - 32.5 (150 U)** | **5 días** | | **14/2/2024** | **20/2/2024** |
| 313 | Reparacion de Registros existentes | 5 días | 311FF-2 días | 14/2/2024 | 20/2/2024 |
| 314 | FIN DE ETAPA | 0 días | 313 | 20/2/2024 | 20/2/2024 |
| 315 | | | | | |
| 316 | **RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE** | **52 días** | **201CC** | **18/2/2022** | **27/4/2022** |
| 317 | **BARRIO LOS SOLARES** | **52 días** | | **18/2/2022** | **27/4/2022** |
| 318 | **PRELIMINARES** | **52 días** | | **18/2/2022** | **27/4/2022** |
| 319 | Replanteo para tubería | 52 días | | 18/2/2022 | 27/4/2022 |
| 320 | **CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO** | **9 días** | | **18/2/2022** | **2/3/2022** |
| 321 | Corte de asfalto e=2" (ambos lados) | 9 días | | 18/2/2022 | 2/3/2022 |
| 322 | Extracción de asfalto | 7 días | 321CC+2 días | 21/2/2022 | 2/3/2022 |
| 323 | Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 2 días | 322FF | 28/2/2022 | 2/3/2022 |
| 324 | **MOVIMIENTO DE TIERRA:** | **27 días** | **323** | **2/3/2022** | **5/4/2022** |
| 325 | Excavación material compacto | 4 días | | 2/3/2022 | 7/3/2022 |
| 326 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 5 días | 325CC+2 días | 4/3/2022 | 10/3/2022 |
| 327 | Suministro material de base D=12 km | 2 días | 326FF | 8/3/2022 | 10/3/2022 |
| 328 | Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m de espesor (incluido el esparcimiento) | 20 días | 327 | 10/3/2022 | 5/4/2022 |
| 329 | Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 3 días | 328FF | 1/4/2022 | 5/4/2022 |
| 330 | **SUMINISTRO DE TUBERÍA:** | **2 días** | **326CC** | **4/3/2022** | **7/3/2022** |
| 331 | De 4" PVC- SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana | 2 días | | 4/3/2022 | 7/3/2022 |
| 332 | De 3" PVC SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana | 2 días | 331CC | 4/3/2022 | 7/3/2022 |
| 333 | **COLOCACIÓN DE TUBERÍA:** | **20 días** | **332** | **7/3/2022** | **1/4/2022** |
| 334 | De 4" PVC-SDR-26 c/J.G | 20 días | | 7/3/2022 | 1/4/2022 |
| 335 | De 3" PVC-SDR-26 c/J.G | 20 días | 334CC | 7/3/2022 | 1/4/2022 |
| 336 | **PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS:** | **3 días** | **335** | **1/4/2022** | **5/4/2022** |
| 337 | De 4" PVC-SDR-26 c/J.G | 3 días | | 1/4/2022 | 5/4/2022 |
| 338 | De 3" PVC-SDR-26 c/J.G | 3 días | 337CC | 1/4/2022 | 5/4/2022 |
| 339 | **PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) :** | **22 días** | **330CC** | **4/3/2022** | **1/4/2022** |
| 340 | Tee 8" x 4" acero SCH-40 | 22 días | | 4/3/2022 | 1/4/2022 |
| 341 | Tee 4" x 4" PVC SCH-40 | 22 días | 340CC | 4/3/2022 | 1/4/2022 |
| 342 | Tee 3" x 3" PVC SCH-40 | 22 días | 341CC | 4/3/2022 | 1/4/2022 |
| 343 | Codo 4"x 45º PVC SCH-40 | 22 días | 342CC | 4/3/2022 | 1/4/2022 |
| 344 | Codo 4"x 90º PVC SCH-40 | 22 días | 343CC | 4/3/2022 | 1/4/2022 |
| 345 | Codo 3"x 45º PVC SCH-40 | 22 días | 344CC | 4/3/2022 | 1/4/2022 |
| 346 | Red 4" x 3" PVC SCH-40 | 22 días | 345CC | 4/3/2022 | 1/4/2022 |
| 347 | Junta Tapón Ø3" | 22 días | 346CC | 4/3/2022 | 1/4/2022 |
| 348 | Juntas mecánica Tipo Dresser Ø8" | 22 días | 347CC | 4/3/2022 | 1/4/2022 |
| 349 | Juntas mecánica Tipo Dresser Ø4" | 22 días | 348CC | 4/3/2022 | 1/4/2022 |
| 350 | Cemento PVC | 22 días | 349CC | 4/3/2022 | 1/4/2022 |
| 351 | Anclajes H.S. para piezas | 22 días | 350CC | 4/3/2022 | 1/4/2022 |
| 352 | **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS:** | **25 días** | **339CC** | **4/3/2022** | **5/4/2022** |
| 353 | Válvula de Compuerta Ø4" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl.: Válvula Platillada, Tornillos, Junta de Goma, Niple Platillada en un extremo, Junta Dresser ) | 25 días | | 4/3/2022 | 5/4/2022 |
| 354 | Caja telescópica p/válvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) | 25 días | 353CC | 4/3/2022 | 5/4/2022 |

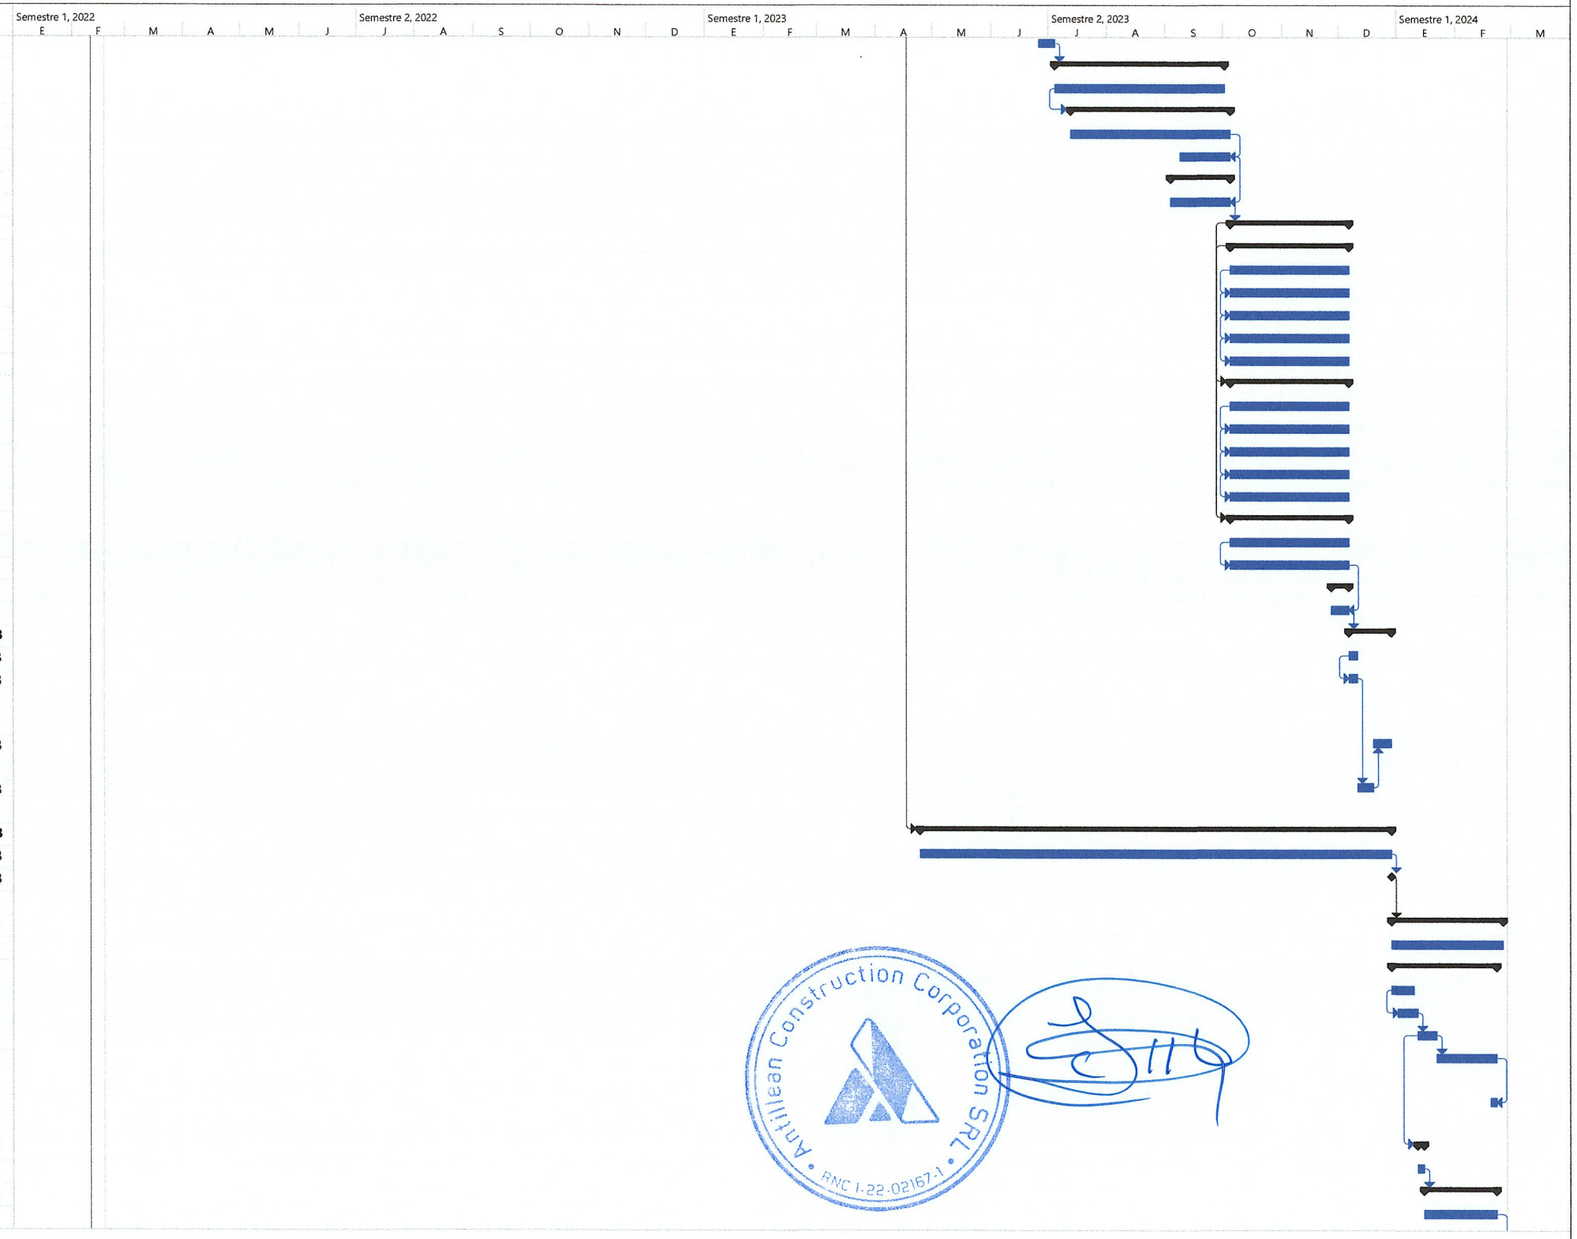


Antillean Construction Corporation SRL
RNC 1-22-02167-1

# CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 355 | **ACOMETIDAS** | **10 días** | **354** | **5/4/2022** | **19/4/2022** |
| 356 | Acometidas Urbanas de Ø3" X Ø½" (incluye valvula, registro de PPR) | 10 días | | 5/4/2022 | 19/4/2022 |
| 357 | **HIDRANTES** | **1 día** | | **18/4/2022** | **19/4/2022** |
| 358 | Hidrantes de 4" (suministro e instalación) | 1 día | 356FF | 18/4/2022 | 19/4/2022 |
| 359 | **REPOSICIÓN DE ASFALTO** | **6 días** | **358** | **19/4/2022** | **27/4/2022** |
| 360 | Imprimación con arena | 4 días | | 19/4/2022 | 25/4/2022 |
| 361 | Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) | 4 días | 360CC+2 días | 21/4/2022 | 27/4/2022 |
| 362 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km | 4 días | 361CC | 21/4/2022 | 27/4/2022 |
| 363 | **SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DEL TRANSITO** | **52 días** | **317CC** | **18/2/2022** | **27/4/2022** |
| 364 | Limpieza continua y final | 52 días | | 18/2/2022 | 27/4/2022 |
| 365 | FIN DE ETAPA | 0 días | 364 | 27/4/2022 | 27/4/2022 |
| 366 | | | | | |
| 367 | **ZONA NORTE GURABO** | **82 días** | **365** | **27/4/2022** | **11/8/2022** |
| 368 | **PRELIMINARES** | **82 días** | | **27/4/2022** | **11/8/2022** |
| 369 | Replanteo para tubería | 82 días | | 27/4/2022 | 11/8/2022 |
| 370 | **CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO** | **18 días** | | **27/4/2022** | **20/5/2022** |
| 371 | Corte de asfalto e=2" (ambos lados) | 18 días | | 27/4/2022 | 20/5/2022 |
| 372 | Extracción de asfalto | 16 días | 371CC+2 días | 29/4/2022 | 20/5/2022 |
| 373 | Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 5 días | 372FF | 14/5/2022 | 20/5/2022 |
| 374 | **MOVIMIENTO DE TIERRA:** | **34 días** | **373** | **20/5/2022** | **5/7/2022** |
| 375 | Excavación material compacto | 7 días | | 20/5/2022 | 30/5/2022 |
| 376 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 8 días | 375CC+2 días | 24/5/2022 | 2/6/2022 |
| 377 | Suministro material de base D=12 km | 3 días | 376FF | 30/5/2022 | 2/6/2022 |
| 378 | Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m de espesor (incluido el esparcimiento) | 24 días | 377 | 2/6/2022 | 5/7/2022 |
| 379 | Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 5 días | 378FF | 28/6/2022 | 5/7/2022 |
| 380 | **SUMINISTRO DE TUBERÍA:** | **3 días** | **376CC** | **24/5/2022** | **27/5/2022** |
| 381 | De 3" PVC SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana | 3 días | | 24/5/2022 | 27/5/2022 |
| 382 | **COLOCACIÓN DE TUBERÍA:** | **25 días** | **381** | **27/5/2022** | **29/6/2022** |
| 383 | De 3" PVC-SDR-26 c/J.G | 25 días | | 27/5/2022 | 29/6/2022 |
| 384 | **PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS:** | **3 días** | **383** | **29/6/2022** | **4/7/2022** |
| 385 | De 3" PVC-SDR-26 c/J.G | 3 días | | 29/6/2022 | 4/7/2022 |
| 386 | **PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) :** | **31 días** | **380CC** | **24/5/2022** | **4/7/2022** |
| 387 | Tee 3" x 3" PVC SCH-40 | 31 días | | 24/5/2022 | 4/7/2022 |
| 388 | Codo 3"x 45º PVC SCH-40 | 31 días | 387CC | 24/5/2022 | 4/7/2022 |
| 389 | Codo 3"x 90º PVC SCH-40 | 31 días | 388CC | 24/5/2022 | 4/7/2022 |
| 390 | Red 4" x 3" PVC SCH-40 | 31 días | 389CC | 24/5/2022 | 4/7/2022 |
| 391 | Junta Tapón Ø3" | 31 días | 390CC | 24/5/2022 | 4/7/2022 |
| 392 | Juntas mecánica Tipo Dresser Ø4" | 31 días | 391CC | 24/5/2022 | 4/7/2022 |
| 393 | Cemento PVC | 31 días | 392CC | 24/5/2022 | 4/7/2022 |
| 394 | **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS:** | **32 días** | **386CC** | **24/5/2022** | **5/7/2022** |
| 395 | Válvula de Compuerta Ø3" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl.: Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un extremo, junta dresser ) | 32 días | | 24/5/2022 | 5/7/2022 |
| 396 | Caja telescópica p/válvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) | 32 días | 395CC | 24/5/2022 | 5/7/2022 |
| 397 | **ACOMETIDAS** | **20 días** | **396** | **5/7/2022** | **29/7/2022** |

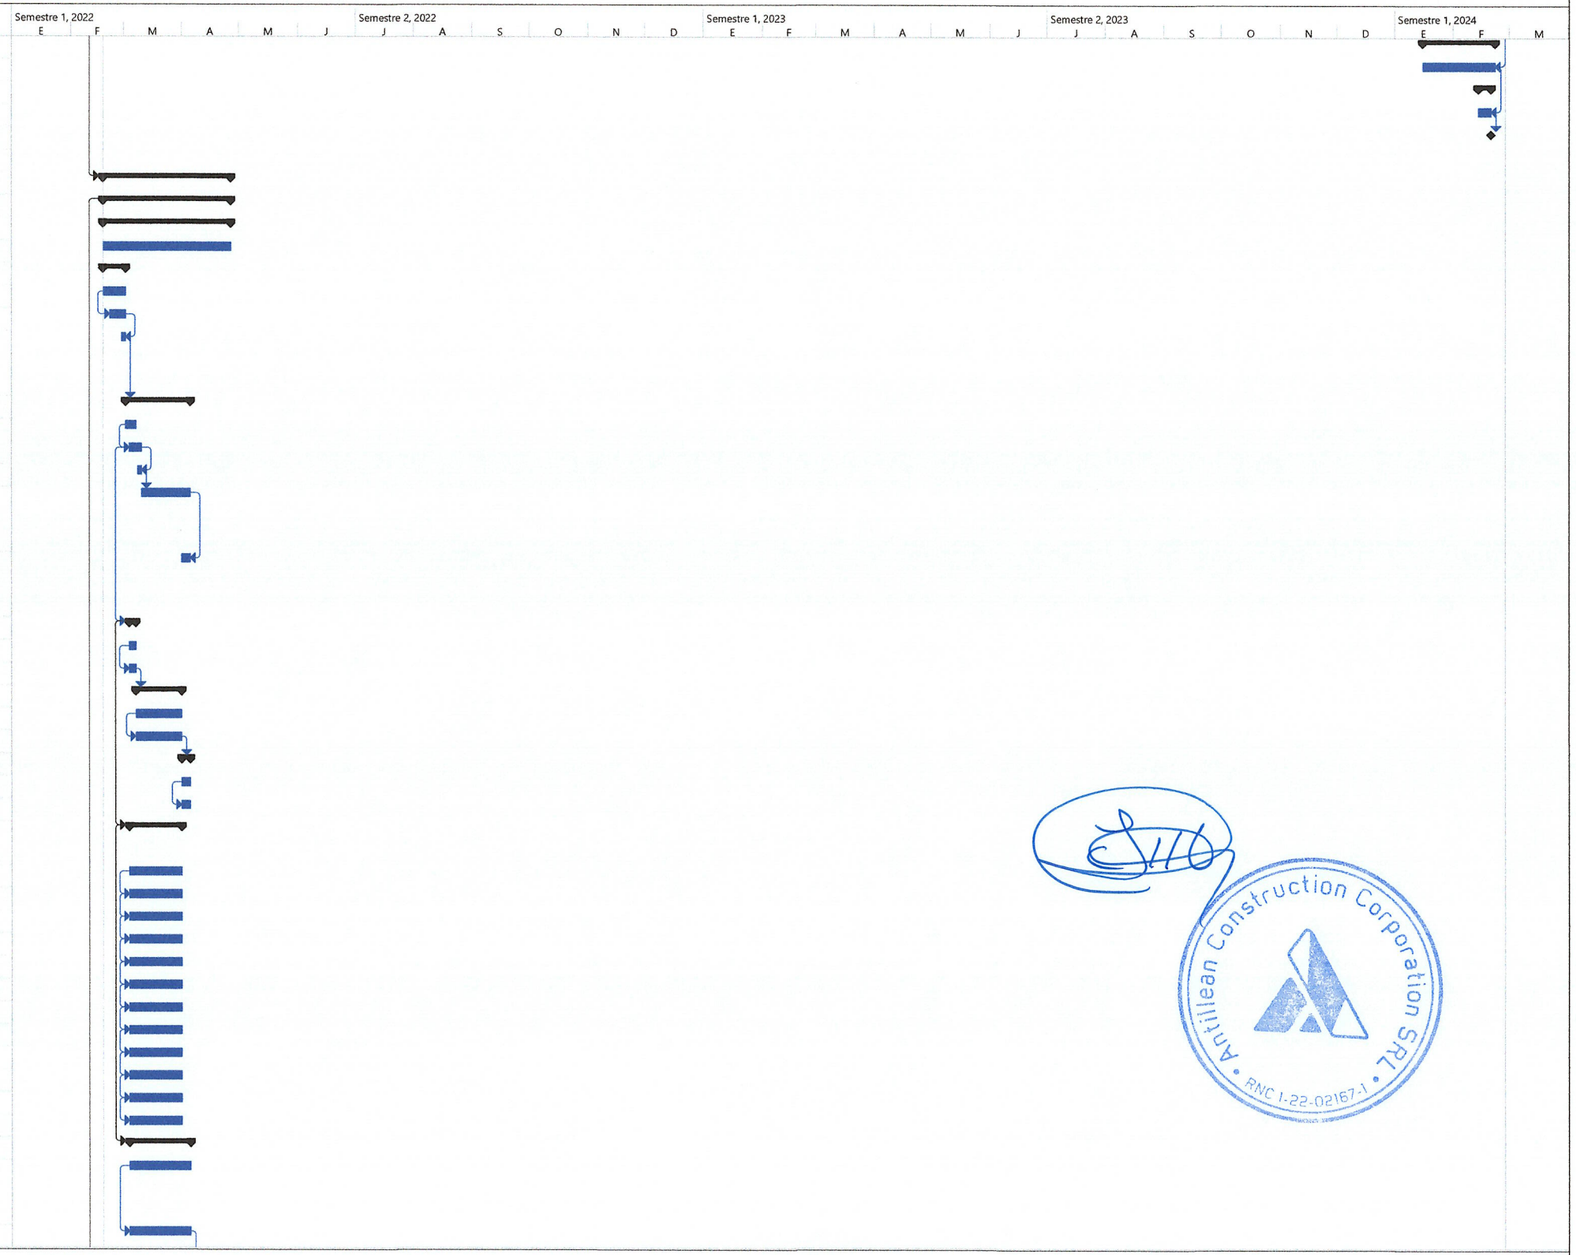


Tarea · Resumen · Tarea resumida · Progreso resumido · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Fecha límite
División · Resumen del proyecto · Tarea crítica resumida · Tareas externas · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Tarea crítica
Hito · Agrupar por síntesis · Hito resumido · Hito externo · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Progreso

Antillean Construction Corporation SRL • RNC 1-22-02167-1 •

# CRONOGRAMA DE
# CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 398 | Acometidas Urbanas de Ø3" X Ø½" (incluye valvula, registro de PPR) | 20 días | | 5/7/2022 | 29/7/2022 |
| 399 | **REPOSICIÓN DE ASFALTO** | **10 días** | **398** | **29/7/2022** | **11/8/2022** |
| 400 | Imprimación con arena | 8 días | | 29/7/2022 | 9/8/2022 |
| 401 | Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) | 8 días | 400CC+2 días | 2/8/2022 | 11/8/2022 |
| 402 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km | 8 días | 401CC | 2/8/2022 | 11/8/2022 |
| 403 | **SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DEL TRANSITO** | **82 días** | **368CC** | **27/4/2022** | **11/8/2022** |
| 404 | Limpieza continua y final | 82 días | | 27/4/2022 | 11/8/2022 |
| 405 | FIN DE ETAPA | 0 días | 404 | 11/8/2022 | 11/8/2022 |
| 406 | | | | | |
| 407 | **BARRIO LOS SANTOS** | **69 días** | **405** | **11/8/2022** | **9/11/2022** |
| 408 | **PRELIMINARES** | **69 días** | | **11/8/2022** | **9/11/2022** |
| 409 | Replanteo para tubería | 69 días | | 11/8/2022 | 9/11/2022 |
| 410 | **CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO** | **12 días** | | **11/8/2022** | **29/8/2022** |
| 411 | Corte de asfalto e=2" (ambos lados) | 12 días | | 11/8/2022 | 29/8/2022 |
| 412 | Extracción de asfalto | 10 días | 411CC+2 días | 15/8/2022 | 29/8/2022 |
| 413 | Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 3 días | 412FF | 24/8/2022 | 29/8/2022 |
| 414 | **MOVIMIENTO DE TIERRA:** | **29 días** | **413** | **29/8/2022** | **5/10/2022** |
| 415 | Excavación material compacto | 6 días | | 29/8/2022 | 5/9/2022 |
| 416 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 7 días | 415CC+2 días | 31/8/2022 | 8/9/2022 |
| 417 | Suministro material de base D= 4 km | 2 días | 416FF | 6/9/2022 | 8/9/2022 |
| 418 | Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m de espesor (incluido el esparcimiento) | 20 días | 417 | 8/9/2022 | 5/10/2022 |
| 419 | Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 3 días | 418FF | 30/9/2022 | 5/10/2022 |
| 420 | **SUMINISTRO DE TUBERÍA:** | **3 días** | **416CC** | **31/8/2022** | **3/9/2022** |
| 421 | De 3" PVC SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana | 3 días | | 31/8/2022 | 3/9/2022 |
| 422 | De 6" PVC SDR-26 c/J.G + 3% por pérdida de campana | 3 días | 421CC | 31/8/2022 | 3/9/2022 |
| 423 | **COLOCACIÓN DE TUBERÍA:** | **21 días** | **422** | **3/9/2022** | **30/9/2022** |
| 424 | De 3" PVC-SDR-26 c/J.G | 21 días | | 3/9/2022 | 30/9/2022 |
| 425 | De 6" PVC SDR-26 c/J.G | 21 días | 424CC | 3/9/2022 | 30/9/2022 |
| 426 | **PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS:** | **3 días** | **425** | **30/9/2022** | **5/10/2022** |
| 427 | De 3" PVC-SDR-26 c/J.G | 3 días | | 30/9/2022 | 5/10/2022 |
| 428 | De 6" PVC SDR-26 c/J.G | 3 días | 427CC | 30/9/2022 | 5/10/2022 |
| 429 | **PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) :** | **24 días** | **420CC** | **31/8/2022** | **30/9/2022** |
| 430 | Tee 16" x 6" acero SCH-40 | 24 días | | 31/8/2022 | 30/9/2022 |
| 431 | Tee 6" x 3" acero SCH-40 | 24 días | 430CC | 31/8/2022 | 30/9/2022 |
| 432 | Codo 6" x 35° acero SCH-40 | 24 días | 431CC | 31/8/2022 | 30/9/2022 |
| 433 | Codo 6" x 60° acero SCH-40 | 24 días | 432CC | 31/8/2022 | 30/9/2022 |
| 434 | Codo 6" x 80° acero SCH-40 | 24 días | 433CC | 31/8/2022 | 30/9/2022 |
| 435 | Codo 6" x 45° acero SCH-40 | 24 días | 434CC | 31/8/2022 | 30/9/2022 |
| 436 | Codo 6" x 20° acero SCH-40 | 24 días | 435CC | 31/8/2022 | 30/9/2022 |
| 437 | Tee 3" x 3" PVC SCH-40 | 24 días | 436CC | 31/8/2022 | 30/9/2022 |
| 438 | Codo 3"x 90º PVC SCH-40 | 24 días | 437CC | 31/8/2022 | 30/9/2022 |
| 439 | Junta Tapón Ø3" | 24 días | 438CC | 31/8/2022 | 30/9/2022 |
| 440 | Junta Tapón Ø6" | 24 días | 439CC | 31/8/2022 | 30/9/2022 |
| 441 | Juntas mecánica Tipo Dresser Ø16" | 24 días | 440CC | 31/8/2022 | 30/9/2022 |
| 442 | Juntas mecánica Tipo Dresser Ø6" | 24 días | 441CC | 31/8/2022 | 30/9/2022 |
| 443 | Juntas mecánica Tipo Dresser Ø3" | 24 días | 442CC | 31/8/2022 | 30/9/2022 |

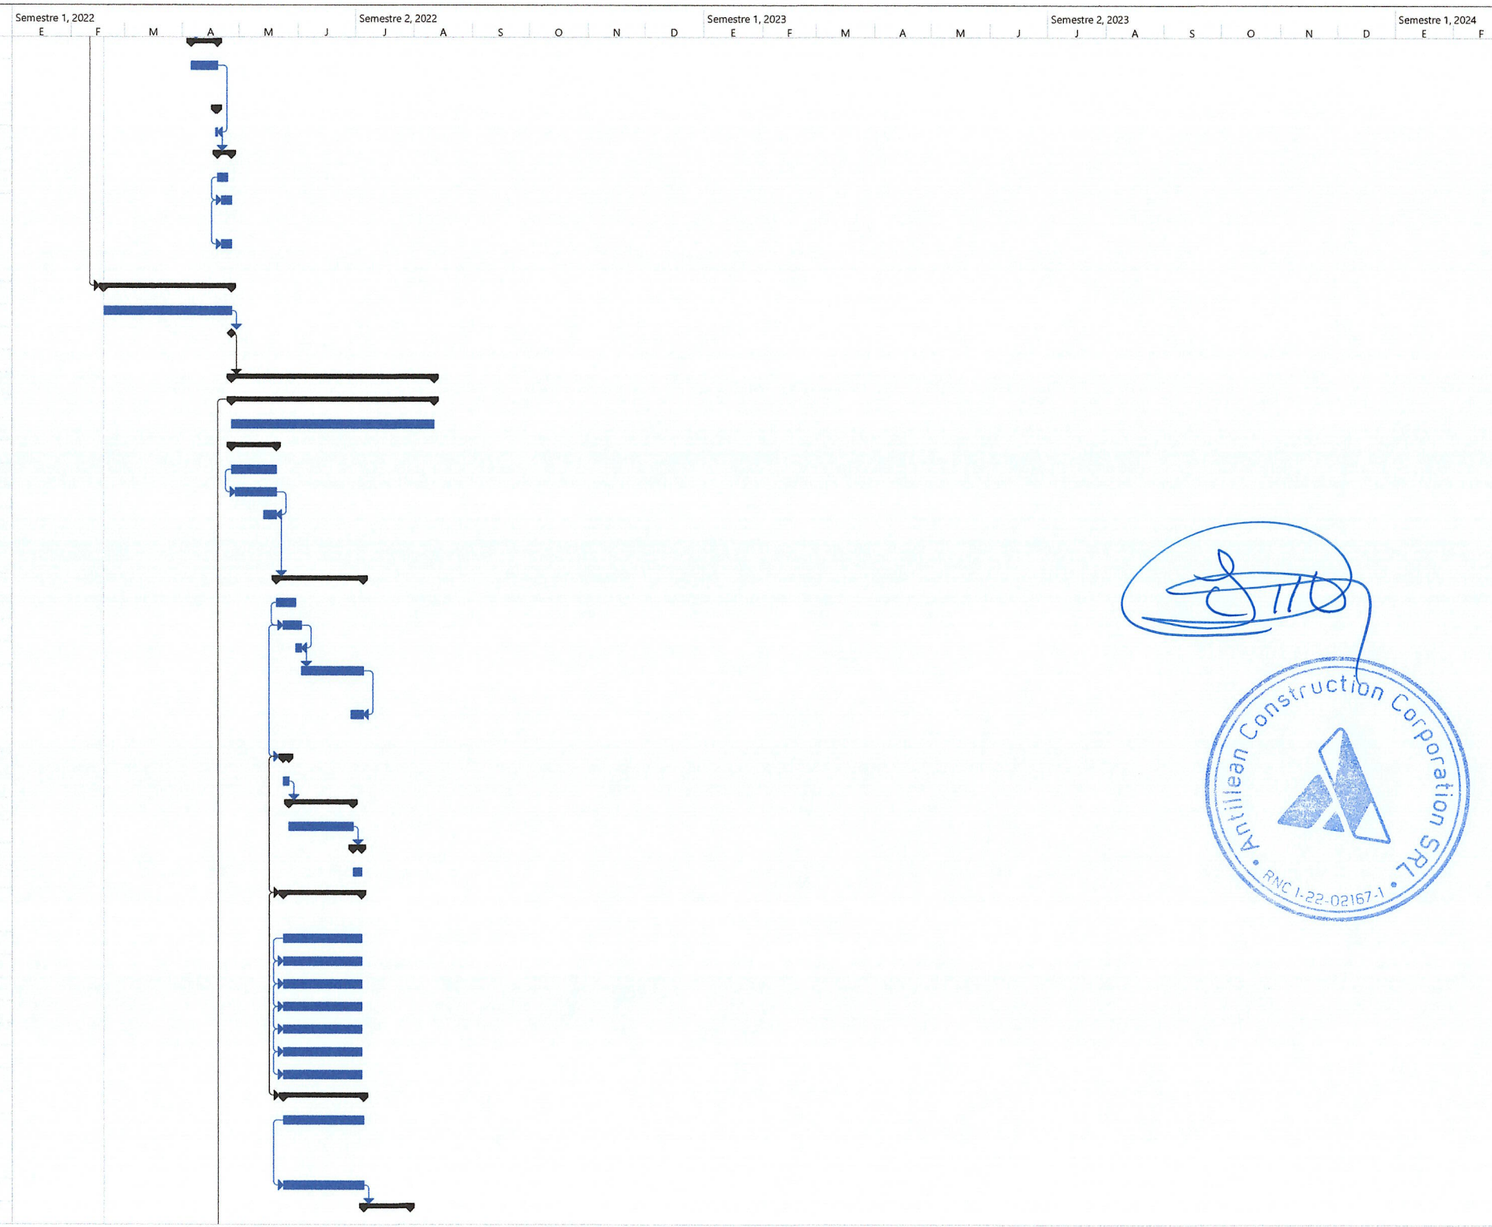


Tarea · Resumen · Tarea resumida · Progreso resumido · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Fecha límite
División · Resumen del proyecto · Tarea crítica resumida · Tareas externas · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Tarea crítica
Hito · Agrupar por síntesis · Hito resumido · Hito externo · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Progreso

Antillean Construction Corporation SRL · RNC 1-22-02167-1

# CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 444 | Cemento PVC | 24 días | 443CC | 31/8/2022 | 30/9/2022 |
| 445 | Anclajes H.S. para piezas | 24 días | 444CC | 31/8/2022 | 30/9/2022 |
| 446 | **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS:** | **27 días** | **429CC** | **31/8/2022** | **5/10/2022** |
| 447 | Válvula de Compuerta Ø6" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl.: Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un extremo, junta dresser ) | 27 días | | 31/8/2022 | 5/10/2022 |
| 448 | Caja telescópica p/válvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) | 27 días | 447CC | 31/8/2022 | 5/10/2022 |
| 449 | **ACOMETIDAS** | **20 días** | **448** | **5/10/2022** | **31/10/2022** |
| 450 | Acometidas Urbanas de Ø3" X Ø½" (incluye valvula, registro de PPR) | 20 días | | 5/10/2022 | 31/10/2022 |
| 451 | **HIDRANTE:** | **2 días** | | **27/10/2022** | **31/10/2022** |
| 452 | Hidrante de 6" (Suministro e instalación) | 2 días | 450FF | 27/10/2022 | 31/10/2022 |
| 453 | **REPOSICIÓN DE ASFALTO** | **8 días** | **452** | **31/10/2022** | **9/11/2022** |
| 454 | Imprimación con arena | 6 días | | 31/10/2022 | 7/11/2022 |
| 455 | Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) | 6 días | 454CC+2 días | 2/11/2022 | 9/11/2022 |
| 456 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km | 6 días | 455CC | 2/11/2022 | 9/11/2022 |
| 457 | **SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DEL TRANSITO** | **69 días** | **408CC** | **11/8/2022** | **9/11/2022** |
| 458 | Limpieza continua y final | 69 días | | 11/8/2022 | 9/11/2022 |
| 459 | FIN DE ETAPA | 0 días | 458 | 9/11/2022 | 9/11/2022 |
| 460 | | | | | |
| 461 | **REDES DISTRIBUCIÓN URBANIZACIÓN LAS CAYENAS** | **51 días** | **459** | **9/11/2022** | **14/1/2023** |
| 462 | **PRELIMINARES** | **51 días** | | **9/11/2022** | **14/1/2023** |
| 463 | Replanteo para tubería | 51 días | | 9/11/2022 | 14/1/2023 |
| 464 | **CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO** | **12 días** | | **9/11/2022** | **24/11/2022** |
| 465 | Corte de asfalto e=2" (ambos lados) | 12 días | | 9/11/2022 | 24/11/2022 |
| 466 | Extracción de asfalto | 10 días | 465CC+2 día: | 11/11/2022 | 24/11/2022 |
| 467 | Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 3 días | 466FF | 21/11/2022 | 24/11/2022 |
| 468 | **MOVIMIENTO DE TIERRA:** | **25 días** | **467** | **24/11/2022** | **27/12/2022** |
| 469 | Excavación material compacto | 6 días | | 24/11/2022 | 2/12/2022 |
| 470 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 7 días | 469CC+2 día: | 28/11/2022 | 6/12/2022 |
| 471 | Suministro material de base D= 4 km | 2 días | 470FF | 3/12/2022 | 6/12/2022 |
| 472 | Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m de espesor (incluido el esparcimiento) | 16 días | 471 | 6/12/2022 | 27/12/2022 |
| 473 | Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 3 días | 472FF | 22/12/2022 | 27/12/2022 |
| 474 | **SUMINISTRO DE TUBERÍA:** | **2 días** | **470CC** | **28/11/2022** | **30/11/2022** |
| 475 | De 3" PVC SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana | 2 días | | 28/11/2022 | 30/11/2022 |
| 476 | **COLOCACIÓN DE TUBERÍA:** | **18 días** | **475** | **30/11/2022** | **22/12/2022** |
| 477 | De 3" PVC-SDR-26 c/J.G | 18 días | | 30/11/2022 | 22/12/2022 |
| 478 | **PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS:** | **3 días** | **477** | **22/12/2022** | **27/12/2022** |
| 479 | De 3" PVC-SDR-26 c/J.G | 3 días | | 22/12/2022 | 27/12/2022 |
| 480 | **PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) :** | **20 días** | **474CC** | **28/11/2022** | **22/12/2022** |
| 481 | Tee 4" x 3" acero SCH-40 | 20 días | | 28/11/2022 | 22/12/2022 |
| 482 | Niple de 4" acero SCH-40 | 20 días | 481CC | 28/11/2022 | 22/12/2022 |
| 483 | Tee 3" x 3" PVC SCH-40 | 20 días | 482CC | 28/11/2022 | 22/12/2022 |
| 484 | Codo 3"x 45º PVC SCH-40 | 20 días | 483CC | 28/11/2022 | 22/12/2022 |
| 485 | Codo 3"x 90º PVC SCH-40 | 20 días | 484CC | 28/11/2022 | 22/12/2022 |
| 486 | Junta Tapón Ø3" | 20 días | 485CC | 28/11/2022 | 22/12/2022 |
| 487 | Juntas mecánica Tipo Dresser Ø3" | 20 días | 486CC | 28/11/2022 | 22/12/2022 |
| 488 | Juntas mecánica Tipo Dresser Ø4" | 20 días | 487CC | 28/11/2022 | 22/12/2022 |

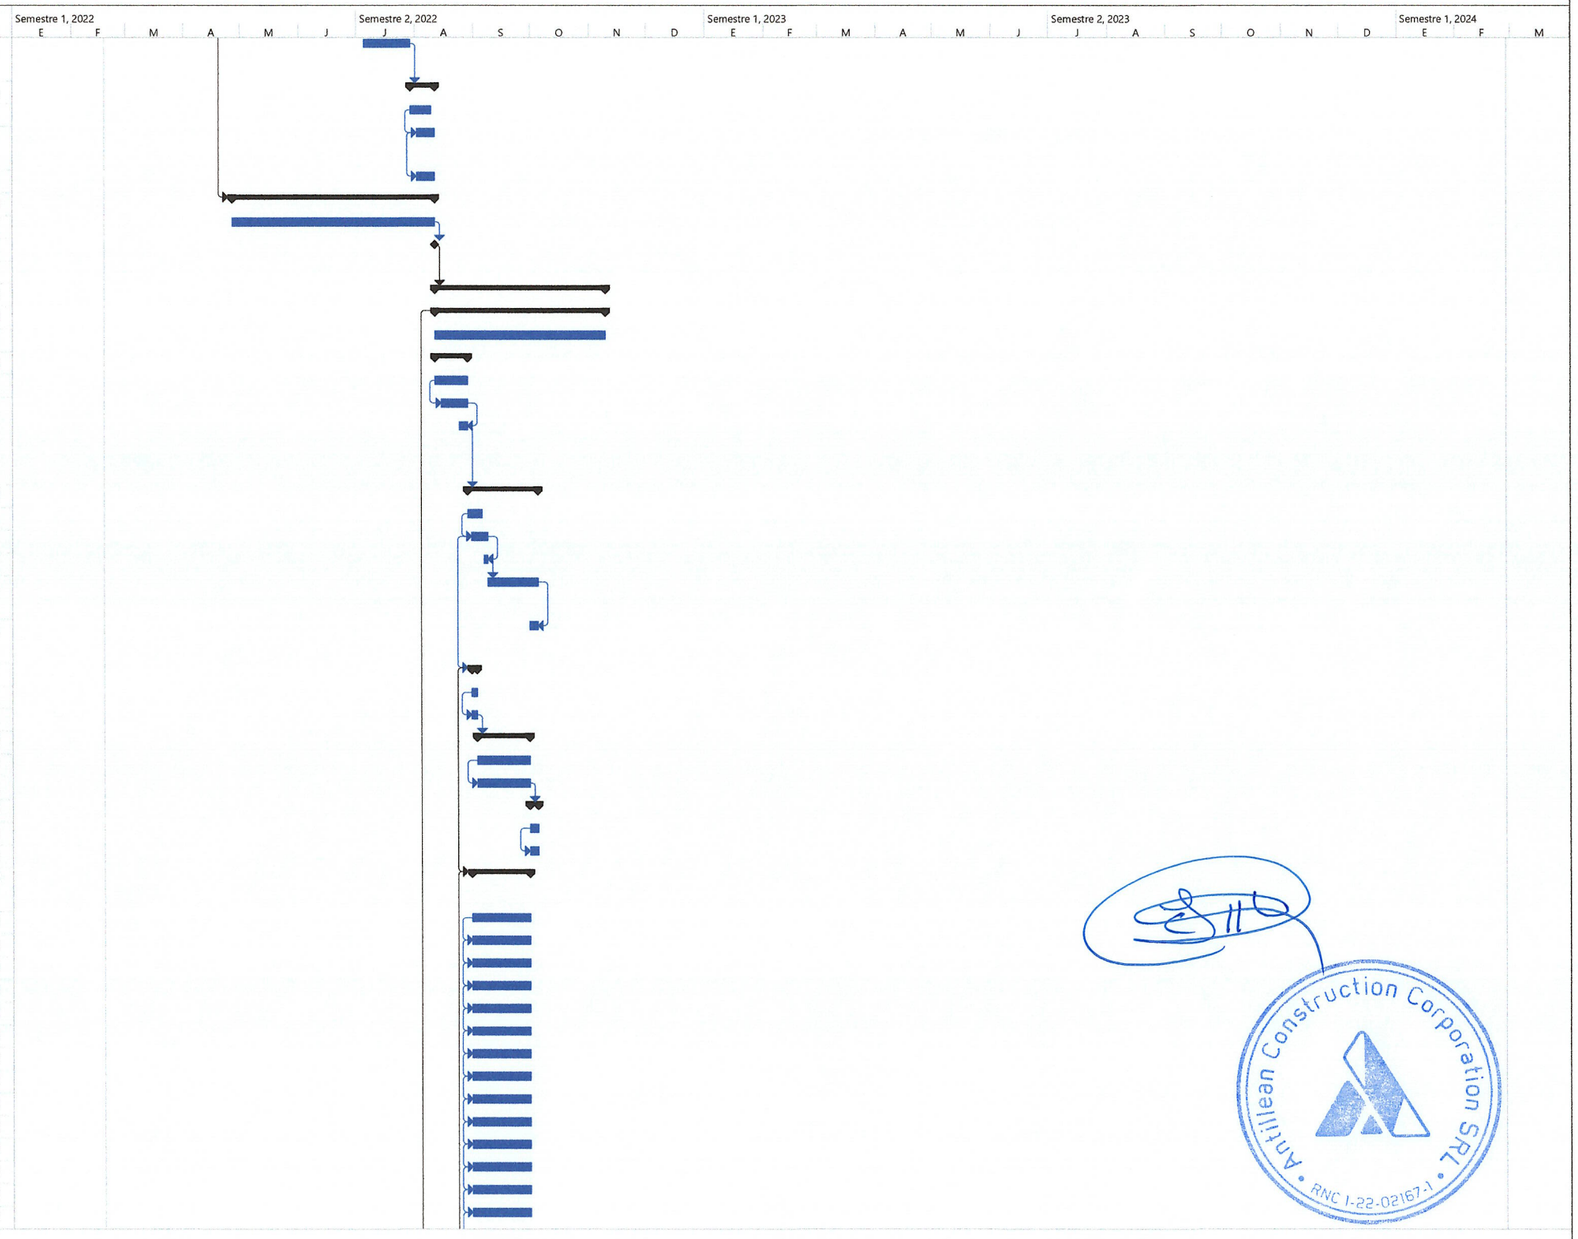


Tarea · Resumen · Tarea resumida · Progreso resumido · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Fecha límite
División · Resumen del proyecto · Tarea crítica resumida · Tareas externas · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Tarea crítica
Hito · Agrupar por síntesis · Hito resumido · Hito externo · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Progreso

Antillean Construction Corporation SRL · RNC 1-22-02167-1

# CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 489 | Cemento PVC | 20 días | 488CC | 28/11/2022 | 22/12/2022 |
| 490 | **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS:** | **23 días** | **480CC** | **28/11/2022** | **27/12/2022** |
| 491 | Válvula de Compuerta Ø3" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl.: Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un extremo, junta dresser ) | 23 días | | 28/11/2022 | 27/12/2022 |
| 492 | Caja telescópica p/válvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) | 23 días | 491CC | 28/11/2022 | 27/12/2022 |
| 493 | **ACOMETIDAS** | **7 días** | **492** | **27/12/2022** | **4/1/2023** |
| 494 | Acometidas Urbanas de Ø3" X Ø½" (incluye valvula, registro de PPR) | 7 días | | 27/12/2022 | 4/1/2023 |
| 495 | **REPOSICIÓN DE ASFALTO** | **7 días** | **494** | **4/1/2023** | **14/1/2023** |
| 496 | Imprimación con arena | 5 días | | 4/1/2023 | 12/1/2023 |
| 497 | Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) | 5 días | 496CC+2 días | 9/1/2023 | 14/1/2023 |
| 498 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km | 5 días | 497CC | 9/1/2023 | 14/1/2023 |
| 499 | **SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DEL TRANSITO** | **51 días** | **462CC** | **9/11/2022** | **14/1/2023** |
| 500 | Limpieza continua y final | 51 días | | 9/11/2022 | 14/1/2023 |
| 501 | FIN DE ETAPA | 0 días | 500 | 14/1/2023 | 14/1/2023 |
| 502 | | | | | |
| 503 | **REDES DISTRIBUCIÓN ZONA SUR AV. ESTRELLA SADHALÁ** | **68 días** | **501** | **14/1/2023** | **14/4/2023** |
| 504 | **PRELIMINARES** | **68 días** | | **14/1/2023** | **14/4/2023** |
| 505 | Replanteo para tubería | 68 días | | 14/1/2023 | 14/4/2023 |
| 506 | **CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO** | **12 días** | | **14/1/2023** | **1/2/2023** |
| 507 | Corte de asfalto e=2" (ambos lados) | 12 días | | 14/1/2023 | 1/2/2023 |
| 508 | Extracción de asfalto | 10 días | 507CC+2 días | 17/1/2023 | 1/2/2023 |
| 509 | Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 3 días | 508FF | 27/1/2023 | 1/2/2023 |
| 510 | **MOVIMIENTO DE TIERRA:** | **28 días** | **509** | **1/2/2023** | **9/3/2023** |
| 511 | Excavación material compacto | 6 días | | 1/2/2023 | 8/2/2023 |
| 512 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 7 días | 511CC+2 días | 3/2/2023 | 13/2/2023 |
| 513 | Suministro material de base D= 4 km | 3 días | 512FF | 8/2/2023 | 13/2/2023 |
| 514 | Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m de espesor (incluido el esparcimiento) | 19 días | 513 | 13/2/2023 | 9/3/2023 |
| 515 | Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 3 días | 514FF | 6/3/2023 | 9/3/2023 |
| 516 | **SUMINISTRO DE TUBERÍA:** | **3 días** | **512CC** | **3/2/2023** | **7/2/2023** |
| 517 | De 4" PVC SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana | 3 días | | 3/2/2023 | 7/2/2023 |
| 518 | De 3" PVC SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana | 3 días | 517CC | 3/2/2023 | 7/2/2023 |
| 519 | **COLOCACIÓN DE TUBERÍA:** | **20 días** | **518** | **7/2/2023** | **6/3/2023** |
| 520 | De 4" PVC-SDR-26 c/J.G | 20 días | | 7/2/2023 | 6/3/2023 |
| 521 | De 3" PVC-SDR-26 c/J.G | 20 días | 520CC | 7/2/2023 | 6/3/2023 |
| 522 | **PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS:** | **3 días** | **521** | **6/3/2023** | **9/3/2023** |
| 523 | De 4" PVC-SDR-26 c/J.G | 3 días | | 6/3/2023 | 9/3/2023 |
| 524 | De 3" PVC-SDR-26 c/J.G | 3 días | 523CC | 6/3/2023 | 9/3/2023 |
| 525 | **PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) :** | **23 días** | **516CC** | **3/2/2023** | **6/3/2023** |
| 526 | Tee 18" x 4" acero SCH-40 | 23 días | | 3/2/2023 | 6/3/2023 |
| 527 | Niple de 4" acero SCH-40 | 23 días | 526CC | 3/2/2023 | 6/3/2023 |
| 528 | Niple de 3" acero SCH-40 | 23 días | 527CC | 3/2/2023 | 6/3/2023 |
| 529 | Tee 4" x 4" PVC SCH-40 | 23 días | 528CC | 3/2/2023 | 6/3/2023 |
| 530 | Tee 3" x 4" PVC SCH-40 | 23 días | 529CC | 3/2/2023 | 6/3/2023 |
| 531 | Tee 3" x 3" PVC SCH-40 | 23 días | 530CC | 3/2/2023 | 6/3/2023 |
| 532 | Codo 4"x 90º PVC SCH-40 | 23 días | 531CC | 3/2/2023 | 6/3/2023 |
| 533 | Codo 3"x 45º PVC SCH-40 | 23 días | 532CC | 3/2/2023 | 6/3/2023 |

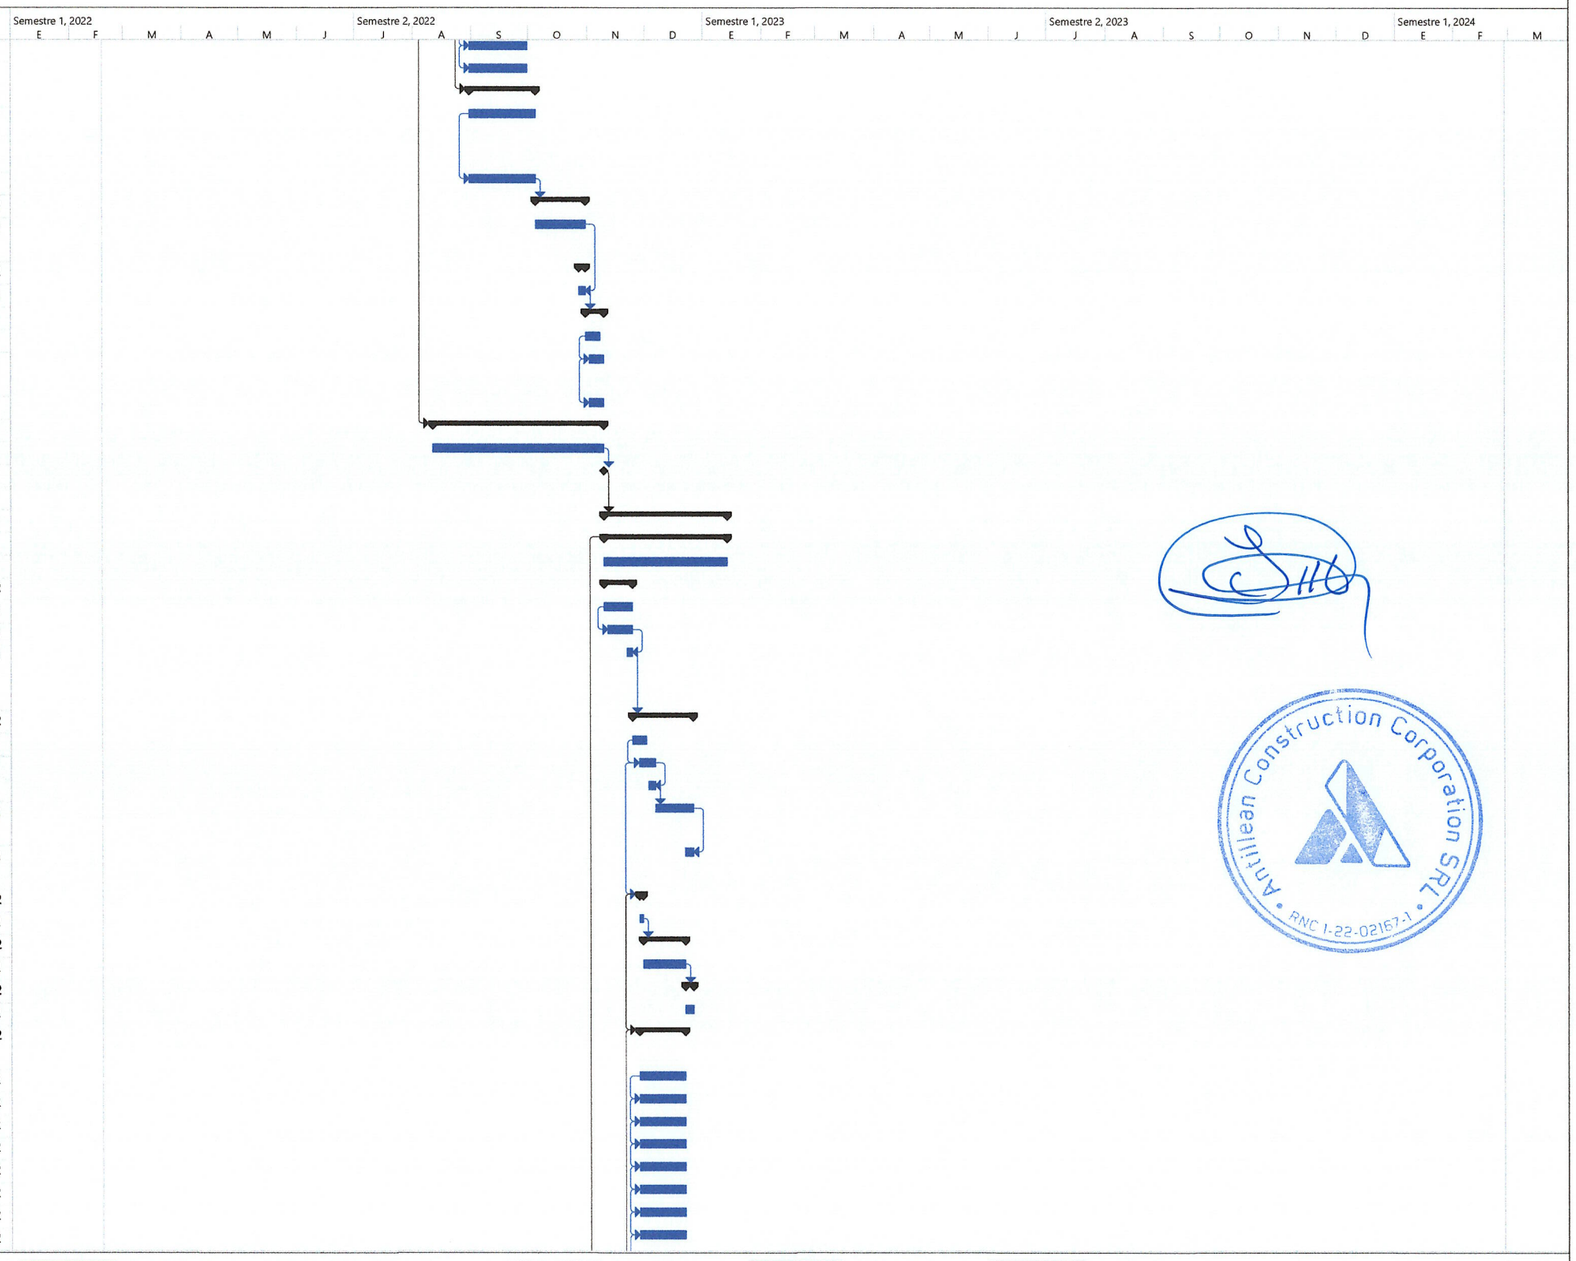


Tarea · Resumen · Tarea resumida · Progreso resumido · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Fecha límite
División · Resumen del proyecto · Tarea crítica resumida · Tareas externas · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Tarea crítica
Hito · Agrupar por síntesis · Hito resumido · Hito externo · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Progreso

Antillean Construction Corporation SRL · RNC 1-22-02167-1

# CRONOGRAMA DE
# CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 534 | Codo 3"x 90º PVC SCH-40 | 23 días | 533CC | 3/2/2023 | 6/3/2023 |
| 535 | Red 4" x 3" PVC SCH-40 | 23 días | 534CC | 3/2/2023 | 6/3/2023 |
| 536 | Junta Tapón Ø3" | 23 días | 535CC | 3/2/2023 | 6/3/2023 |
| 537 | Juntas mecánica Tipo Dresser Ø18" | 23 días | 536CC | 3/2/2023 | 6/3/2023 |
| 538 | Juntas mecánica Tipo Dresser Ø4" | 23 días | 537CC | 3/2/2023 | 6/3/2023 |
| 539 | Cemento PVC | 23 días | 538CC | 3/2/2023 | 6/3/2023 |
| 540 | Anclajes H.S. para piezas | 23 días | 539CC | 3/2/2023 | 6/3/2023 |
| 541 | **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS:** | **26 días** | **525CC** | **3/2/2023** | **9/3/2023** |
| 542 | Válvula de Compuerta Ø4" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl.: Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un extremo, junta dresser ) | 26 días | | 3/2/2023 | 9/3/2023 |
| 543 | Caja telescópica p/válvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) | 26 días | 542CC | 3/2/2023 | 9/3/2023 |
| 544 | **ACOMETIDAS** | **20 días** | **543** | **9/3/2023** | **4/4/2023** |
| 545 | Acometidas Urbanas de Ø3" X Ø½" (incluye valvula, registro de PPR) | 20 días | | 9/3/2023 | 4/4/2023 |
| 546 | **REPOSICIÓN DE ASFALTO** | **8 días** | **545** | **4/4/2023** | **14/4/2023** |
| 547 | Imprimación con arena | 6 días | | 4/4/2023 | 12/4/2023 |
| 548 | Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) | 6 días | 547CC+2 días | 6/4/2023 | 14/4/2023 |
| 549 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km | 6 días | 548CC | 6/4/2023 | 14/4/2023 |
| 550 | **SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DEL TRANSITO** | **68 días** | **504CC** | **14/1/2023** | **14/4/2023** |
| 551 | Limpieza continua y final | 68 días | | 14/1/2023 | 14/4/2023 |
| 552 | FIN DE ETAPA | 0 días | 551 | 14/4/2023 | 14/4/2023 |
| 553 | | | | | |
| 554 | **REDES DISTRIBUCIÓN SECTOR MIRAFLOR I** | **53 días** | **552** | **14/4/2023** | **23/6/2023** |
| 555 | **PRELIMINARES** | **53 días** | | **14/4/2023** | **23/6/2023** |
| 556 | Replanteo para tubería | 53 días | | 14/4/2023 | 23/6/2023 |
| 557 | **CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO** | **10 días** | | **14/4/2023** | **27/4/2023** |
| 558 | Corte de asfalto e=2" (ambos lados) | 10 días | | 14/4/2023 | 27/4/2023 |
| 559 | Extracción de asfalto | 8 días | 558CC+2 días | 18/4/2023 | 27/4/2023 |
| 560 | Bote de material producto de la remocion de la carpeta asfaltica con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 2 días | 559FF | 25/4/2023 | 27/4/2023 |
| 561 | **MOVIMIENTO DE TIERRA:** | **22 días** | **560** | **27/4/2023** | **26/5/2023** |
| 562 | Excavación material compacto | 5 días | | 27/4/2023 | 5/5/2023 |
| 563 | Asiento de arena (suministro y colocación) | 6 días | 562CC+2 días | 1/5/2023 | 9/5/2023 |
| 564 | Suministro material de base D= 4 km | 2 días | 563FF | 6/5/2023 | 9/5/2023 |
| 565 | Compactar el relleno con compactador mecánico en capas de 0.20. m de espesor (incluido el esparcimiento) | 14 días | 564 | 9/5/2023 | 26/5/2023 |
| 566 | Bote de material con camion a una distancia aproximada de 12 km (incluye carguio y esparcimiento en botadero) | 3 días | 565FF | 23/5/2023 | 26/5/2023 |
| 567 | **SUMINISTRO DE TUBERÍA:** | **2 días** | **563CC** | **1/5/2023** | **4/5/2023** |
| 568 | De 4" PVC- SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana | 2 días | | 1/5/2023 | 4/5/2023 |
| 569 | De 3" PVC SDR-26 c/J.G + 2% por pérdida de campana | 2 días | 568CC | 1/5/2023 | 4/5/2023 |
| 570 | **COLOCACIÓN DE TUBERÍA:** | **15 días** | **569** | **4/5/2023** | **23/5/2023** |
| 571 | De 4" PVC-SDR-26 c/J.G | 15 días | | 4/5/2023 | 23/5/2023 |
| 572 | De 3" PVC-SDR-26 c/J.G | 15 días | 571CC | 4/5/2023 | 23/5/2023 |
| 573 | **PRUEBAS HIDROSTÁTICAS CON ACOMETIDAS:** | **3 días** | **572** | **23/5/2023** | **26/5/2023** |
| 574 | De 4" PVC-SDR-26 c/J.G | 3 días | | 23/5/2023 | 26/5/2023 |
| 575 | De 3" PVC-SDR-26 c/J.G | 3 días | 574CC | 23/5/2023 | 26/5/2023 |
| 576 | **PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) :** | **17 días** | **567CC** | **1/5/2023** | **23/5/2023** |
| 577 | Tee 3" x 3" PVC SCH-40 | 17 días | | 1/5/2023 | 23/5/2023 |
| 578 | Codo 4"x 45º PVC SCH-40 | 17 días | 577CC | 1/5/2023 | 23/5/2023 |

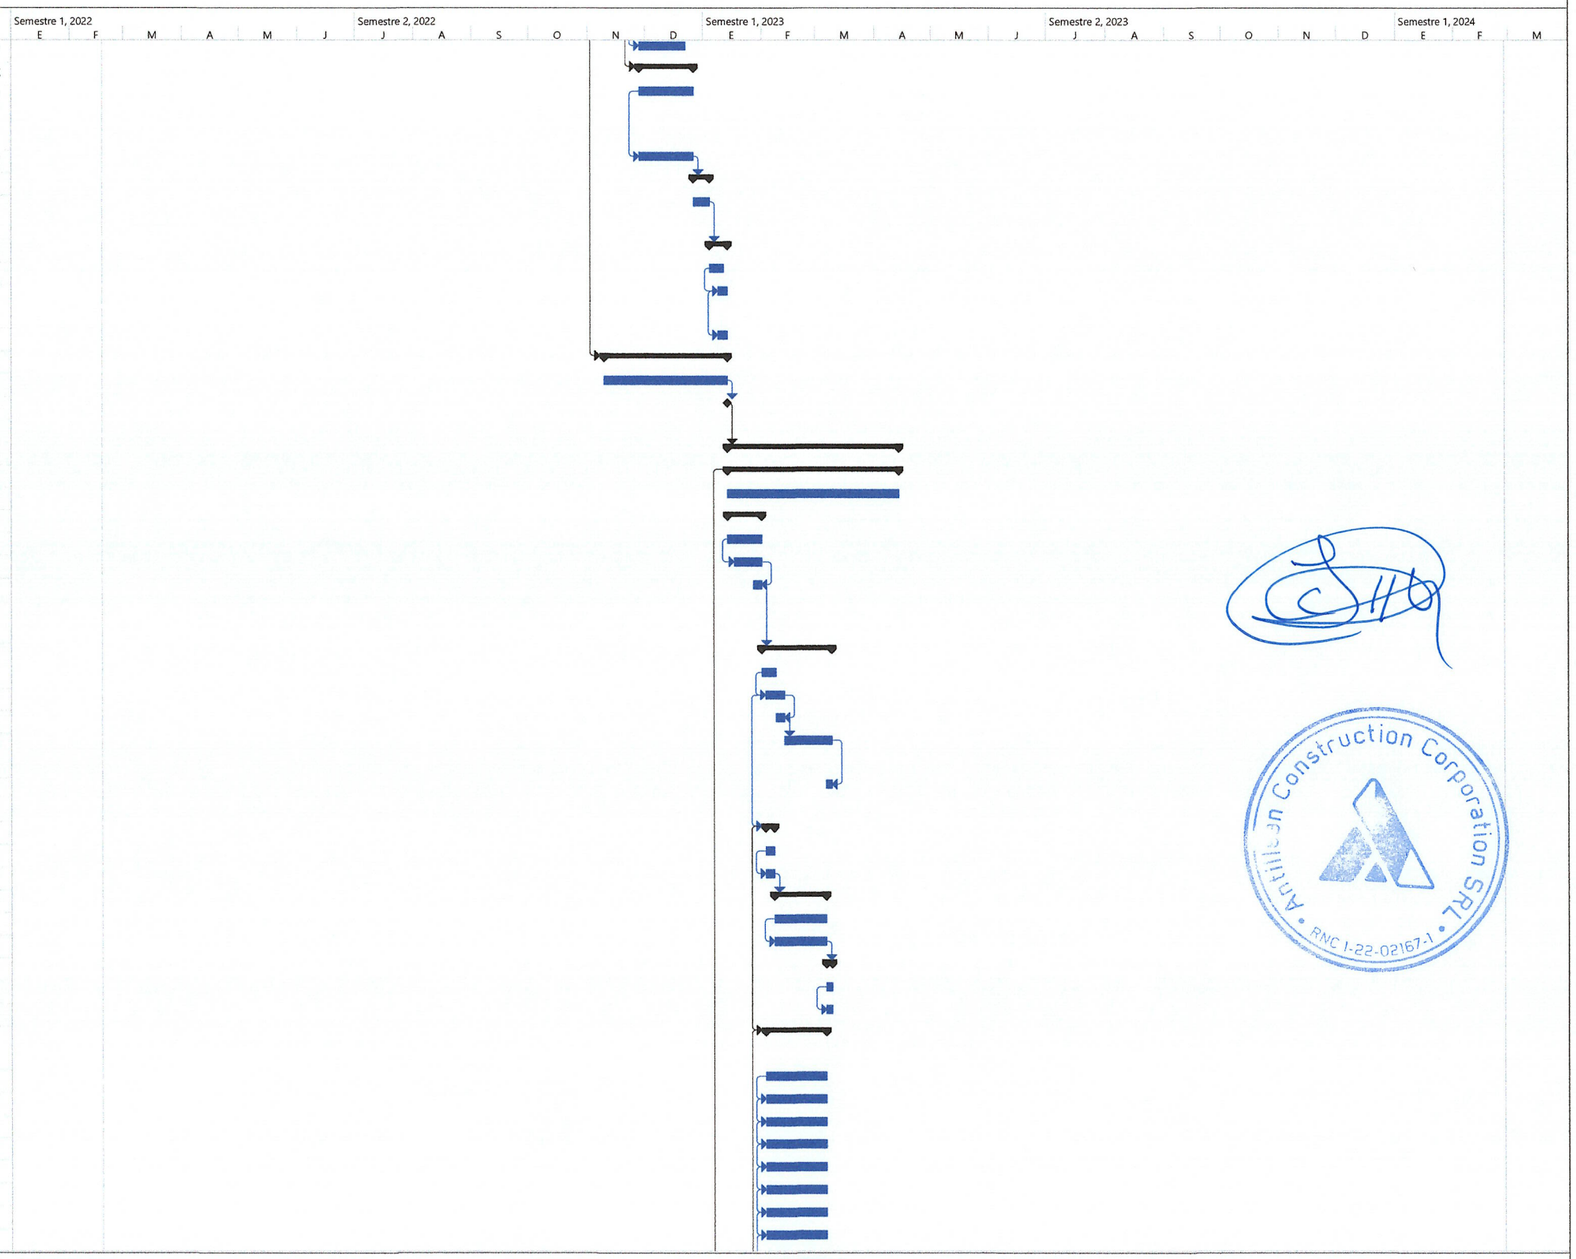


Tarea · Resumen · Tarea resumida · Progreso resumido · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Fecha límite
División · Resumen del proyecto · Tarea crítica resumida · Tareas externas · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Tarea crítica
Hito · Agrupar por síntesis · Hito resumido · Hito externo · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Progreso

Antillean Construction Corporation SRL · RNC 1-22-02167-1

# CRONOGRAMA DE
# CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO

| Id | Nombre de tarea | Duración | Predecesoras | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 579 | Codo 4"x 90º PVC SCH-40 | 17 días | 578CC | 1/5/2023 | 23/5/2023 |
| 580 | Codo 3"x 45º PVC SCH-40 | 17 días | 579CC | 1/5/2023 | 23/5/2023 |
| 581 | Codo 3"x 90º PVC SCH-40 | 17 días | 580CC | 1/5/2023 | 23/5/2023 |
| 582 | Red 4" x 3" PVC SCH-40 | 17 días | 581CC | 1/5/2023 | 23/5/2023 |
| 583 | Junta Tapón Ø3" | 17 días | 582CC | 1/5/2023 | 23/5/2023 |
| 584 | Juntas mecánica Tipo Dresser Ø4" | 17 días | 583CC | 1/5/2023 | 23/5/2023 |
| 585 | Cemento PVC | 17 días | 584CC | 1/5/2023 | 23/5/2023 |
| 586 | **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS:** | **20 días** | **576CC** | **1/5/2023** | **26/5/2023** |
| 587 | Válvula de Compuerta Ø3" H.F. Platillada Completa (150 PSI) (incl.: Válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillada en un extremo, junta dresser ) | 20 días | | 1/5/2023 | 26/5/2023 |
| 588 | Caja telescópica p/válvulas (incl. Base y Tapa de H.S.) | 20 días | 587CC | 1/5/2023 | 26/5/2023 |
| 589 | **ACOMETIDAS** | **14 días** | **588** | **26/5/2023** | **14/6/2023** |
| 590 | Acometidas Urbanas de Ø3" X Ø½" (incluye valvula, registro de PPR) | 14 días | | 26/5/2023 | 14/6/2023 |
| 591 | **HIDRANTE:** | **1 día** | | **13/6/2023** | **14/6/2023** |
| 592 | Hidrante de 4" (Suministro e instalación) | 1 día | 590FF | 13/6/2023 | 14/6/2023 |
| 593 | **REPOSICIÓN DE ASFALTO** | **7 días** | **592** | **14/6/2023** | **23/6/2023** |
| 594 | Imprimación simple | 5 días | | 14/6/2023 | 21/6/2023 |
| 595 | Suministro y colocación de asfalto e=2" (incl. Riego de Adherencia) | 5 días | 594CC+2 días | 17/6/2023 | 23/6/2023 |
| 596 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km | 5 días | 595CC | 17/6/2023 | 23/6/2023 |
| 597 | **SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DEL TRANSITO** | **53 días** | **555CC** | **14/4/2023** | **23/6/2023** |
| 598 | Limpieza continua y final | 53 días | | 14/4/2023 | 23/6/2023 |
| 599 | FIN DE ETAPA | 0 días | 598 | 23/6/2023 | 23/6/2023 |
| 600 | | | | | |
| 601 | **EMPALMES** | **11 días** | **599** | **23/6/2023** | **7/7/2023** |
| 602 | Empalme a tuberias existentes 6 unidades (incluye: corte, extracción y reposicion de carpeta asfaltica., movimiento de tierra, corte de tuberia existente, bombas de achique y señalizacion y seguridad) (No incluye piezas) | 11 días | | 23/6/2023 | 7/7/2023 |
| 603 | FIN DE ETAPA | 0 días | 602 | 7/7/2023 | 7/7/2023 |

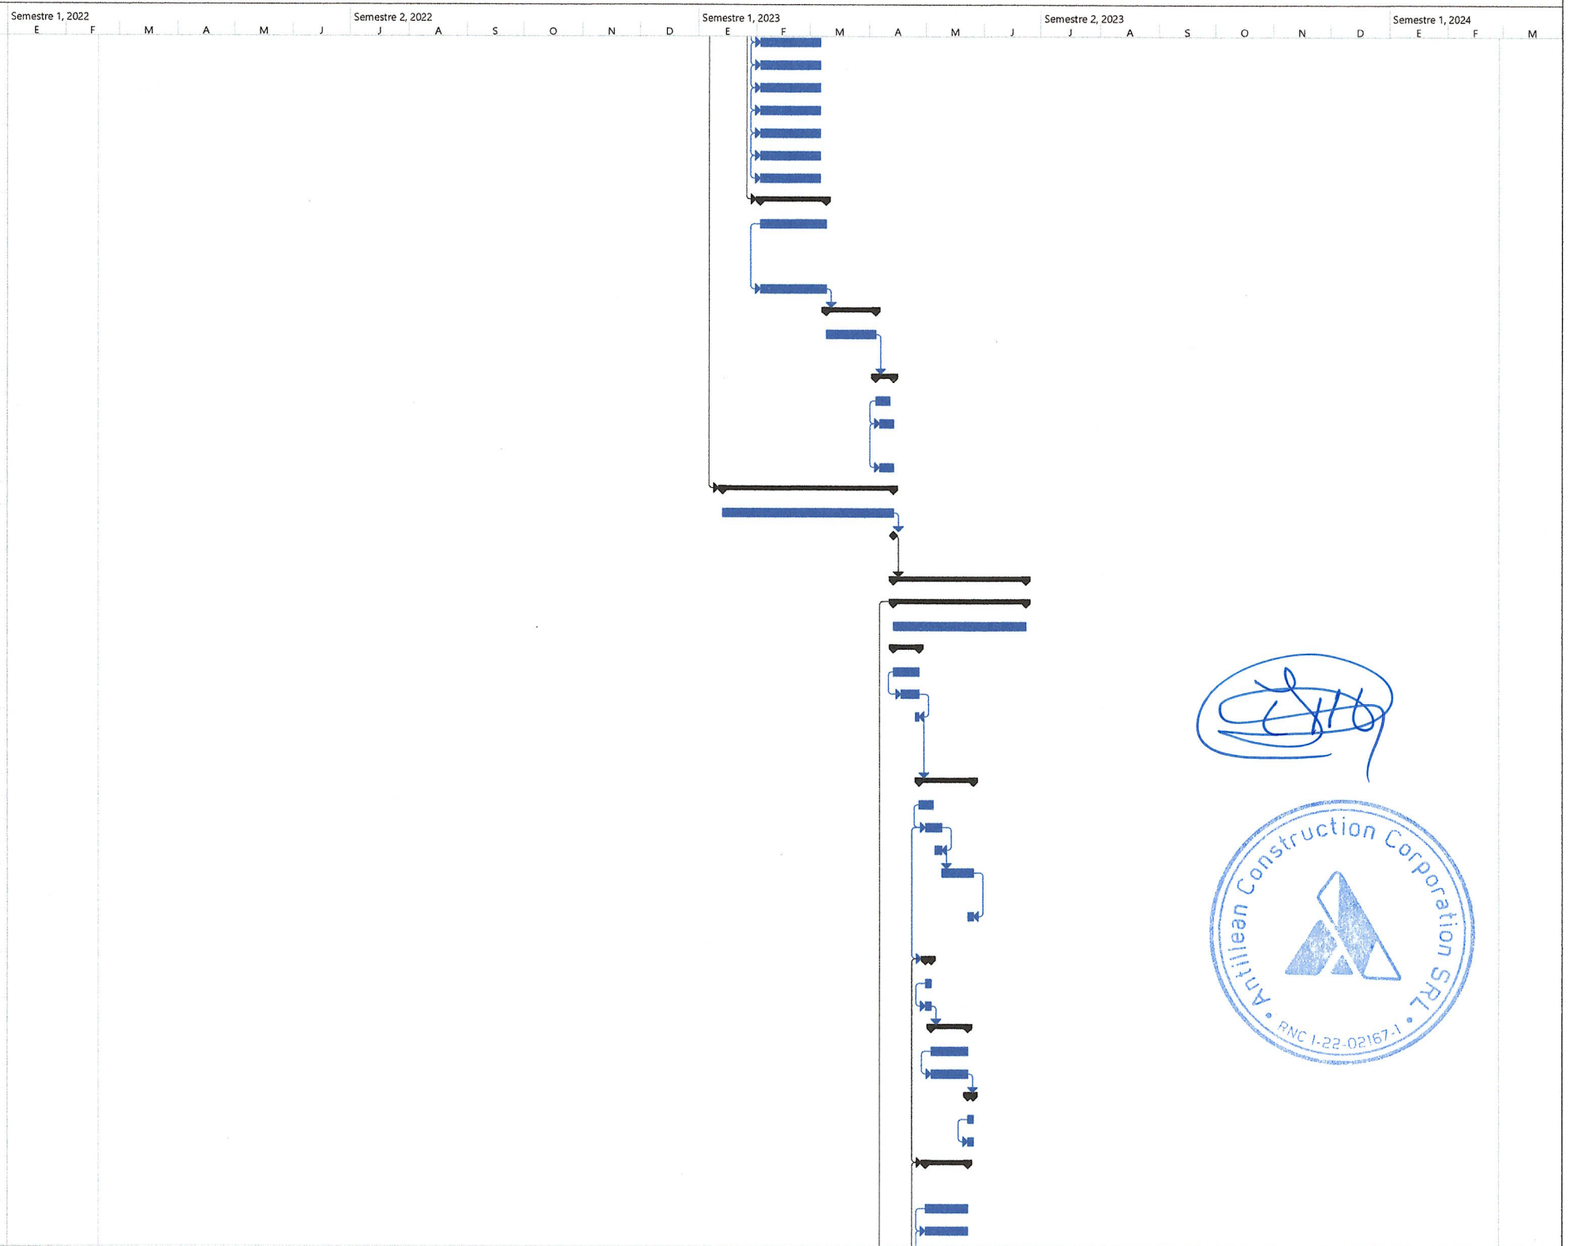


Tarea | Resumen | Tarea resumida | Progreso resumido | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Fecha límite
División | Resumen del proyecto | Tarea crítica resumida | Tareas externas | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Tarea crítica
Hito | Agrupar por síntesis | Hito resumido | Hito externo | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Progreso

Antillean Construction Corporation SRL
RNC 1-22-02167-1

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | **msproj11** | **335.75 days** | **Mon 04-04-22** | **Thu 22-06-23** | | | **RD$401,123,724.49** |
| 1 | **CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO (CONSTRUCCIÓN VÍAS DE CIRCULACIÓN, ILUMINACIÓN Y PAISAJISMO)** | **335.75 days?** | **Mon 04-04-22** | **Thu 22-06-23** | | | **RD$401,123,724.49** |
| 2 | Inicio de Obra | 0 days | Mon 04-04-22 | Mon 04-04-22 | | | RD$0.00 |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | **CONSTRUCCIÓN DE VÍAS (3,8 KM)** | **49 days** | **Fri 08-04-22** | **Tue 14-06-22** | | | **RD$246,843,440.62** |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | **REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO** | 3 days | Fri 08-04-22 | Tue 12-04-22 | 56 | Brigada Topografica,Capata | RD$1,416,476.46 |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **45 days** | **Tue 12-04-22** | **Mon 13-06-22** | | | **RD$82,335,020.81** |
| 9 | Corte material no clasificado c/equipo | 7 days | Tue 12-04-22 | Sat 23-04-22 | 6 | Ayudante de Equipos,Chofer de | RD$966,232.35 |
| 10 | Bote de material c/camion dist.5km (incluye esparcimiento en botadero) | 7 days | Tue 12-04-22 | Sat 23-04-22 | 9FF | Camión Volteo 16 m3,Chofer de | RD$4,469,820.82 |
| 11 | Suministro de material sub- base e=30 cm dist. aprox 20.00 km | 10 days | Thu 28-04-22 | Wed 11-05-22 | 9FS+3 days | Camión Volteo 16 m3,Chofer de | RD$12,330,635.44 |
| 12 | Suministro de material base e=20 cm dist. aprox 20.00 km | 10 days | Thu 12-05-22 | Tue 24-05-22 | 11 | Camión Volteo 16 m3,Chofer de | RD$8,720,866.20 |
| 13 | Imprimación simple | 15 days | Wed 25-05-22 | Mon 13-06-22 | 12 | Bandolero,Barredora | RD$7,640,988.13 |
| 14 | Suministro y colocación de asfalto e=3" ( incl. Riego de Adherencia) | 15 days | Wed 25-05-22 | Mon 13-06-22 | 13SS | Ayudante de Equipos,Barredora | RD$46,936,123.65 |
| 15 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km | 15 days | Wed 25-05-22 | Mon 13-06-22 | 14SS | Camión Distribuidor de Asfalto,Ayudante | RD$1,270,354.22 |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | **ACERAS Y CONTENES** | **26 days** | **Thu 12-05-22** | **Tue 14-06-22** | | | **RD$88,378,281.11** |
| 18 | Construcción de aceras | 20 days | Thu 12-05-22 | Mon 06-06-22 | 11 | Albañil de 1era,Cap | RD$25,460,680.58 |
| 19 | Construcción de contenes | 20 days | Thu 12-05-22 | Mon 06-06-22 | 18FF | Albañil de 1era,Cap | RD$16,838,005.73 |
| 20 | Barandas de protección | 1 day | Mon 13-06-22 | Tue 14-06-22 | 15 | Ayudante de Herreri | RD$46,079,594.80 |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | **CICLOVÍA** | **46 days** | **Tue 12-04-22** | **Tue 14-06-22** | | | **RD$74,713,662.24** |
| 23 | Suministro de material sub- base e=30 cm dist. aprox 20.00 km | 5 days | Thu 28-04-22 | Thu 05-05-22 | 9FS+3 days | Camión Volteo 16 m3,Chofer de | RD$6,207,791.65 |
| 24 | Suministro de material base e=20 cm dist. aprox 20.00 km | 23 days | Thu 28-04-22 | Fri 27-05-22 | 9FS+3 days | Camión Volteo 16 m3,Chofer de | RD$9,311,687.48 |
| 25 | Imprimación simple | 10 days | Sat 28-05-22 | Thu 09-06-22 | 24 | Bandolero,Barredora | RD$3,318,962.02 |
| 26 | Suministro y colocación de asfalto e=2" ( incl. Riego de Adherencia) | 10 days | Sat 28-05-22 | Thu 09-06-22 | 25FF | Ayudante de Equipos,Barredora | RD$15,573,655.35 |
| 27 | Transporte de asfalto, distancia aproximada de 20.00 km | 10 days | Sat 28-05-22 | Thu 09-06-22 | 26FF | Camión Distribuidor de Asfalto,Ayudante | RD$367,863.19 |
| 28 | Construcción de acera | 15 days | Thu 12-05-22 | Tue 31-05-22 | 18SS | Albañil de 1era,Cap | RD$22,649,938.55 |
| 29 | Construcción de contenes | 15 days | Thu 12-05-22 | Tue 31-05-22 | 28FF | Albañil de 1era,Cap | RD$15,603,307.35 |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | Control y Manejo de Tránsito ( incluye uso de letreros, uso de de conos refractarios y hombres con banderolas) | 45 days | Tue 12-04-22 | Mon 13-06-22 | 9SS | Bandolero,Capataz, | RD$558,916.72 |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | Senalización, Manejo de Tránsito y Seguridad en la Vía | 30 days | Tue 12-04-22 | Tue 24-05-22 | 31SS | Bandolero,Capataz, | RD$764,833.40 |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | Limpieza continua y final | 45 days | Wed 13-04-22 | Tue 14-06-22 | 20FF | Capataz,Peon | RD$356,706.53 |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | **ILUMINACION VÍAS Y AREA DE RECREACIÓN (3,680 M, AMBOS LADOS)** | **21 days** | **Mon 22-08-22** | **Fri 16-09-22** | | | **RD$27,649,808.80** |
| 38 | **ILUMINACIÓN EXTERNA** | **21 days** | **Mon 22-08-22** | **Fri 16-09-22** | | | **RD$27,649,808.80** |
| 39 | Postes de aluminio, 35´ 500 dam (para trafo) | 3 days | Fri 02-09-22 | Tue 06-09-22 | 321 | Ayudante Electricista,Brigada | RD$724,377.74 |
| 40 | Postes de aluminio, 30´ 300 dam | 12 days | Mon 22-08-22 | Tue 06-09-22 | 39FF | Ayudante Electricist | RD$7,833,972.69 |
| 41 | Alambre AAAC No. 1/0 | 5 days | Tue 06-09-22 | Mon 12-09-22 | 40 | Ayudante Electricist | RD$1,055,052.07 |
| 42 | Estructura MT-105 | 5 days | Tue 06-09-22 | Mon 12-09-22 | 41FF | Ayudante Electricist | RD$137,793.87 |
| 43 | Estructura F1-BT | 5 days | Tue 06-09-22 | Mon 12-09-22 | 42FF | Ayudante Electricist | RD$727,675.50 |

CONPROINA, SRL
Santo Domingo, D.N.

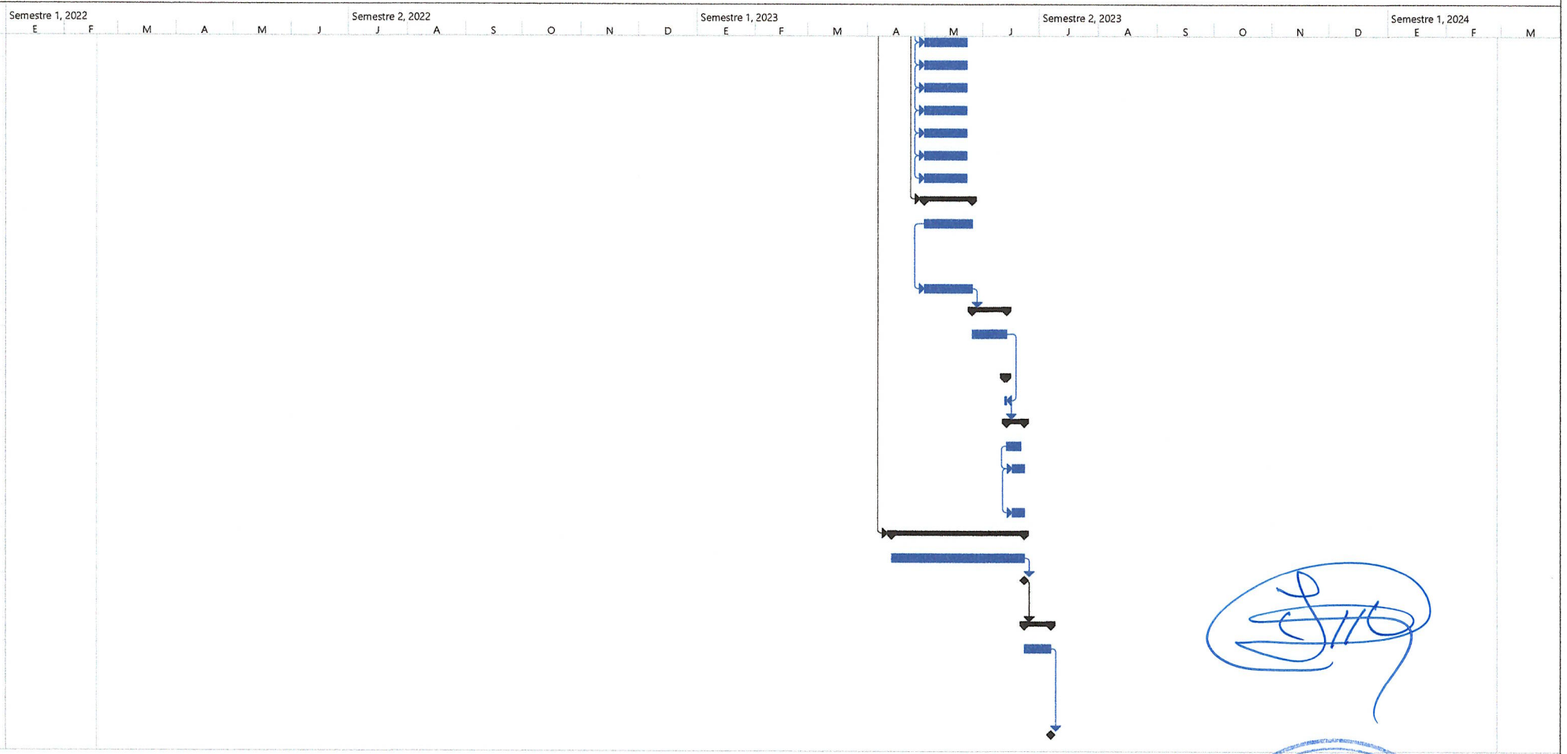Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split · Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Critical

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Estructura F2-BT | 5 days | Tue 06-09-22 | Mon 12-09-22 | 43FF | Ayudante Electricist | RD$767,310.59 |
| 45 | Estructura TR- 105 (con transformador de distribución tipo poste sumergido en aceite, potencia 15 kva, voltaje 7.2-120/240 v., Ø1) | 5 days | Tue 06-09-22 | Mon 12-09-22 | 44FF | Ayudante Electricista,Brigada de Electricidad EDEENORTE,Ingen Electrico | RD$1,140,670.05 |
| 46 | Estructura AP-101 (con lámparas Led tipo Cobra de 200 W, 240 V. | 2 days | Thu 15-09-22 | Fri 16-09-22 | 45FS+2 days | Ayudante Electricista,Brigada | RD$4,658,760.94 |
| 47 | Alimentador eléctrico para iluminación con alambre triplex no. 2 | 2 days | Thu 15-09-22 | Fri 16-09-22 | 46FF | Ayudante Electricista,Brigada de Electricidad | RD$3,632,556.10 |
| 48 | Hoyos para postes | 12 days | Mon 22-08-22 | Tue 06-09-22 | 39FF | Ayudante Electricist | RD$46,447.37 |
| 49 | Instalación de postes | 12 days | Mon 22-08-22 | Tue 06-09-22 | 48FF | Ayudante Electricist | RD$1,994,140.52 |
| 50 | Base de hormigon simple con pernos para instalación de postes | 7 days | Fri 02-09-22 | Sat 10-09-22 | 321 | Ayudante Electricista,Brigada | RD$1,885,763.32 |
| 51 | Mano de obra (20%) (desde partida 1.3 hasta partida 1.7) | 1 day | Fri 16-09-22 | Fri 16-09-22 | 47FF | Ayudante Electricista,Brigada | RD$3,045,288.04 |
| 52 | | | | | | | |
| 53 | **ENCACHE CAÑADAS EXISTENTE Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS PARA INTERCEPTAR CANAL PRINCIPAL; CANTIDAD DE CAÑADAS A INTERCEPTAR 5, LONGITUD DE ENCACHE 50 M EN CADA UNA,SECCIÓN TRAPEZOIDAL PROMEDIO B=3M B=6 H=1.50M. COLOCACIÓN DE TUBERIAS 60" H.A PARA ALCANTA** | **30 days** | **Thu 07-04-22** | **Thu 19-05-22** | | | **RD$14,074,904.27** |
| 54 | **ENCACHE** | **30 days** | **Thu 07-04-22** | **Thu 19-05-22** | | | **RD$5,237,880.68** |
| 55 | **PRELIMINARES** | **1 day** | **Thu 07-04-22** | **Thu 07-04-22** | | | **RD$65,188.89** |
| 56 | Replanteo y Control topográfico | 1 day | Thu 07-04-22 | Thu 07-04-22 | 824 | Brigada Topografica | RD$65,188.89 |
| 57 | | | | | | | |
| 58 | **MOVIMIENTO DE TIERRA.** | **15 days** | **Fri 08-04-22** | **Fri 29-04-22** | | | **RD$2,048,312.52** |
| 59 | Excavacion de material no clasificado con equipo | 7 days | Fri 08-04-22 | Wed 20-04-22 | 56 | Ayudante de Equipos,Chofer de | RD$308,529.58 |
| 60 | Conformación de talud | 1 day | Thu 28-04-22 | Thu 28-04-22 | 61 | Ayudante de Equipo | RD$157,863.01 |
| 61 | Suministro material de mina | 1 day | Wed 27-04-22 | Wed 27-04-22 | 59FS+5 | Camión Volteo 16 m | RD$254,206.47 |
| 62 | Relleno compactado con caliche y equipo mecánico | 1 day | Fri 29-04-22 | Fri 29-04-22 | 60 | Ayudante de Equipos,Camión | RD$230,394.29 |
| 63 | Bote de material con camión D= 5 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 7 days | Fri 08-04-22 | Wed 20-04-22 | 59FF | Camión Volteo 16 m3,Chofer de Camión ,Peon | RD$1,097,319.17 |
| 64 | | | | | | | |
| 65 | **REVESTIMIENTO EN TALUD:** | **1 day** | **Wed 18-05-22** | **Thu 19-05-22** | | | **RD$3,124,379.27** |
| 66 | Encaches laterales y fondo 20 cm | 1 day | Wed 18-05-22 | Thu 19-05-22 | 84 | Albañil de 1era,Capataz,Peon | RD$3,124,379.27 |
| 67 | | | | | | | |
| 68 | **TUBERÍA Ø36" H.A PARA ALCANTARILLAS LONGITUD 200M** | **13 days** | **Sat 30-04-22** | **Wed 18-05-22** | | | **RD$8,837,023.59** |
| 69 | | | | | | | |
| 70 | **PRELIMINARES** | **1 day** | **Sat 30-04-22** | **Tue 03-05-22** | | | **RD$52,151.11** |
| 71 | Replanteo y control topográfico | 1 day | Sat 30-04-22 | Tue 03-05-22 | 62 | Brigada Topografica | RD$52,151.11 |
| 72 | | | | | | | |
| 73 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **5 days** | **Tue 03-05-22** | **Mon 09-05-22** | | | **RD$861,037.44** |
| 74 | Excavación material no clasificado c/equipo | 4 days | Tue 03-05-22 | Sat 07-05-22 | 71 | Ayudante de Equipos,Chofer de | RD$108,821.81 |
| 75 | Excavación material roca c/equipo (incluye extracción) | 1 day | Tue 03-05-22 | Wed 04-05-22 | 71 | Ayudante de Equipos,Chofer de | RD$47,614.73 |
| 76 | Regularización de fondo zanja | 1 day | Mon 09-05-22 | Mon 09-05-22 | 77FF | | RD$129,211.95 |
| 77 | Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 0.20m | 1 day | Mon 09-05-22 | Mon 09-05-22 | 78 | Ayudante de Equipos,Camión Volteo 16 | RD$438,427.68 |
| 78 | Bote de material c/camión dist.5km (incluye esparcimiento en botadero) | 4 days | Tue 03-05-22 | Sat 07-05-22 | 74FF | Camión Volteo 16 m3,Chofer de Camión ,Peon | RD$136,961.27 |
| 79 | | | | | | | |




CONPROINA, SRL
Santo Domingo, D.N.

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split · Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Critical

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | **SUMINISTRO DE TUBERÍA** | **3 days** | **Tue 10-05-22** | **Thu 12-05-22** | | | **RD$6,967,105.87** |
| 81 | De 60" H.A. Clase II | 3 days | Tue 10-05-22 | Thu 12-05-22 | 76 | Director de Obra,Inç | RD$6,967,105.87 |
| 82 | | | | | | | |
| 83 | **COLOCACIÓN DE TUBERÍA** | **7 days** | **Tue 10-05-22** | **Wed 18-05-22** | | | **RD$747,493.05** |
| 84 | De 60" H.A. Clase II | 7 days | Tue 10-05-22 | Wed 18-05-22 | 81SS | Albañil de 1era,Cap | RD$747,493.05 |
| 85 | | | | | | | |
| 86 | **CABEZAL DE DESCARGA** | 3 days | Tue 10-05-22 | Thu 12-05-22 | 81SS | Albañil de 1era,Cap | RD$209,236.12 |
| 87 | | | | | | | |
| 88 | **CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y PAISAJISMO** | **20.5 days** | **Sat 17-09-22** | **Thu 13-10-22** | | | **RD$56,375,105.02** |
| 89 | | | | | | | |
| 90 | **ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, PARQUES DE EJERCICIOS Y PAISAJISMO** | **19.5 days** | **Sat 17-09-22** | **Wed 12-10-22** | | | **RD$6,577,404.32** |
| 91 | | | | | | | |
| 92 | **PRELIMINARES** | **0.5 days** | **Sat 17-09-22** | **Sat 17-09-22** | | | **RD$50,251.80** |
| 93 | Replanteo | 0.5 days | Sat 17-09-22 | Sat 17-09-22 | 51 | Brigada Topografica | RD$50,251.80 |
| 94 | | | | | | | |
| 95 | **ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES (SEGÚN DISEÑO) (2 UD)** | **19 days** | **Mon 19-09-22** | **Wed 12-10-22** | | | **RD$6,527,152.52** |
| 96 | Suministro y colocación de arena, e=0.15m | 1 day | Fri 23-09-22 | Fri 23-09-22 | 97FS+3 days | Camión Volteo 16 m3,Chofer de | RD$477,347.62 |
| 97 | Piso de hormigón estampado en accesos internos, e=0.15m | 1 day | Mon 19-09-22 | Mon 19-09-22 | 93 | Albañil de 1era,Capataz,Peon | RD$434,589.92 |
| 98 | Rueda giratoria | 2 days | Tue 11-10-22 | Wed 12-10-22 | 145 | Capataz,Peon | RD$475,184.49 |
| 99 | Balancín | 2 days | Tue 11-10-22 | Wed 12-10-22 | 98FF | Capataz,Peon | RD$443,505.52 |
| 100 | Tobogán | 2 days | Tue 11-10-22 | Wed 12-10-22 | 99FF | Capataz,Peon | RD$1,254,605.46 |
| 101 | Columpio triple | 2 days | Tue 11-10-22 | Wed 12-10-22 | 100FF | Capataz,Peon | RD$506,863.45 |
| 102 | Barra escaladora o Juego de Pasamanos | 2 days | Tue 11-10-22 | Wed 12-10-22 | 101FF | Capataz,Peon | RD$1,623,547.00 |
| 103 | Módulo de juegos múltiples | 2 days | Tue 11-10-22 | Wed 12-10-22 | 102FF | Capataz,Peon | RD$649,418.80 |
| 104 | Tobogán con centro de juegos con deslizador | 2 days | Tue 11-10-22 | Wed 12-10-22 | 103FF | Capataz,Peon | RD$662,090.26 |
| 105 | | | | | | | |
| 106 | **ÁREA DE SENDEROS** | **5 days** | **Mon 19-09-22** | **Fri 23-09-22** | | | **RD$16,179,116.54** |
| 107 | Camino de hormigón para peatones, Ancho=1.20m | 5 days | Mon 19-09-22 | Fri 23-09-22 | 93 | Albañil de 1era,Capataz,Peon | RD$16,179,116.54 |
| 108 | | | | | | | |
| 109 | **EMBELLECIMIENTO Y JARDINERÍA GENERAL (INCLUYE SUMINISTRO, SEMBRADO Y MANTENIMIENTO POR 2 MESES)** | **20 days** | **Mon 19-09-22** | **Thu 13-10-22** | | | **RD$33,618,584.16** |
| 110 | Grama | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 107 | Capataz,Peon,Jardi | RD$26,056,337.75 |
| 111 | Grava | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 110FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$633,720.52 |
| 112 | Árbol Mara | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 111FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$23,165.63 |
| 113 | Árbol Caoba | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 112FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$433,508.81 |
| 114 | Árbol Almácigo | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 113FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$21,946.38 |
| 115 | Árbol Avellano | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 114FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$77,412.29 |
| 116 | Árbol Caimito cimarrón | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 115FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$12,385.97 |
| 117 | Árbol Roble criollo | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 116FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$15,443.75 |
| 118 | Árbol Roblillo | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 117FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$30,887.50 |
| 119 | Árbol Samán | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 118FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$15,443.75 |
| 120 | Árbol Frijolito | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 119FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$77,218.76 |
| 121 | Árbol Penda | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 120FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$38,609.38 |
| 122 | Árbol Grigrí | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 121FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$46,331.25 |
| 123 | Árbol Guayacán | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 122FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$36,577.31 |
| 124 | Árbol Ceiba | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 123FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$11,611.84 |
| 125 | Árbol Caracolí | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 124FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$96,765.36 |
| 126 | Árbol Campeche | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 125FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$38,706.14 |
| 127 | Árbol Copey | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 126FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$77,412.29 |
| 128 | Árbol Juan Primero | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 127FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$38,648.08 |
| 129 | Árbol Caya amarilla | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 128FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$2,032.07 |
| 130 | Árbol Higuero | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 129FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$40,641.45 |

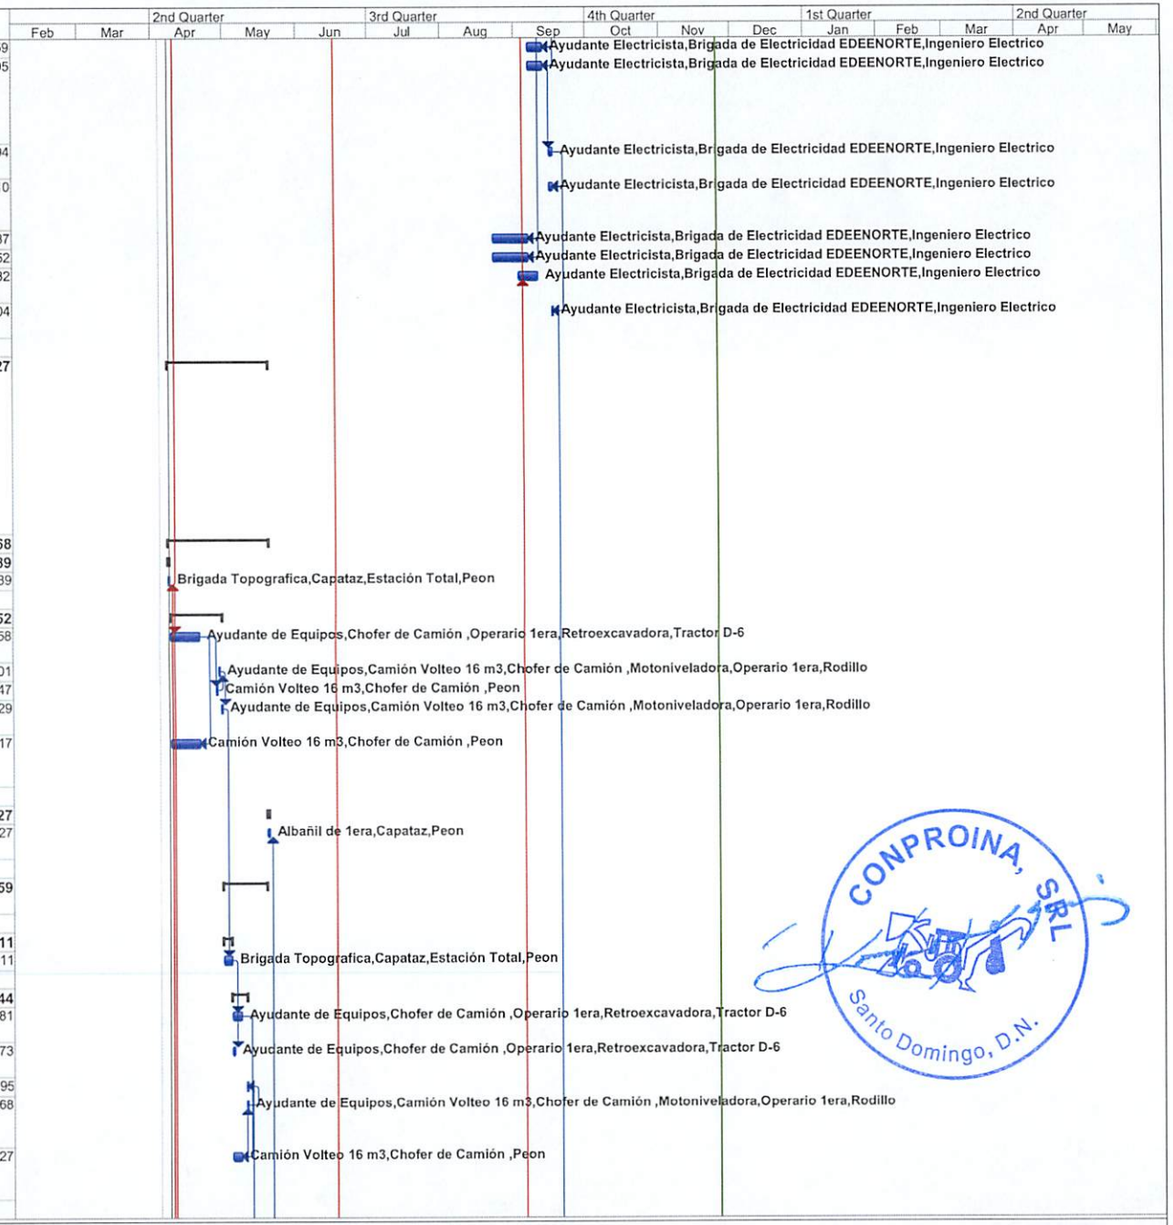


CONPROINA, SRL
Santo Domingo, D.N.

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split · Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Critical

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Palma Real | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 130FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$464,473.72 |
| 132 | Palma Cana | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 131FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$464,473.72 |
| 133 | Palma Guano | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 132FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$464,473.72 |
| 134 | Guáyiga | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 133FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$34,835.53 |
| 135 | Arrayán | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 134FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$185,789.49 |
| 136 | Busunuco | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 135FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$193,530.72 |
| 137 | Aleli | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 136FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$365,773.06 |
| 138 | Saúco amarillo | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 137FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$154,824.57 |
| 139 | Doña Sanica | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 138FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$97,539.48 |
| 140 | Oreja de Elefante | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 139FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$309,649.15 |
| 141 | Costilla de Adán | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 140FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$270,943.01 |
| 142 | Uva de playa | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 141FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$7,168.38 |
| 143 | Tierra negra con abono | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 142FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$1,161,184.31 |
| 144 | Requilete en áreas verdes | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 143FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$603,156.29 |
| 145 | Tuberías y piezas de agua potable para regado de áreas verdes | 12 days | Mon 26-09-22 | Mon 10-10-22 | 144FF | Capataz,Peon,Jardi | RD$18,578.95 |
| 146 | | | | | | | |
| 147 | Suministro y colocación de banco de hormigón (Según diseño) | 1 day | Thu 13-10-22 | Thu 13-10-22 | 104 | Capataz,Ingeniero Residente,Peon | RD$509,218.03 |
| 148 | | | | | | | |
| 149 | Suministro y colocación de zafacones triples de reciclaje | 1 day | Thu 13-10-22 | Thu 13-10-22 | 147FF | Capataz,Ingeniero Residente,Peon | RD$86,701.76 |
| 150 | | | | | | | |
| 151 | Limpieza final y continua | 20 days | Mon 19-09-22 | Thu 13-10-22 | 149FF | Capataz,Peon | RD$401,463.99 |
| 152 | | | | | | | |
| 153 | **CANCHA MIXTA Y GRADERÍAS (2 UD)** | **27.25 days** | **Tue 14-06-22** | **Wed 20-07-22** | | | **RD$4,690,077.12** |
| 154 | | | | | | | |
| 155 | **CANCHA MIXTA DE 32.00 M X 19.00 M** | **27.25 days** | **Tue 14-06-22** | **Wed 20-07-22** | | | **RD$4,690,077.12** |
| 156 | | | | | | | |
| 157 | **PRELIMINARES** | **1 day** | **Tue 14-06-22** | **Wed 15-06-22** | | | **RD$50,251.80** |
| 158 | Replanteo | 1 day | Tue 14-06-22 | Wed 15-06-22 | 20 | Brigada Topografica | RD$50,251.80 |
| 159 | | | | | | | |
| 160 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **3 days** | **Tue 14-06-22** | **Sat 18-06-22** | | | **RD$91,425.96** |
| 161 | Excavación de material no clasificado c/equipo | 1 day | Wed 15-06-22 | Fri 17-06-22 | 158 | Ayudante de Equipos,Chofer de | RD$11,712.23 |
| 162 | Suministro de material de mina | 1 day | Fri 17-06-22 | Sat 18-06-22 | 161 | Camión Volteo 16 m | RD$25,771.60 |
| 163 | Relleno de material compactado c/compactador mecánico | 1 day | Fri 17-06-22 | Sat 18-06-22 | 162FF | Ayudante de Equipos,Camión | RD$16,276.38 |
| 164 | Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero) | 1 day | Tue 14-06-22 | Wed 15-06-22 | 158FF | Camión Volteo 16 m3,Chofer de | RD$37,665.75 |
| 165 | | | | | | | |
| 166 | **HORMIGÓN ARMADO F'c 210 KG/CM² EN:** | **5 days** | **Mon 20-06-22** | **Fri 24-06-22** | | | **RD$643,751.48** |
| 167 | Zapata de muros bordillo (0.45m x 0.20m) | 1 day | Mon 20-06-22 | Mon 20-06-22 | 163 | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$360,713.75 |
| 168 | Zapata columnas soporte (0.80m x 1.70m x 0.50m) | 1 day | Mon 20-06-22 | Mon 20-06-22 | 167SS | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$98,950.12 |
| 169 | Columnas soporte | 1 day | Fri 24-06-22 | Fri 24-06-22 | 168FS+1 | Albañil de 1era,Ayu | RD$184,087.61 |
| 170 | | | | | | | |
| 171 | **BLOQUES DE HORMIGÓN EN:** | **5 days** | **Tue 21-06-22** | **Mon 27-06-22** | | | **RD$343,813.58** |
| 172 | Bordillo de 0.15 m (B.N.P.) | 5 days | Tue 21-06-22 | Mon 27-06-22 | 168 | Albañil de 1era,Ayu | RD$343,813.58 |
| 173 | | | | | | | |
| 174 | **TERMINACIÓN DE SUPERFICIE** | **4.5 days** | **Wed 06-07-22** | **Mon 11-07-22** | | | **RD$64,825.07** |
| 175 | Pañete en exterior | 3 days | Wed 06-07-22 | Sat 09-07-22 | 177 | Albañil de 1era,Cap | RD$13,480.89 |
| 176 | Pañete liso en columnas | 1 day | Fri 08-07-22 | Sat 09-07-22 | 175FF | Albañil de 1era,Cap | RD$22,945.59 |
| 177 | Fraguache | 0.5 days | Wed 06-07-22 | Wed 06-07-22 | 181 | Albañil de 1era,Cap | RD$5,115.33 |
| 178 | Cantos en general | 1 day | Mon 11-07-22 | Mon 11-07-22 | 176 | Albañil de 1era,Cap | RD$23,283.26 |
| 179 | | | | | | | |
| 180 | **TERMINACIÓN DE PISOS** | **7 days** | **Mon 27-06-22** | **Tue 05-07-22** | | | **RD$2,718,024.93** |
| 181 | De H.A. con malla electrosoldada 1/4" (H=0.10 m) | 7 days | Mon 27-06-22 | Tue 05-07-22 | 172 | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$2,718,024.93 |
| 182 | | | | | | | |

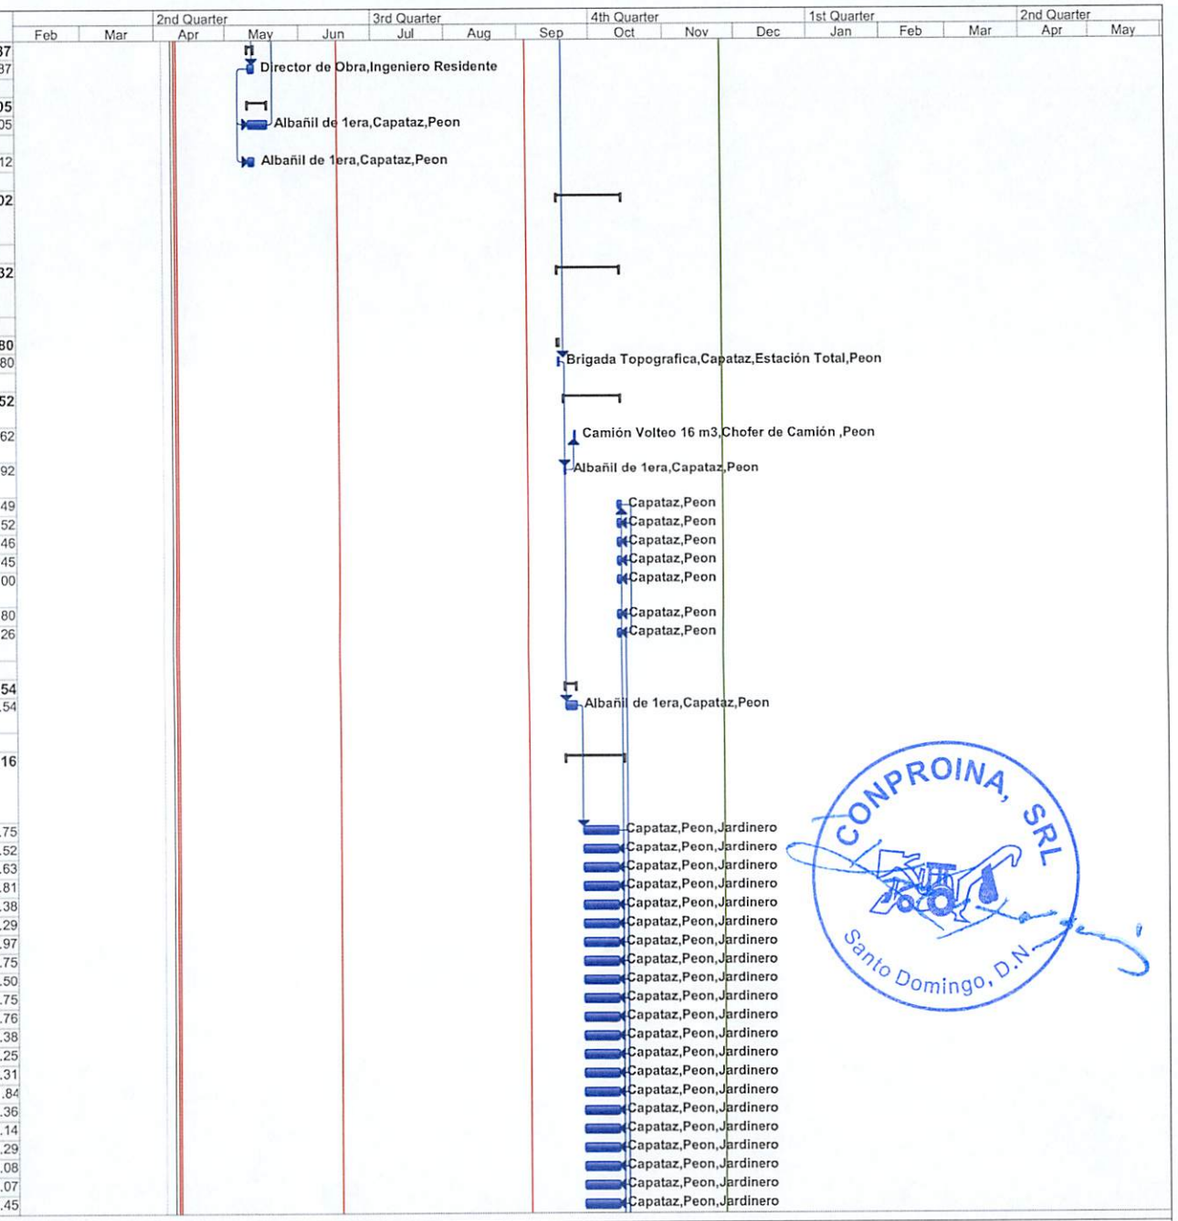CONPROINA, SRL
Santo Domingo, D.N.

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split · Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Critical

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | **MISCELANEOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **1 day** | **Tue 19-07-22** | **Wed 20-07-22** | | | **RD$351,563.88** |
| 184 | Tablero de fibra de vidrio para basketball (incluye aro y malla) | 1 day | Tue 19-07-22 | Wed 20-07-22 | 193 | Capataz,Ingeniero Residente,Peon | RD$233,217.83 |
| 185 | Poste volleyball y cajuelas (Tubo 2 1/2" x 10' y Tubo de 3" x 2") | 1 day | Tue 19-07-22 | Wed 20-07-22 | 184FF | Ayudante de Herreria,Capataz,He | RD$90,236.10 |
| 186 | Malla de volleyball | 1 day | Tue 19-07-22 | Wed 20-07-22 | 185FF | Capataz,Peon | RD$28,109.95 |
| 187 | | | | | | | |
| 188 | **PINTURA** | **3.75 days** | **Thu 14-07-22** | **Tue 19-07-22** | | | **RD$426,420.42** |
| 189 | Pintura acrílica en columnas | 0.25 days | Thu 14-07-22 | Thu 14-07-22 | 178FS+; | Ayudante de Pintor,I | RD$8,524.52 |
| 190 | Pintura a base de aceite especial antideslizante para piso de canchas, color rojo positivo | 2.5 days | Thu 14-07-22 | Mon 18-07-22 | 189 | Ayudante de Pintor,Peon,Pintor | RD$241,568.70 |
| 191 | Pintura a base de aceite especial antideslizante para piso de canchas, color verde | 2.5 days | Thu 14-07-22 | Mon 18-07-22 | 189 | Ayudante de Pintor,Peon,Pintor | RD$80,771.58 |
| 192 | Pintura a base de aceite especial antideslizante para piso de canchas, color azul | 1 day | Mon 18-07-22 | Tue 19-07-22 | 191 | Ayudante de Pintor,Peon,Pintor | RD$89,475.15 |
| 193 | Señalización en cancha con líneas 5 cm, color blanco | 1 day | Mon 18-07-22 | Tue 19-07-22 | 192FF | Ayudante de Pintor,Peon,Pintor | RD$6,080.47 |
| 194 | | | | | | | |
| 195 | **GRADERÍA EN CANCHA MIXTA** | **38 days** | **Tue 14-06-22** | **Tue 02-08-22** | | | **RD$2,059,563.02** |
| 196 | | | | | | | |
| 197 | **PRELIMINARES** | **1 day** | **Tue 14-06-22** | **Wed 15-06-22** | | | **RD$20,100.72** |
| 198 | Replanteo | 1 day | Tue 14-06-22 | Wed 15-06-22 | 158SS | Brigada Topografica | RD$20,100.72 |
| 199 | | | | | | | |
| 200 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **2 days** | **Wed 15-06-22** | **Sat 18-06-22** | | | **RD$19,247.26** |
| 201 | Excavación de material no clasificado c/equipo | 1 day | Wed 15-06-22 | Fri 17-06-22 | 198 | Ayudante de Equipos,Chofer de | RD$4,424.55 |
| 202 | Relleno de material compactado c/compactador mecánico | 1 day | Fri 17-06-22 | Sat 18-06-22 | 203 | Ayudante de Equipos,Camión | RD$1,275.99 |
| 203 | Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero) | 1 day | Wed 15-06-22 | Fri 17-06-22 | 201FF | Camión Volteo 16 m3,Chofer de | RD$13,546.72 |
| 204 | | | | | | | |
| 205 | **HORMIGÓN ARMADO F'c 210 KG/CM² EN:** | **21 days** | **Mon 20-06-22** | **Fri 15-07-22** | | | **RD$713,100.92** |
| 206 | Zapata de muro de 6" (0.45m x 0.25m) | 3 days | Mon 20-06-22 | Wed 22-06-22 | 202 | Albañil de 1era,Ayuc | RD$158,357.08 |
| 207 | Viga V1 | 3 days | Wed 29-06-22 | Sat 02-07-22 | 206FS+1 | Albañil de 1era,Ayuc | RD$71,013.31 |
| 208 | Losa de asiento e=0.13 m | 3 days | Tue 12-07-22 | Fri 15-07-22 | 207FS+7 | Albañil de 1era,Ayuc | RD$483,730.53 |
| 209 | | | | | | | |
| 210 | **MURO DE BLOQUES** | **2.5 days** | **Thu 23-06-22** | **Sat 25-06-22** | | | **RD$385,740.67** |
| 211 | Bloque de muro de 6" B.N.P. | 1 day | Thu 23-06-22 | Thu 23-06-22 | 206 | Albañil de 1era,Cap | RD$126,444.61 |
| 212 | Bloque de muro de 6" S.N.P. | 1.5 days | Fri 24-06-22 | Sat 25-06-22 | 211 | Albañil de 1era,Cap | RD$259,296.06 |
| 213 | | | | | | | |
| 214 | **TERMINACIÓN DE SUPERFICIE** | **7 days** | **Fri 15-07-22** | **Mon 25-07-22** | | | **RD$626,654.36** |
| 215 | Pañete en muros | 2 days | Mon 18-07-22 | Tue 19-07-22 | 218 | Albañil de 1era,Cap | RD$123,574.78 |
| 216 | Pañete en vigas | 2 days | Mon 18-07-22 | Tue 19-07-22 | 215FF | Albañil de 1era,Cap | RD$11,725.56 |
| 217 | Pañete pulido en asientos | 2 days | Mon 18-07-22 | Tue 19-07-22 | 216FF | Albañil de 1era,Cap | RD$196,444.52 |
| 218 | Fraguache | 1 day | Fri 15-07-22 | Sat 16-07-22 | 208 | Albañil de 1era,Cap | RD$39,444.97 |
| 219 | Cantos | 4 days | Wed 20-07-22 | Mon 25-07-22 | 215 | Albañil de 1era,Cap | RD$255,464.53 |
| 220 | | | | | | | |
| 221 | **PINTURA** | **5 days** | **Tue 26-07-22** | **Mon 01-08-22** | | | **RD$163,708.48** |
| 222 | Pintura de base en muros | 2 days | Tue 26-07-22 | Thu 28-07-22 | 219FS+ | Ayudante de Pintor,I | RD$81,854.24 |
| 223 | Pintura acrílica en muros | 3 days | Thu 28-07-22 | Mon 01-08-22 | 222 | Ayudante de Pintor,I | RD$81,854.24 |
| 224 | | | | | | | |
| 225 | **MISCELANEOS** | **24 days** | **Mon 04-07-22** | **Tue 02-08-22** | | | **RD$131,010.61** |
| 226 | Barandas de H.G. sobre muros de bloques | 1 day | Tue 02-08-22 | Tue 02-08-22 | 223 | Albañil de 1era,Capataz,Peon | RD$120,985.22 |
| 227 | Escalones de cemento | 2 days | Mon 04-07-22 | Tue 05-07-22 | 207 | Albañil de 1era,Cap | RD$10,025.39 |
| 228 | | | | | | | |
| 229 | **CANCHA DE VOLEYBALL Y GRADERÍAS (2 UD)** | **17.5 days** | **Tue 14-06-22** | **Thu 07-07-22** | | | **RD$4,476,989.78** |
| 230 | | | | | | | |







Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical Split | Hito | Tareas externas | Hito inactivo | Sólo duración | Sólo el comienzo | Progreso |
| Tarea | Resumen | Hito externo | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | Sólo fin | Critical |
| División | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Fecha límite | |

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | **CANCHA VOLEYBALL DE 32.00 M X 19.00 M** | **17.5 days** | **Tue 14-06-22** | **Thu 07-07-22** | | | **RD$4,476,989.78** |
| 232 | | | | | | | |
| 233 | **PRELIMINARES** | **0.5 days** | **Tue 14-06-22** | **Tue 14-06-22** | | | **RD$50,251.80** |
| 234 | Replanteo | 0.5 days | Tue 14-06-22 | Tue 14-06-22 | 158SS | Brigada Topografica | RD$50,251.80 |
| 235 | | | | | | | |
| 236 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **3 days** | **Wed 15-06-22** | **Mon 20-06-22** | | | **RD$91,425.97** |
| 237 | Excavación de material no clasificado c/equipo | 1 day | Wed 15-06-22 | Wed 15-06-22 | 234 | Ayudante de Equipos,Chofer de | RD$11,712.23 |
| 238 | Suministro de material de mina | 1 day | Sat 18-06-22 | Mon 20-06-22 | 237FS+ | Camión Volteo 16 m | RD$27,531.51 |
| 239 | Relleno de material compactado c/compactador mecánico | 1 day | Sat 18-06-22 | Mon 20-06-22 | 238FF | Ayudante de Equipos,Camión | RD$15,263.60 |
| 240 | Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero) | 1 day | Wed 15-06-22 | Wed 15-06-22 | 237FF | Camión Volteo 16 m3,Chofer de | RD$36,918.63 |
| 241 | | | | | | | |
| 242 | **HORMIGÓN ARMADO F'C 210 KG/CM² EN:** | **1 day** | **Mon 20-06-22** | **Tue 21-06-22** | | | **RD$360,713.75** |
| 243 | Zapata de muros bordillo (0.45m x 0.20m) | 1 day | Mon 20-06-22 | Tue 21-06-22 | 239 | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$360,713.75 |
| 244 | | | | | | | |
| 245 | **BLOQUES DE HORMIGÓN EN:** | **1 day** | **Mon 20-06-22** | **Tue 21-06-22** | | | **RD$297,617.56** |
| 246 | Bordillo de 0.15 m (B.N.P.) | 1 day | Mon 20-06-22 | Tue 21-06-22 | 243SS | Albañil de 1era,Ayud | RD$297,617.56 |
| 247 | | | | | | | |
| 248 | **TERMINACIÓN DE SUPERFICIE** | **3 days** | **Tue 28-06-22** | **Thu 30-06-22** | | | **RD$64,825.07** |
| 249 | Pañete en exterior | 1 day | Wed 29-06-22 | Wed 29-06-22 | 251 | Albañil de 1era,Capa | RD$13,480.89 |
| 250 | Pañete liso en columnas | 1 day | Wed 29-06-22 | Wed 29-06-22 | 249FF | Albañil de 1era,Capa | RD$22,945.59 |
| 251 | Fraguache | 1 day | Tue 28-06-22 | Tue 28-06-22 | 255FS+ | Albañil de 1era,Capa | RD$5,115.33 |
| 252 | Cantos en general | 1 day | Thu 30-06-22 | Thu 30-06-22 | 250 | Albañil de 1era,Capa | RD$23,283.26 |
| 253 | | | | | | | |
| 254 | **TERMINACIÓN DE PISOS** | **4 days** | **Tue 21-06-22** | **Sat 25-06-22** | | | **RD$2,718,024.93** |
| 255 | De H.A. con malla electrosoldada 1/4" (H=0.10 m) | 4 days | Tue 21-06-22 | Sat 25-06-22 | 246 | Albañil de 1era,Capataz,Peon | RD$2,718,024.93 |
| 256 | | | | | | | |
| 257 | **MISCELANEOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **1 day** | **Wed 06-07-22** | **Thu 07-07-22** | | | **RD$118,346.05** |
| 258 | Poste volleyball y cajuelas (Tubo 2 1/2" x 10' y Tubo de 3" x 2") | 1 day | Wed 06-07-22 | Thu 07-07-22 | 264 | Ayudante de Herreria,Herrero,Pe | RD$90,236.10 |
| 259 | Malla de volleyball | 1 day | Wed 06-07-22 | Thu 07-07-22 | 258FF | Capataz,Peon | RD$28,109.95 |
| 260 | | | | | | | |
| 261 | **PINTURA** | **3 days** | **Sat 02-07-22** | **Wed 06-07-22** | | | **RD$775,784.65** |
| 262 | Pintura a base de aceite especial antideslizante para piso de canchas, color rojo positivo | 2 days | Sat 02-07-22 | Tue 05-07-22 | 252FS+ day | Ayudante de Pintor,Peon,Pintor | RD$241,568.70 |
| 263 | Pintura a base de aceite especial antideslizante para piso de canchas, color verde | 2 days | Sat 02-07-22 | Tue 05-07-22 | 262FF | Ayudante de Pintor,Peon,Pintor | RD$528,135.48 |
| 264 | Señalización en cancha con líneas 5 cm, color blanco | 1 day | Tue 05-07-22 | Wed 06-07-22 | 263 | Ayudante de Pintor,Peon,Pintor | RD$6,080.47 |
| 265 | | | | | | | |
| 266 | **GRADERÍA EN CANCHA VOLEYBALL** | **34 days** | **Tue 14-06-22** | **Thu 28-07-22** | | | **RD$2,075,345.77** |
| 267 | | | | | | | |
| 268 | **PRELIMINARES** | **0.5 days** | **Tue 14-06-22** | **Tue 14-06-22** | | | **RD$50,251.80** |
| 269 | Replanteo | 0.5 days | Tue 14-06-22 | Tue 14-06-22 | 158SS | Brigada Topografica | RD$50,251.80 |
| 270 | | | | | | | |
| 271 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **2 days** | **Wed 15-06-22** | **Fri 17-06-22** | | | **RD$19,378.02** |
| 272 | Excavación de material no clasificado c/equipo | 1 day | Wed 15-06-22 | Wed 15-06-22 | 269 | Ayudante de Equipos,Chofer de | RD$4,555.31 |
| 273 | Relleno de material compactado c/compactador mecánico | 1 day | Fri 17-06-22 | Fri 17-06-22 | 274 | Ayudante de Equipos,Camión | RD$1,275.99 |
| 274 | Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero) | 1 day | Wed 15-06-22 | Wed 15-06-22 | 272FF | Camión Volteo 16 m3,Chofer de | RD$13,546.72 |
| 275 | | | | | | | |
| 276 | **HORMIGÓN ARMADO F'C 210 KG/CM² EN:** | **13 days** | **Sat 18-06-22** | **Tue 05-07-22** | | | **RD$713,734.40** |
| 277 | Zapata de muro de 6" (0.45m x 0.25m) | 1 day | Sat 18-06-22 | Mon 20-06-22 | 273 | Albañil de 1era,Ayud | RD$158,990.56 |

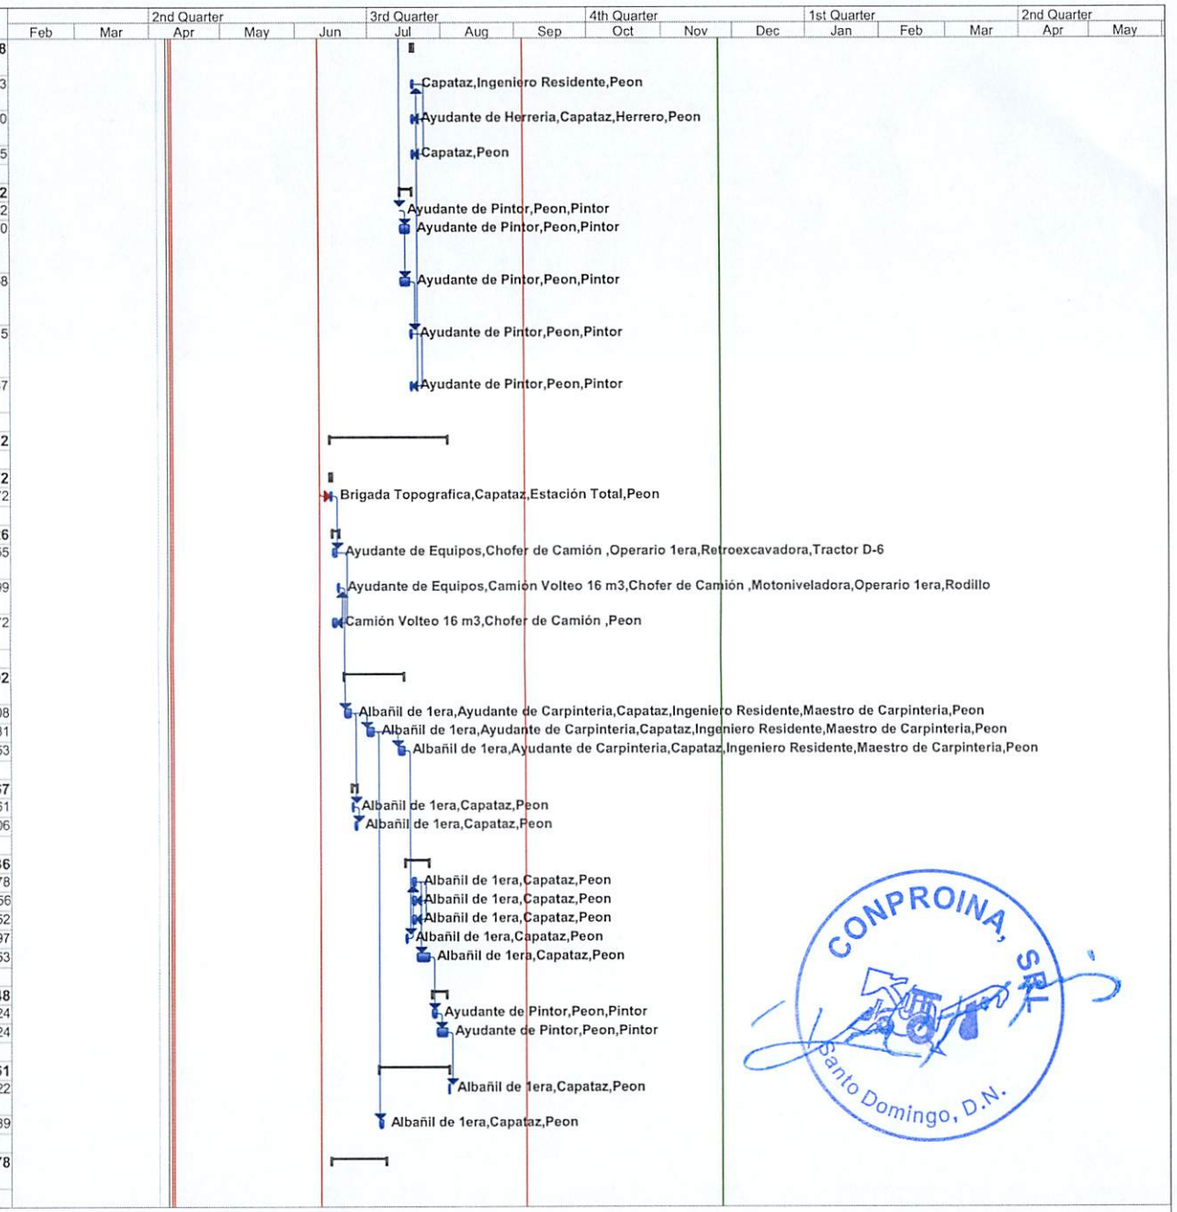


CONPROINA, SRL
Santo Domingo, D.N.

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split · Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Critical

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | Viga V1 | 1 day | Thu 23-06-22 | Fri 24-06-22 | 277FS+1 | Albañil de 1era,Cap | RD$71,013.31 |
| 279 | Losa de asiento e=0.13 m | 1 day | Mon 04-07-22 | Tue 05-07-22 | 278FS+7 | Albañil de 1era,Cap | RD$483,730.53 |
| 280 | | | | | | | |
| 281 | **MURO DE BLOQUES** | **1.5 days** | **Sat 18-06-22** | **Mon 20-06-22** | | | **RD$385,740.67** |
| 282 | Bloque de muro de 6" B.N.P. | 0.5 days | Sat 18-06-22 | Sat 18-06-22 | 277SS | Albañil de 1era,Cap | RD$126,444.61 |
| 283 | Bloque de muro de 6" S.N.P. | 1 day | Mon 20-06-22 | Mon 20-06-22 | 282 | Albañil de 1era,Cap | RD$259,296.06 |
| 284 | | | | | | | |
| 285 | **TERMINACIÓN DE SUPERFICIE** | **7.5 days** | **Thu 14-07-22** | **Fri 22-07-22** | | | **RD$611,521.79** |
| 286 | Pañete en muros | 1 day | Thu 14-07-22 | Fri 15-07-22 | 289 | Albañil de 1era,Cap | RD$123,574.78 |
| 287 | Pañete en vigas | 1 day | Thu 14-07-22 | Fri 15-07-22 | 286FF | Albañil de 1era,Cap | RD$11,725.56 |
| 288 | Pañete pulido en asientos | 3 days | Thu 14-07-22 | Mon 18-07-22 | 286SS | Albañil de 1era,Cap | RD$196,444.52 |
| 289 | Fraguache | 0.5 days | Thu 14-07-22 | Thu 14-07-22 | 279FS+7 | Albañil de 1era,Cap | RD$39,444.97 |
| 290 | Cantos | 4 days | Tue 19-07-22 | Fri 22-07-22 | 288 | Albañil de 1era,Cap | RD$240,331.96 |
| 291 | | | | | | | |
| 292 | **PINTURA** | **2 days** | **Mon 25-07-22** | **Wed 27-07-22** | | | **RD$163,708.48** |
| 293 | Pintura de base en muros | 1 day | Mon 25-07-22 | Tue 26-07-22 | 290FS+ | Ayudante de Pintor,I | RD$81,854.24 |
| 294 | Pintura acrílica en muros | 1 day | Tue 26-07-22 | Wed 27-07-22 | 293 | Ayudante de Pintor,I | RD$81,854.24 |
| 295 | | | | | | | |
| 296 | **MISCELANEOS** | **18.5 days** | **Tue 05-07-22** | **Thu 28-07-22** | | | **RD$131,010.61** |
| 297 | Barandas de H.G. sobre muros de bloques | 1 day | Wed 27-07-22 | Thu 28-07-22 | 294 | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$120,985.22 |
| 298 | Escalones de cemento | 1 day | Tue 05-07-22 | Wed 06-07-22 | 279 | Albañil de 1era,Cap | RD$10,025.39 |
| 299 | | | | | | | |
| 300 | **GAZEBO (4 UD)** | **63 days** | **Sat 11-06-22** | **Thu 01-09-22** | | | **RD$7,202,071.67** |
| 301 | | | | | | | |
| 302 | **PRELIMINARES** | **1 day** | **Tue 14-06-22** | **Wed 15-06-22** | | | **RD$50,251.80** |
| 303 | Replanteo | 1 day | Tue 14-06-22 | Wed 15-06-22 | 158SS | Brigada Topografica | RD$50,251.80 |
| 304 | | | | | | | |
| 305 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **7 days** | **Sat 11-06-22** | **Tue 21-06-22** | | | **RD$24,878.62** |
| 306 | Excavación de material compacto a mano | 3 days | Wed 15-06-22 | Mon 20-06-22 | 303 | Capataz,Peon | RD$7,543.66 |
| 307 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 4 days | Wed 15-06-22 | Tue 21-06-22 | 308 | Ayudante de Equipos,Camión | RD$2,794.46 |
| 308 | Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero) | 3 days | Sat 11-06-22 | Wed 15-06-22 | 303FF | Camión Volteo 16 m3,Chofer de | RD$14,540.50 |
| 309 | | | | | | | |
| 310 | **HORMIGÓN ARMADO F'c 210 KG/CM² EN:** | **27 days** | **Wed 22-06-22** | **Tue 26-07-22** | | | **RD$2,973,432.55** |
| 311 | Zapata de columna (1.00m x 1.00m x 0.30m) - 1.86qq/m³ | 1 day | Wed 22-06-22 | Wed 22-06-22 | 307 | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$165,387.84 |
| 312 | Columna D=0.40m - 2.11 qq/m³ | 3 days | Fri 24-06-22 | Tue 28-06-22 | 311FS+ | Albañil de 1era,Ayud | RD$637,132.56 |
| 313 | Viga Canal VT - 2.50 qq/m³ | 5 days | Thu 07-07-22 | Wed 13-07-22 | 312FS+7 | Albañil de 1era,Cap | RD$1,518,401.56 |
| 314 | Losa de fondo e=0.15m - 0.82 qq/m³ | 3 days | Fri 22-07-22 | Tue 26-07-22 | 313FS+7 | Albañil de 1era,Cap | RD$652,510.59 |
| 315 | | | | | | | |
| 316 | **TERMINACIÓN DE SUPERFICIE** | **12 days** | **Thu 18-08-22** | **Thu 01-09-22** | | | **RD$1,491,003.64** |
| 317 | Pañete general | 2 days | Fri 19-08-22 | Mon 22-08-22 | 318 | Albañil de 1era,Cap | RD$192,776.66 |
| 318 | Fraguache | 1 day | Thu 18-08-22 | Thu 18-08-22 | 328 | Albañil de 1era,Cap | RD$0.00 |
| 319 | Pintura en general | 1 day | Mon 29-08-22 | Mon 29-08-22 | 325 | Ayudante de Pintor,I | RD$71,618.54 |
| 320 | Capitel decorativo sobre columna de D= 40 cms a base de mezcla cemento-arena 1:3, con un alambron de 1/4" como refuerzo por temperatura, acabado pulido, incluye: material, mano de obra y herramienten columnas | 1 day | Wed 31-08-22 | Wed 31-08-22 | 319FS+ day | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni Residente,Peon | RD$371,578.98 |
| 321 | Basamento decorativo sobre columna de D= 40 cms a base de mezcla cemento-arena 1:3, con un alambron de 1/4" como refuerzo por temperatura, acabado pulido, incluye: | 1 day | Thu 01-09-22 | Thu 01-09-22 | 320 | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni Residente,Peon | RD$501,631.62 |
| 322 | Cantos | 2 days | Tue 23-08-22 | Thu 25-08-22 | 323 | Albañil de 1era,Cap | RD$104,951.37 |
| 323 | Gotero | 1 day | Mon 22-08-22 | Tue 23-08-22 | 317 | | RD$26,237.84 |
| 324 | Desagüe de techo de Ø3" (Dseño según detalle de diseño.) | 1 day | Thu 25-08-22 | Fri 26-08-22 | 322 | | RD$149,307.87 |

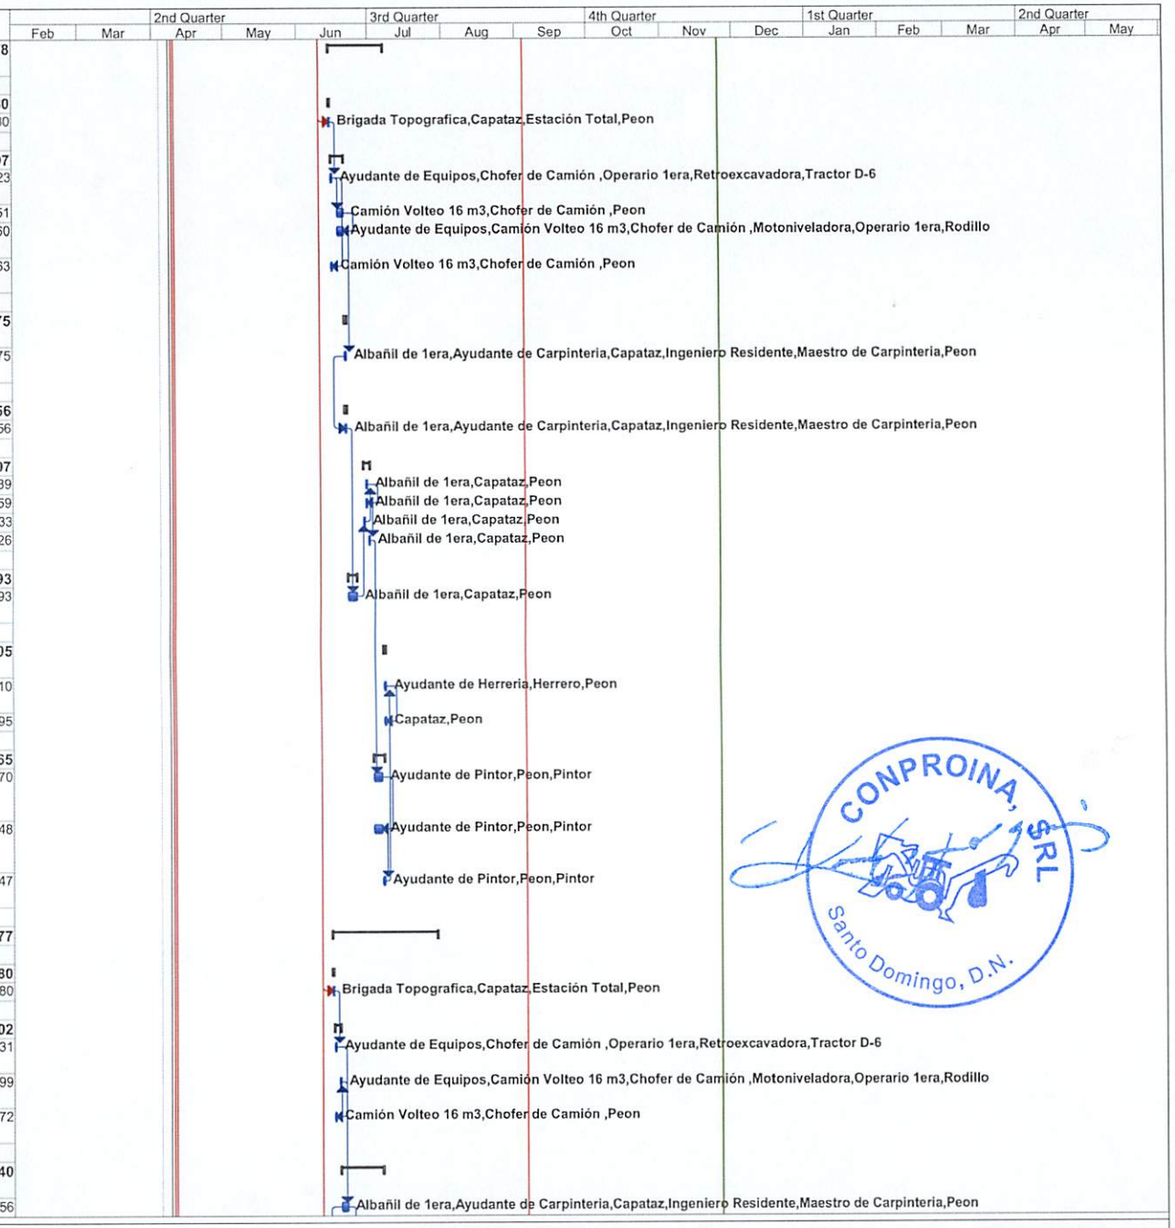CONPROINA, SRL
Santo Domingo, D.N.

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split · Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Critical

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Pintura Impermeabilizante en canaleta (3 Manos) | 1 day | Fri 26-08-22 | Sat 27-08-22 | 324 | Ayudante de Pintor,Peon,Pintor | RD$72,900.76 |
| 326 | | | | | | | |
| 327 | **SUMINISTRO E INTALACION DE TECHO EN ESTRUCTURA METÁLICA** | **10 days** | **Thu 04-08-22** | **Wed 17-08-22** | | | **RD$2,247,514.69** |
| 328 | Channell 6" x 2" x 15.10' (vigas) | 10 days | Thu 04-08-22 | Wed 17-08-22 | 314FS+7 | Ayudante de Herreri | RD$1,107,305.36 |
| 329 | Channell 4" x 2" x 30' (correas) | 10 days | Thu 04-08-22 | Wed 17-08-22 | 328FF | Ayudante de Herreri | RD$144,915.80 |
| 330 | HSS 6"x 6" x 3/16' x 0.70' para unión | 7 days | Mon 08-08-22 | Wed 17-08-22 | 328FF | Ayudante de Herreri | RD$26,320.18 |
| 331 | Cubierta de aluzicn calibre 26 liso (Dseño según detalle de diseño) | 3 days | Fri 12-08-22 | Wed 17-08-22 | 328FF | Ayudante de Herreria,Herrero,Ing | RD$379,203.19 |
| 332 | Cubierta en Tejas Plastica (Dseño según detalle de diseño) | 5 days | Wed 10-08-22 | Wed 17-08-22 | 328FF | Ayudante de Herreria,Herrero,Ing | RD$589,770.16 |
| 333 | Cubrefalta techo | 2 days | Mon 15-08-22 | Wed 17-08-22 | 328FF | Ayudante de Herreri | RD$0.00 |
| 334 | | | | | | | |
| 335 | **MISCELANEOS** | **63 days** | **Sat 11-06-22** | **Thu 01-09-22** | | | **RD$414,990.37** |
| 336 | Acera perimetral de 1.00 M | 1 day | Thu 18-08-22 | Thu 18-08-22 | 328 | Albañil de 1era,Cap | RD$280,292.99 |
| 337 | Limpieza final y continual | 63 days | Sat 11-06-22 | Thu 01-09-22 | 321FF | Capataz,Peon | RD$134,697.38 |
| 338 | | | | | | | |
| 339 | **ESTACIÓN DE POLICIA (14.10 M X 7.50 M)** | **111.75 days** | **Thu 01-09-22** | **Tue 24-01-23** | | | **RD$8,392,967.97** |
| 340 | | | | | | | |
| 341 | **PRELIMINARES** | **5 days** | **Thu 01-09-22** | **Wed 07-09-22** | | | **RD$905,708.80** |
| 342 | Remoción de capa vegetal 330m² e=0.20m | 1 day | Fri 02-09-22 | Fri 02-09-22 | 321 | Ayudante de Equipos,Operario | RD$6,897.43 |
| 343 | Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero) | 1 day | Thu 01-09-22 | Thu 01-09-22 | 321FF | Camión Volteo 16 m3,Chofer de | RD$60,473.84 |
| 344 | Charrancha y replateo | 1 day | Sat 03-09-22 | Mon 05-09-22 | 342 | Ayudante de Carpin | RD$686,117.10 |
| 345 | Caseta de Materiales 12' x 32' | 3 days | Sat 03-09-22 | Wed 07-09-22 | 342 | Ayudante de Carpin | RD$121,565.16 |
| 346 | Fumigación | 1 day | Mon 05-09-22 | Tue 06-09-22 | 344 | Capataz,Peon | RD$30,655.27 |
| 347 | | | | | | | |
| 348 | **MOVIMIENTO DE TIERRA:** | **7 days** | **Tue 06-09-22** | **Wed 14-09-22** | | | **RD$65,083.67** |
| 349 | Excavación en material no clasificado a mano | 1 day | Tue 06-09-22 | Wed 07-09-22 | 346 | Capataz,Peon | RD$19,971.13 |
| 350 | Relleno de material compactado c/compactador mecánico | 1 day | Wed 14-09-22 | Wed 14-09-22 | 370 | Ayudante de Equipos,Camión | RD$23,579.09 |
| 351 | Relleno de reposición | 1 day | Wed 14-09-22 | Wed 14-09-22 | 350FF | Capataz,Peon | RD$10,932.91 |
| 352 | Bote de material sobrante c/camión (Incluye esparcimiento en botadero) | 1 day | Tue 06-09-22 | Wed 07-09-22 | 349FF | Camión Volteo 16 m3,Chofer de | RD$10,600.54 |
| 353 | | | | | | | |
| 354 | **HORMIGÓN ARMADO F'c 210 KG/CM² EN:** | **39 days** | **Wed 07-09-22** | **Thu 27-10-22** | | | **RD$1,105,347.54** |
| 355 | Zapata para muros - 0.97 qq/m³ | 3 days | Wed 07-09-22 | Sat 10-09-22 | 352 | Albañil de 1era,Ayud | RD$181,064.03 |
| 356 | Zapata para muros - 1.02 qq/m³ | 3 days | Wed 07-09-22 | Sat 10-09-22 | 355FF | Albañil de 1era,Ayud | RD$7,612.83 |
| 357 | Zapata para columnas - 1.83 qq/m³ | 3 days | Wed 07-09-22 | Sat 10-09-22 | 356FF | Albañil de 1era,Ayud | RD$18,155.84 |
| 358 | Columnas de Amarre 0.15m x 0.20m (10ud) - 4.13 qq/m³ | 2 days | Wed 28-09-22 | Fri 30-09-22 | 372 | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$69,443.59 |
| 359 | Columnas circulares d=0.25m - 4.07 qq/m³ | 2 days | Fri 30-09-22 | Mon 03-10-22 | 358 | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$44,967.22 |
| 360 | Vigas de Amarre 0.15m x 0.20m x 43.00 a nivel de piso - 4.87 qq/m³ | 2 days | Tue 04-10-22 | Wed 05-10-22 | 359 | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$68,913.80 |
| 361 | Vigas de Amarre 0.15m x 0.20m a nivel de techo - 4.87 qq/m³ | 2 days | Thu 06-10-22 | Fri 07-10-22 | 360 | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$68,913.80 |
| 362 | Viga en de carga 0.20m x 0.30m - 4.17 qq/m³ | 2 days | Sat 08-10-22 | Tue 11-10-22 | 361 | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$16,836.79 |
| 363 | Refuerzo plano 0.20m x 0.30m L=6.50m | 2 days | Fri 14-10-22 | Mon 17-10-22 | 362FS+3 days | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$158,950.90 |
| 364 | Dinteles (0.15m x 0.50m) - 2.98 qq/m³ | 3 days | Fri 21-10-22 | Tue 25-10-22 | 363FS+3 | Albañil de 1era,Cap | RD$103,358.33 |
| 365 | Losa de Techo e=0.12m -1.21 qq/m³ | 3 days | Mon 24-10-22 | Thu 27-10-22 | 367 | Albañil de 1era,Cap | RD$323,469.38 |
| 366 | Viga de carga en arco (0.20m x 0.30m) - 4.69 qq/m³ | 2 days | Sat 08-10-22 | Tue 11-10-22 | 362FF | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$16,773.85 |
| 367 | Losa en arco convencional e=0.10m -1.34 qq/m³ | 3 days | Thu 20-10-22 | Mon 24-10-22 | 366FS+7 days | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$26,887.18 |
| 368 | | | | | | | |
| 369 | **MUROS DE BLOQUES** | **43 days** | **Mon 12-09-22** | **Fri 04-11-22** | | | **RD$784,799.48** |

CONPROINA, SRL
Santo Domingo, D.N.

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split · Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Critical

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | De 6" Ø3/8" a 0.40 m B.N.P. | 2 days | Mon 12-09-22 | Tue 13-09-22 | 357 | Albañil de 1era,Cap | RD$92,043.89 |
| 371 | De 6" Ø3/8" a 0.80 m S.N.P. | 10 days | Thu 15-09-22 | Wed 28-09-22 | 350 | Albañil de 1era,Cap | RD$529,758.88 |
| 372 | De 4" Ø3/8" a 0.80 m S.N.P. | 10 days | Thu 15-09-22 | Wed 28-09-22 | 371FF | Albañil de 1era,Cap | RD$62,629.28 |
| 373 | Antepecho en muros de bloques 6" h=1.00m | 3 days | Wed 02-11-22 | Fri 04-11-22 | 367FS+1 days | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$100,367.43 |
| 374 | | | | | | | |
| 375 | **TERMINACIÓN DE SUPERFICIE** | **10.75 days** | **Mon 07-11-22** | **Mon 21-11-22** | | | **RD$694,919.82** |
| 376 | Pañete en muros Interiores | 4 days | Tue 08-11-22 | Sat 12-11-22 | 379 | Albañil de 1era,Cap | RD$337,239.80 |
| 377 | Pañete en muros Exteriores | 4 days | Tue 08-11-22 | Sat 12-11-22 | 376FF | Albañil de 1era,Cap | RD$121,033.07 |
| 378 | Pañete en interior losa de techo | 4 days | Tue 08-11-22 | Sat 12-11-22 | 377FF | Albañil de 1era,Cap | RD$84,432.17 |
| 379 | Fraguache sobre superficies. | 1 day | Mon 07-11-22 | Tue 08-11-22 | 373FS+ | Albañil de 1era,Cap | RD$17,617.19 |
| 380 | Repello | 1 day | Mon 14-11-22 | Mon 14-11-22 | 378 | Albañil de 1era,Cap | RD$29,503.37 |
| 381 | Estrias y/o alto relieve en antepecho frontal | 0.75 days | Tue 15-11-22 | Tue 15-11-22 | 380 | Albañil de 1era,Capataz,Peon | RD$15,849.08 |
| 382 | Mochetas | 4 days | Tue 15-11-22 | Mon 21-11-22 | 381 | Albañil de 1era,Cap | RD$31,206.30 |
| 383 | Cantos en general. | 4 days | Thu 10-11-22 | Tue 15-11-22 | 381FF | Albañil de 1era,Cap | RD$58,038.84 |
| 384 | | | | | | | |
| 385 | **VENTANAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **1 day** | **Tue 15-11-22** | **Wed 16-11-22** | | | **RD$60,852.67** |
| 386 | Ventanas corredizas en aluminio y vidrio color plata | 1 day | Tue 15-11-22 | Wed 16-11-22 | 383 | Ingeniero Residente,Instalado | RD$54,003.32 |
| 387 | Ventanas salomonica en aluminio y vidrio martillado | 1 day | Tue 15-11-22 | Wed 16-11-22 | 386FF | Ingeniero Residente,Instalado | RD$6,849.35 |
| 388 | | | | | | | |
| 389 | **PUERTAS** | **4 days** | **Fri 25-11-22** | **Wed 30-11-22** | | | **RD$251,400.85** |
| 390 | Puerta comercial en cristal y aluminio (0.90m x 2.10m) | 4 days | Fri 25-11-22 | Wed 30-11-22 | 402 | Ingeniero Residente,Instalado | RD$24,784.13 |
| 391 | Puerta Polimetal (1.00m x 2.10m) | 4 days | Fri 25-11-22 | Wed 30-11-22 | 390FF | Ingeniero Residente | RD$67,116.45 |
| 392 | Puerta Polimetal (0.90m x 2.10m) | 4 days | Fri 25-11-22 | Wed 30-11-22 | 391FF | Ingeniero Residente | RD$67,116.45 |
| 393 | Puerta Polimetal (0.80m x 2.10m) | 4 days | Fri 25-11-22 | Wed 30-11-22 | 392FF | Ingeniero Residente | RD$40,269.87 |
| 394 | Puerta Polimetal ( 0.70m X 2.10m) | 4 days | Fri 25-11-22 | Wed 30-11-22 | 393FF | Ingeniero Residente | RD$13,423.29 |
| 395 | Puerta everdoor (0.60m x 2.10m) | 4 days | Fri 25-11-22 | Wed 30-11-22 | 394FF | Ingeniero Residente | RD$13,423.29 |
| 396 | Puertas en compartimiento de inodoros | 4 days | Fri 25-11-22 | Wed 30-11-22 | 395FF | Ingeniero Residente,Instalado | RD$25,267.37 |
| 397 | | | | | | | |
| 398 | **TERMINACIÓN DE PISOS** | **7 days** | **Wed 16-11-22** | **Fri 25-11-22** | | | **RD$1,049,619.01** |
| 399 | Piso en cerámica porcelanato chino | 3 days | Thu 17-11-22 | Tue 22-11-22 | 404 | Albañil de 1era,Ayud | RD$250,843.40 |
| 400 | Piso de cerámica económica en baños | 1 day | Mon 21-11-22 | Tue 22-11-22 | 399FF | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$27,988.35 |
| 401 | Zócalos de piso | 2 days | Tue 22-11-22 | Thu 24-11-22 | 400 | Albañil de 1era,Ayud | RD$168,138.56 |
| 402 | Quicios en puertas | 1 day | Thu 24-11-22 | Fri 25-11-22 | 401 | Albañil de 1era,Ayud | RD$5,922.04 |
| 403 | Acera violinada en perimetro edificio | 3 days | Mon 21-11-22 | Thu 24-11-22 | 405 | Albañil de 1era,Cap | RD$118,650.03 |
| 404 | Torta de H.A. e=0.10m con acero de Ø1/4" | 1 day | Wed 16-11-22 | Thu 17-11-22 | 387 | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$309,339.10 |
| 405 | Piso de H.A. e=0.10m en parqueo con acero de Ø1/4" | 2 days | Thu 17-11-22 | Mon 21-11-22 | 404 | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$168,737.53 |
| 406 | | | | | | | |
| 407 | **REVESTIMIENTO DE PARED** | **3 days** | **Wed 30-11-22** | **Mon 05-12-22** | | | **RD$212,187.48** |
| 408 | Cerámica en pared de baños | 2 days | Wed 30-11-22 | Fri 02-12-22 | 396 | Albañil de 1era,Ayud | RD$207,522.49 |
| 409 | Cerámica en cocina | 1 day | Fri 02-12-22 | Mon 05-12-22 | 408 | Albañil de 1era,Ayud | RD$4,664.99 |
| 410 | | | | | | | |
| 411 | **INSTALACIONES SANITARIAS** | **37.75 days** | **Sat 05-11-22** | **Fri 23-12-22** | | | **RD$1,762,923.22** |
| 412 | Inodoro blanco | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 409 | Ayudante de plomer | RD$80,855.59 |
| 413 | Lavamanos blanco | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 412FF | Ayudante de plomer | RD$51,253.61 |
| 414 | Fregadero de acero inoxidable (sencillo) | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 413FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$19,740.77 |
| 415 | Ducha | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 414FF | Ayudante de plomer | RD$56,772.62 |
| 416 | Accesorios para Baños | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 415FF | Ayudante de plomer | RD$25,393.71 |
| 417 | Desagüe de piso en 2" PVC | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 416FF | Ayudante de plomer | RD$17,123.72 |
| 418 | Ventilacion de 3" PVC | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 417FF | Ayudante de plomer | RD$11,986.21 |
| 419 | Salidas de Desagüe tuberia PVC 2" | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 418FF | Ayudante de plomer | RD$64,213.96 |
| 420 | Desagüe de techo Ø 4" PVC | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 419FF | Ayudante de plomer | RD$12,842.14 |
| 421 | Trampa de Grasa (1.00m x 1.00m x 1.00m) | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 420FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$15,288.65 |




Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split · Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Critical

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | Registro Sanitario (0.60m x 0.60m x 0.70m) | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 421FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$47,916.41 |
| 423 | Cisterna para 4000 gl (3.6m x 3.00m x 2.00m) | 20 days | Mon 28-11-22 | Fri 23-12-22 | 422FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$212,583.07 |
| 424 | Cámara Septica (1.70m x 3.40m x 1.60m) | 20 days | Mon 28-11-22 | Fri 23-12-22 | 423FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$102,400.91 |
| 425 | Llave de chorro | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 424FF | Ayudante de plomer | RD$7,453.87 |
| 426 | Tinaco de 500 gls | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 425FF | Ayudante de plomer | RD$17,605.98 |
| 427 | Pozo tubular para agua potable | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 426FF | Ayudante de plomer | RD$536,931.63 |
| 428 | Filtrante en 8" | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 427FF | Ayudante de plomer | RD$119,230.41 |
| 429 | Bomba Myers para cisterna de 2HP | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 428FF | Ayudante de plomer | RD$44,126.94 |
| 430 | Tanque hidroneumatico de 120 gls | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 429FF | Ayudante de plomer | RD$121,162.72 |
| 431 | Suministro e instalación Plafond en PVC en baños | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 430FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$22,716.95 |
| 432 | Sistema sanitario para cárceles (prevision fondos) | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 431FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$55,272.37 |
| 433 | Suministro de tuberías y piezas en PVC para aguas residuales | 15 days | Sat 05-11-22 | Thu 24-11-22 | 373 | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$18,950.53 |
| 434 | Suministro de tuberías y piezas en PVC para agua potable | 15 days | Sat 05-11-22 | Thu 24-11-22 | 433FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$23,688.16 |
| 435 | Mano de obra plomero | 15 days | Mon 05-12-22 | Fri 23-12-22 | 432FF | Ayudante de plomer | RD$77,412.29 |
| 436 | | | | | | | |
| 437 | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | **15 days** | **Fri 23-12-22** | **Fri 13-01-23** | | | **RD$518,564.18** |
| 438 | Salidas de luces cenitales | 15 days | Fri 23-12-22 | Fri 13-01-23 | 435 | Ayudante Electricist | RD$69,265.76 |
| 439 | Salidas interruptores simples | 15 days | Fri 23-12-22 | Fri 13-01-23 | 438FF | Ayudante Electricist | RD$30,573.52 |
| 440 | Salidas interruptores dobles | 15 days | Fri 23-12-22 | Fri 13-01-23 | 439FF | Ayudante Electricist | RD$6,304.21 |
| 441 | Salidas para Tomacorriente 120V | 15 days | Fri 23-12-22 | Fri 13-01-23 | 440FF | Ayudante Electricist | RD$26,947.65 |
| 442 | Salidas para Tomacorriente 220V | 15 days | Fri 23-12-22 | Fri 13-01-23 | 441FF | Ayudante Electricist | RD$9,784.79 |
| 443 | Caja de Breakers (8 circuitos) | 15 days | Fri 23-12-22 | Fri 13-01-23 | 442FF | Ayudante Electricist | RD$8,448.78 |
| 444 | Registros eléctricos | 15 days | Fri 23-12-22 | Fri 13-01-23 | 443FF | Ayudante Electricist | RD$4,974.51 |
| 445 | Acometida desde transformador hasta medidor | 15 days | Fri 23-12-22 | Fri 13-01-23 | 444FF | Ayudante Electricista,Ingenier | RD$51,180.64 |
| 446 | Salidas para telefonos. | 15 days | Fri 23-12-22 | Fri 13-01-23 | 445FF | Ayudante Electricist | RD$102,361.28 |
| 447 | Salidas para red de data y PC | 15 days | Fri 23-12-22 | Fri 13-01-23 | 446FF | Ayudante Electricist | RD$3,316.34 |
| 448 | Salidas para abanicos de pared | 15 days | Fri 23-12-22 | Fri 13-01-23 | 447FF | Ayudante Electricist | RD$11,370.32 |
| 449 | Abanicos KDK de pared (suministro y colocación) | 15 days | Fri 23-12-22 | Fri 13-01-23 | 448FF | Ayudante Electricista,Ingenier | RD$52,697.02 |
| 450 | Tuberías y piezas materiales eléctricos | 15 days | Fri 23-12-22 | Fri 13-01-23 | 449FF | Ayudante Electricista,Ingenier | RD$7,106.45 |
| 451 | Mano de obra electricista | 15 days | Fri 23-12-22 | Fri 13-01-23 | 450FF | Ayudante Electricist | RD$134,232.91 |
| 452 | **TERMINACIÓN DE TECHO** | **8 days** | **Fri 13-01-23** | **Tue 24-01-23** | | | **RD$302,819.11** |
| 453 | Fino en techo | 2 days | Fri 13-01-23 | Mon 16-01-23 | 451 | Albañil de 1era,Cap | RD$93,040.67 |
| 454 | Zabaleta en techo | 2 days | Mon 16-01-23 | Wed 18-01-23 | 453 | Albañil de 1era,Cap | RD$9,831.78 |
| 455 | Impermeabilizante en techo | 2 days | Fri 20-01-23 | Tue 24-01-23 | 456 | Albañil de 1era,Cap | RD$188,633.86 |
| 456 | Gotero ranurado | 2 days | Wed 18-01-23 | Fri 20-01-23 | 454 | Albañil de 1era,Cap | RD$11,312.80 |
| 457 | | | | | | | |
| 458 | **TERMINACIÓN DE COCINA** | **5 days** | **Wed 30-11-22** | **Wed 07-12-22** | | | **RD$99,928.99** |
| 459 | Gabinte de piso en pino tratado y plywood | 5 days | Wed 30-11-22 | Wed 07-12-22 | 396 | Ayudante de Carpinteria,Maestro | RD$32,190.63 |
| 460 | Gabinte de pared en pino tratado y plywood | 5 days | Wed 30-11-22 | Wed 07-12-22 | 459FF | Ayudante de Carpinteria,Maestro | RD$32,190.63 |
| 461 | Muros de apoyo para tope de granito | 5 days | Wed 30-11-22 | Wed 07-12-22 | 460FF | Capataz,Ingeniero F | RD$6,967.11 |
| 462 | Tope de marmolite en cocina | 5 days | Wed 30-11-22 | Wed 07-12-22 | 461FF | Ayudante de Pizero, | RD$28,580.62 |
| 463 | | | | | | | |
| 464 | **PINTURA EN GENERAL** | **8 days** | **Wed 07-12-22** | **Fri 16-12-22** | | | **RD$203,292.34** |
| 465 | Acrílica en muros interiores | 8 days | Wed 07-12-22 | Fri 16-12-22 | 462 | Ayudante de Pintor, | RD$110,307.59 |
| 466 | Acrílica en muros exteriores. | 8 days | Wed 07-12-22 | Fri 16-12-22 | 465FF | Ayudante de Pintor, | RD$44,605.08 |
| 467 | Acrílica blanca económica en techo | 8 days | Wed 07-12-22 | Fri 16-12-22 | 466FF | Ayudante de Pintor, | RD$28,252.48 |
| 468 | Pintura mantenimiento en hierro de cárceles | 8 days | Wed 07-12-22 | Fri 16-12-22 | 467FF | Ayudante de Pintor,Peon,Pintor | RD$20,127.19 |
| 469 | | | | | | | |
| 470 | **MISCELANEOS** | **7 days** | **Fri 16-12-22** | **Mon 26-12-22** | | | **RD$375,520.81** |
| 471 | Jardinería | 7 days | Fri 16-12-22 | Mon 26-12-22 | 468 | Capataz,Jardinero,F | RD$7,896.05 |
| 472 | Asta para banderas | 7 days | Fri 16-12-22 | Mon 26-12-22 | 471FF | Capataz,Peon | RD$10,837.72 |
| 473 | Salida para GLP | 7 days | Fri 16-12-22 | Mon 26-12-22 | 472FF | Capataz,Peon | RD$4,319.61 |

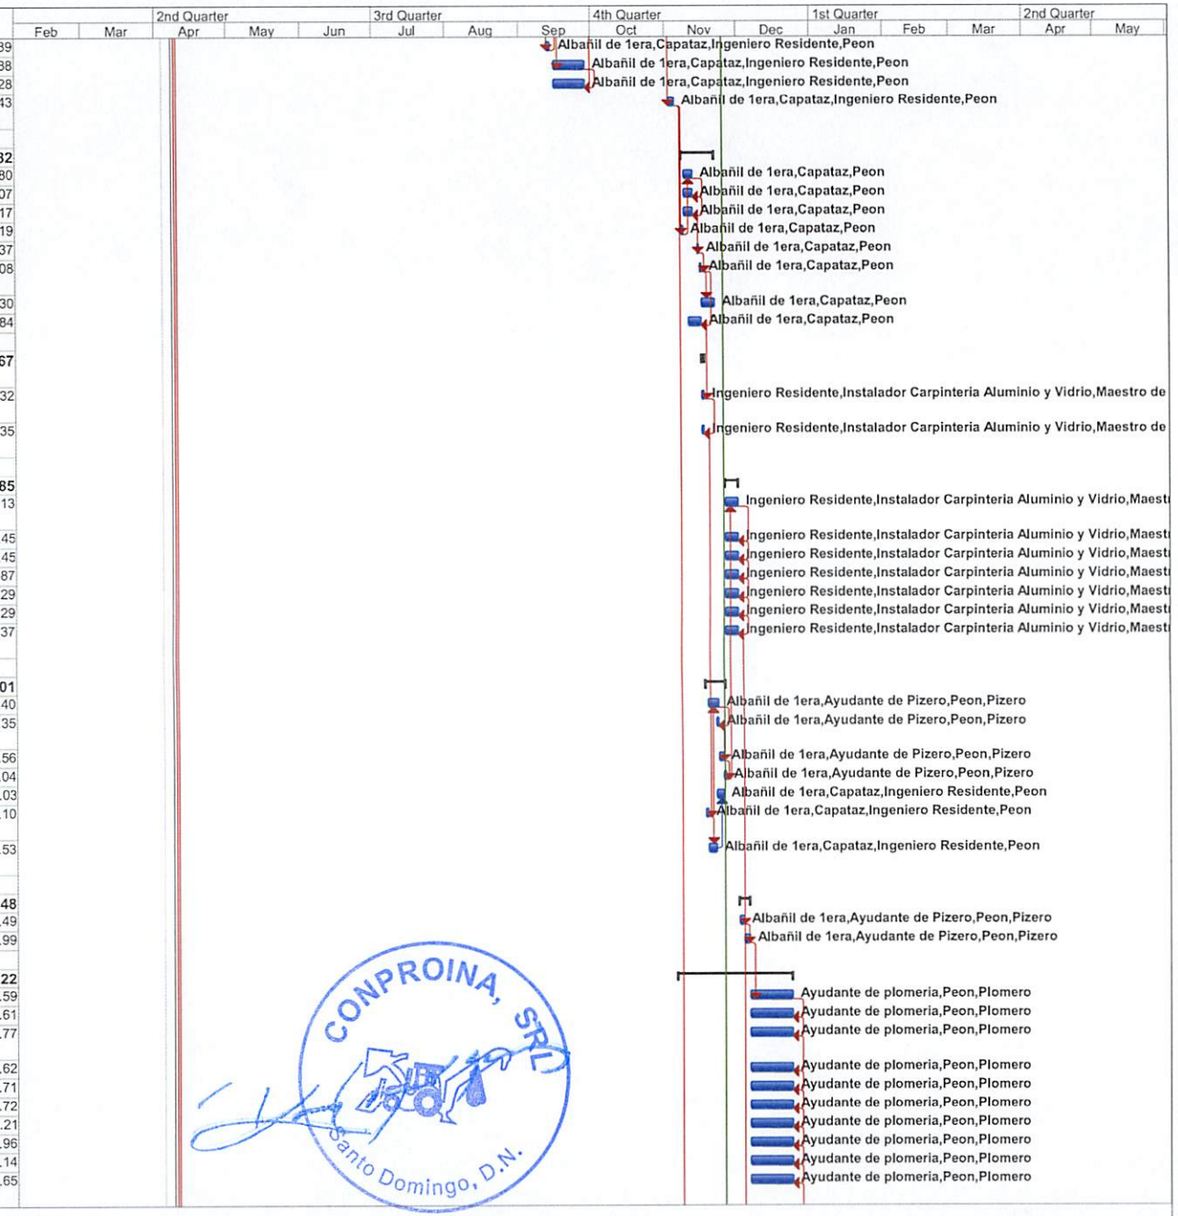


CONPROINA, SRL
Santo Domingo, D.N.

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split · Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Critical

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | Escudos | 7 days | Fri 16-12-22 | Mon 26-12-22 | 473FF | Capataz,Peon | RD$10,837.72 |
| 475 | Perfiles en fachada frontal | 7 days | Fri 16-12-22 | Mon 26-12-22 | 474FF | Capataz,Peon,Ayud | RD$13,934.21 |
| 476 | Carpintería metálica en cárceles (rejas de hierro) | 7 days | Fri 16-12-22 | Mon 26-12-22 | 475FF | Capataz,Peon,Ayud de Herreria,Herrero | RD$323,050.76 |
| 477 | Limpieza final | 7 days | Fri 16-12-22 | Mon 26-12-22 | 476FF | Capataz,Peon | RD$4,644.74 |
| 478 | | | | | | | |
| 479 | **CASETA DE SEGURIDAD (2 UD)** | **90 days?** | **Fri 23-12-22** | **Tue 25-04-23** | | | **RD$1,440,734.25** |
| 480 | | | | | | | |
| 481 | **PRELIMINARES** | **1 day** | **Fri 13-01-23** | **Sat 14-01-23** | | | **RD$9,347.05** |
| 482 | Replanteo y charrancha | 1 day | Fri 13-01-23 | Sat 14-01-23 | 447 | Brigada Topografica | RD$9,347.05 |
| 483 | | | | | | | |
| 484 | **MOVIMIENTO DE TIERRA A MANO (Incluye excavación de zapatas, reposición de material compactado y bote de material sobrante)** | 5 days | Sat 14-01-23 | Fri 20-01-23 | 482 | Ayudante de Equipos,Camión Volteo 16 m3,Chofer de Camión ,Operario | RD$18,578.95 |
| 485 | | | | | | | |
| 486 | **HORMIGÓN ARMADO F'c 210 KG/CM² EN:** | **38 days** | **Fri 20-01-23** | **Tue 14-03-23** | | | **RD$209,395.28** |
| 487 | Zapata de Muro (Incluye Zapata C1)- 0.85 qq/m³ | 2 days | Fri 20-01-23 | Tue 24-01-23 | 484 | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$48,793.27 |
| 488 | Viga de amarre B.N.P. (0.15m x 0.20m) - 3.71 qq/m³ | 4 days | Tue 14-02-23 | Sat 18-02-23 | 492FS+7 days | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$30,066.62 |
| 489 | Viga de amarre a Nivel de Techo (0.15m x 0.20m) - 3.37 qq/m³ | 4 days | Tue 14-02-23 | Sat 18-02-23 | 488FF | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$16,230.26 |
| 490 | Dintel D1 (0.15m x 0.30m)- 2.99 qq/m³ | 4 days | Tue 14-02-23 | Sat 18-02-23 | 489FF | | RD$9,450.21 |
| 491 | Viga Dintel D2 - 2.32 qq/m³ | 4 days | Tue 14-02-23 | Sat 18-02-23 | 490FF | Albañil de 1era,Capa | RD$28,975.91 |
| 492 | Columna (0.30m x0.15m) - 3.03 qq/m³ | 3 days | Wed 01-02-23 | Sat 04-02-23 | 497 | Albañil de 1era,Ayud | RD$19,630.61 |
| 493 | Losa de techo 0.12m - 1.34 qq/m³ | 3 days | Thu 09-03-23 | Tue 14-03-23 | 491FS+ | Albañil de 1era,Capa | RD$56,248.40 |
| 494 | | | | | | | |
| 495 | **MUROS DE BLOQUES** | **5 days** | **Tue 24-01-23** | **Wed 01-02-23** | | | **RD$135,503.80** |
| 496 | De 6" B.N.P | 2 days | Tue 24-01-23 | Fri 27-01-23 | 487 | Albañil de 1era,Capa | RD$21,968.83 |
| 497 | De 6" S.N.P | 3 days | Fri 27-01-23 | Wed 01-02-23 | 496 | Albañil de 1era,Capa | RD$113,534.97 |
| 498 | | | | | | | |
| 499 | **TERMINACIÓN DE SUPERFICIE** | **52 days** | **Wed 01-02-23** | **Mon 10-04-23** | | | **RD$221,804.43** |
| 500 | Fraguache | 1 day | Fri 31-03-23 | Sat 01-04-23 | 493FS+ | Albañil de 1era,Capa | RD$3,058.54 |
| 501 | Pañete interior | 3 days | Sat 01-04-23 | Wed 05-04-23 | 500 | Albañil de 1era,Capa | RD$36,566.90 |
| 502 | Pañete exterior | 3 days | Sat 01-04-23 | Wed 05-04-23 | 501FF | Albañil de 1era,Capa | RD$29,405.18 |
| 503 | Fino de techo | 1 day | Sat 01-04-23 | Mon 03-04-23 | 500 | Albañil de 1era,Capa | RD$16,151.78 |
| 504 | Cantos | 3 days | Wed 05-04-23 | Mon 10-04-23 | 502 | Albañil de 1era,Capa | RD$17,472.26 |
| 505 | Antepecho | 1 day | Wed 05-04-23 | Thu 06-04-23 | 507 | Albañil de 1era,Capa | RD$2,252.70 |
| 506 | Zabaleta en techo | 1 day | Mon 03-04-23 | Tue 04-04-23 | 503 | Albañil de 1era,Capa | RD$4,120.42 |
| 507 | Gotero de ranurado | 1 day | Tue 04-04-23 | Wed 05-04-23 | 506 | Albañil de 1era,Capa | RD$2,954.58 |
| 508 | Impermeabilizante en techo (tipo sellador) | 1 day | Thu 06-04-23 | Fri 07-04-23 | 505 | Ayudante de Pintor,Capataz,Peor | RD$13,739.92 |
| 509 | Cerámica baño | 1 day | Mon 06-02-23 | Tue 07-02-23 | 512FS+ | Albañil de 1era,Ayud | RD$16,594.35 |
| 510 | Pintura general acrílica (incluye base blanca) | 1 day | Fri 07-04-23 | Mon 10-04-23 | 508 | Ayudante de Pintor,Peon,Pintor | RD$36,193.82 |
| 511 | | | | | | | |
| 512 | Pisos de hormigón con malla electosoldada D2.30x D2.30 (pulido) | 1 day | Wed 01-02-23 | Thu 02-02-23 | 497 | Albañil de 1era,Capataz,Peon | RD$17,150.57 |
| 513 | | | | | | | |
| 514 | Acera perimetral de 0.80mt | 1 day | Thu 02-02-23 | Fri 03-02-23 | 512 | Albañil de 1era,Capa | RD$26,143.41 |
| 515 | | | | | | | |
| 516 | **PORTAJE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)** | **3 days** | **Mon 10-04-23** | **Thu 13-04-23** | | | **RD$70,538.08** |
| 517 | Premarco en puerta y ventanas | 3 days | Mon 10-04-23 | Thu 13-04-23 | 510 | Instalador Carpinteri | RD$7,060.00 |
| 518 | Puerta polimetal inc herraje instalacion y llavin tipo (2.10x1.00)mt | 3 days | Mon 10-04-23 | Thu 13-04-23 | 517FF | Instalador Carpinteria | RD$26,320.18 |
| 519 | Verja de protección (2.10x1.0)mt | 3 days | Mon 10-04-23 | Thu 13-04-23 | 518FF | Instalador Carpinteri | RD$37,157.90 |
| 520 | | | | | | | |
| 521 | **VENTANA DE ALUMINIO (INCLUYE COLOCACIÓN)** | **7 days** | **Thu 13-04-23** | **Tue 25-04-23** | | | **RD$24,183.60** |
| 522 | Ventanas de aluminio en celosías color blanco, fabricación superior | 7 days | Thu 13-04-23 | Tue 25-04-23 | 518 | Instalador Carpinteria | RD$20,158.16 |

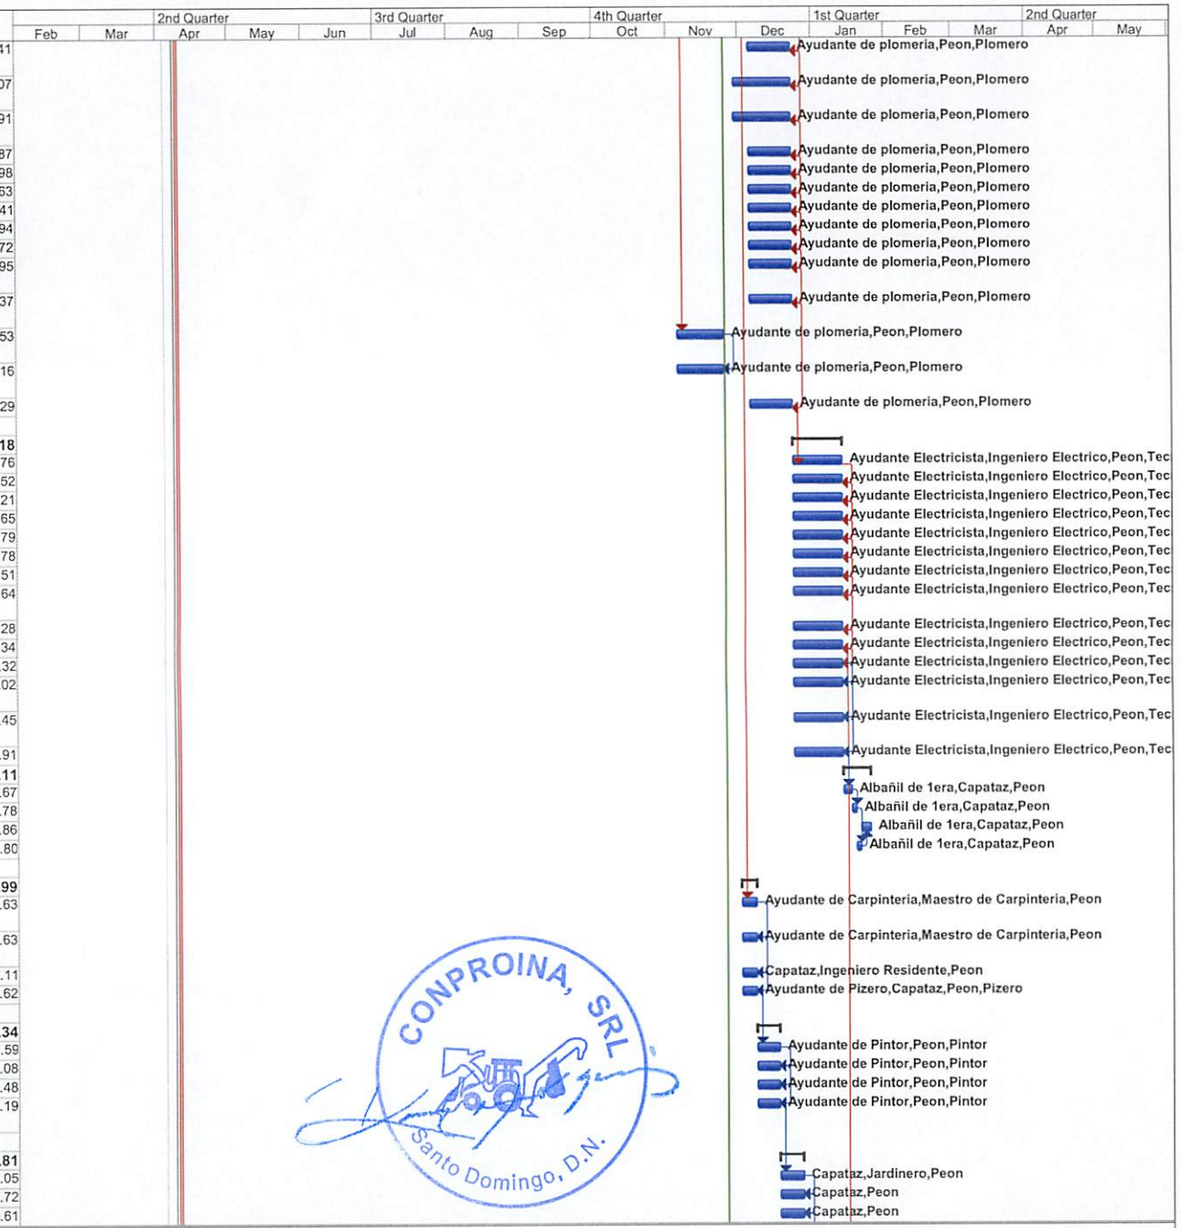


CONPROINA, SRL
Santo Domingo, D.N.

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split · Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Critical

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | Verja de protección en ventanas | 7 days | Thu 13-04-23 | Tue 25-04-23 | 522FF | Instalador Carpinteri | RD$4,025.44 |
| 524 | | | | | | | |
| 525 | **INSTALACIÓN SANITARIA** | **48 days?** | **Fri 23-12-22** | **Tue 28-02-23** | | | **RD$640,051.87** |
| 526 | INSTALACIÓN SANITARIA | 0 days? | Fri 23-12-22 | Fri 23-12-22 | | | RD$0.00 |
| 527 | INSTALACIÓN SANITARIA | 0 days? | Fri 13-01-23 | Fri 13-01-23 | | | RD$0.00 |
| 528 | Lavamanos sencillos | 15 days | Tue 07-02-23 | Tue 28-02-23 | 509 | Ayudante de plomer | RD$34,169.07 |
| 529 | Inodoro | 15 days | Tue 07-02-23 | Tue 28-02-23 | 528FF | Ayudante de plomer | RD$40,427.79 |
| 530 | Desagüe de techo | 15 days | Tue 07-02-23 | Tue 28-02-23 | 529FF | Ayudante de plomer | RD$6,421.07 |
| 531 | Ducha | 15 days | Tue 07-02-23 | Tue 28-02-23 | 530FF | Ayudante de plomer | RD$22,709.05 |
| 532 | Desagüe de piso 3" | 15 days | Tue 07-02-23 | Tue 28-02-23 | 531FF | Ayudante de plomer | RD$5,556.62 |
| 533 | Columna de ventilación de 3" | 15 days | Tue 07-02-23 | Tue 28-02-23 | 532FF | Ayudante de plomer | RD$7,990.81 |
| 534 | Cámara de inspección | 15 days | Tue 07-02-23 | Tue 28-02-23 | 533FF | Ayudante de plomer | RD$19,898.67 |
| 535 | Séptico (1.90x1.10) m | 15 days | Tue 07-02-23 | Tue 28-02-23 | 534FF | Ayudante de plomer | RD$204,801.82 |
| 536 | Tinaco 150gls | 15 days | Tue 07-02-23 | Tue 28-02-23 | 535FF | Ayudante de plomer | RD$24,635.69 |
| 537 | Pozo Filtrante | 15 days | Tue 07-02-23 | Tue 28-02-23 | 536FF | Ayudante de plomer | RD$238,460.81 |
| 538 | Barra de cortina baño | 15 days | Tue 07-02-23 | Tue 28-02-23 | 537FF | Ayudante de plomer | RD$4,975.47 |
| 539 | Tuberia 4" PVC (Drenaje Sanitario) (inc. Movimiento de tierra y colocacion) | 15 days | Tue 07-02-23 | Tue 28-02-23 | 538FF | Ayudante de plomeria,Capataz,P | RD$9,475.26 |
| 540 | Mano de obra instalación | 15 days | Tue 07-02-23 | Tue 28-02-23 | 539FF | Ayudante de plomer | RD$20,529.74 |
| 541 | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | **6 days** | **Tue 28-02-23** | **Tue 07-03-23** | | | **RD$111,331.19** |
| 542 | Entrada general (incluye panel de Braeker de 4/8 circuitos) | 5 days | Tue 28-02-23 | Mon 06-03-23 | 540 | Ayudante Electricista,Capataz | RD$16,897.55 |
| 543 | Salida luces cenitales | 5 days | Tue 28-02-23 | Mon 06-03-23 | 542FF | Ayudante Electricist | RD$36,138.66 |
| 544 | Salida tomacorrientes Doble 120 V | 5 days | Tue 28-02-23 | Mon 06-03-23 | 543FF | Ayudante Electricist | RD$20,210.74 |
| 545 | Salida interruptor sencillo | 5 days | Tue 28-02-23 | Mon 06-03-23 | 544FF | Ayudante Electricist | RD$18,344.11 |
| 546 | | | | | | | |
| 547 | Logo y Letrero de INAPA | 1 day | Mon 06-03-23 | Tue 07-03-23 | 545 | Ayudante de Pintor, | RD$19,740.13 |
| 548 | | | | | | | |
| 549 | **CENTRO COMUNAL** | **117 days** | **Thu 12-01-23** | **Mon 19-06-23** | | | **RD$4,535,023.08** |
| 550 | | | | | | | |
| 551 | **PRELIMINARES** | **1 day** | **Fri 13-01-23** | **Sat 14-01-23** | | | **RD$55,336.05** |
| 552 | Replanteo y charrancha | 1 day | Fri 13-01-23 | Sat 14-01-23 | 447 | Brigada Topografica | RD$55,336.05 |
| 553 | | | | | | | |
| 554 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **9 days** | **Thu 12-01-23** | **Tue 24-01-23** | | | **RD$23,300.60** |
| 555 | Excavación material no clasificado a mano | 2 days | Sat 14-01-23 | Tue 17-01-23 | 552 | Capataz,Peon | RD$7,165.20 |
| 556 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 1 day | Mon 23-01-23 | Tue 24-01-23 | 568 | Ayudante de Equipos,Camión | RD$3,244.18 |
| 557 | Bote de material in situ | 2 days | Thu 12-01-23 | Sat 14-01-23 | 552FF | Camión Volteo 16 m | RD$12,891.22 |
| 558 | | | | | | | |
| 559 | **HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM² EN:** | **32 days** | **Sat 14-01-23** | **Tue 28-02-23** | | | **RD$624,040.71** |
| 560 | Zapata de columna Z1 (1.20m x 1.20m) - 2.18 qq/m³ | 3 days | Sat 14-01-23 | Wed 18-01-23 | 557 | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$112,419.02 |
| 561 | Zapata de muros de block de 6" - 0.71 qq/m³ | 3 days | Sat 14-01-23 | Wed 18-01-23 | 560FF | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$171,742.77 |
| 562 | Pedestal (0.45m x 0.45m) - 6.94 qq/m³ | 3 days | Thu 09-02-23 | Tue 14-02-23 | 569 | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$100,310.83 |
| 563 | Columna de amarre - 2.97 qq/m³ | 3 days | Thu 09-02-23 | Tue 14-02-23 | 562FF | Albañil de 1era,Ayuc | RD$100,264.29 |
| 564 | Viga de amarre (0.15m x 0.20m) - 3.66 qq/m³ | 3 days | Wed 22-02-23 | Tue 28-02-23 | 563FS+7 days | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$95,394.71 |
| 565 | Dintel (0.15m x 0.20m) - 5.47 qq/m³ | 3 days | Wed 22-02-23 | Tue 28-02-23 | 564FF | Albañil de 1era,Ayuc | RD$43,909.09 |
| 566 | | | | | | | |
| 567 | **MUROS DE BLOQUES** | **16 days** | **Wed 18-01-23** | **Thu 09-02-23** | | | **RD$646,125.74** |
| 568 | De 6" B.N.P. | 3 days | Wed 18-01-23 | Mon 23-01-23 | 561 | Albañil de 1era,Cap | RD$92,911.76 |
| 569 | De 6" S.N.P. | 12 days | Tue 24-01-23 | Thu 09-02-23 | 556 | Albañil de 1era,Cap | RD$553,213.98 |
| 570 | | | | | | | |
| 571 | **TERMINACIÓN DE SUPERFICIE** | **36 days** | **Wed 08-03-23** | **Wed 26-04-23** | | | **RD$273,361.75** |
| 572 | Fraguache interior elementos de hormigón | 1 day | Wed 08-03-23 | Thu 09-03-23 | 565FS+7 days | Albañil de 1era,Capataz,Peon | RD$5,849.44 |
| 573 | Pañete interior pulido | 5 days | Thu 09-03-23 | Thu 16-03-23 | 572 | Albañil de 1era,Cap | RD$81,095.95 |
| 574 | Pañete exterior | 5 days | Mon 17-04-23 | Wed 26-04-23 | 586 | Albañil de 1era,Cap | RD$66,491.66 |
| 575 | Pañete en viga y columna | 5 days | Mon 17-04-23 | Wed 26-04-23 | 574FF | Albañil de 1era,Cap | RD$119,924.70 |

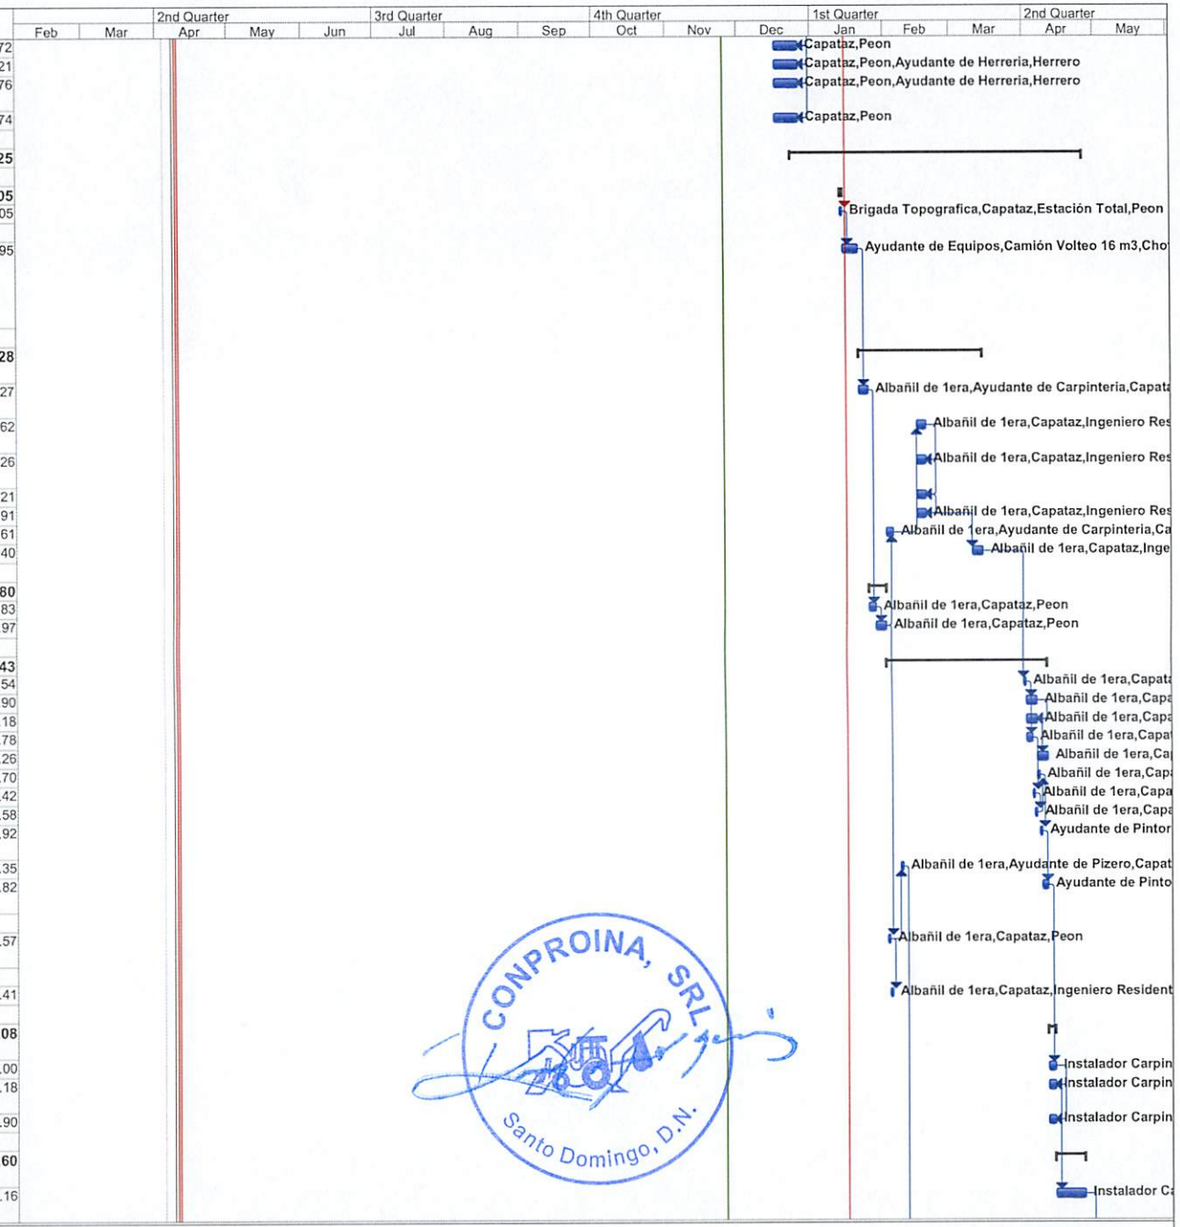


CONPROINA, SRL
Santo Domingo, D.N.

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split · Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Critical

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | | | | | | | |
| 577 | **ESTRUCTURA METÁLICA** | **30 days** | **Thu 09-03-23** | **Mon 17-04-23** | | | **RD$934,891.42** |
| 578 | Columna metálica W8x31 | 30 days | Thu 09-03-23 | Mon 17-04-23 | 572 | Capataz,Ingeniero F | RD$368,084.16 |
| 579 | Viga metálica W10x26 | 30 days | Thu 09-03-23 | Mon 17-04-23 | 578FF | Capataz,Ingeniero F | RD$206,246.74 |
| 580 | Cubierta con plancha de Aluzinc Cal. 26 + Correas en perfiles C8 x 1/16 en H.G. + tillas tensoras en barras HN 1/2" | 30 days | Thu 09-03-23 | Mon 17-04-23 | 579FF | Capataz,Ingeniero Residente,Peon,Ayu de Herreria,Herrero | RD$333,968.48 |
| 581 | Placa base de 4 3/4" x 9 3/4" x 3/8" | 30 days | Thu 09-03-23 | Mon 17-04-23 | 580FF | Capataz,Ingeniero F | RD$1,911.36 |
| 582 | Placa base de 3 1/2" x 5 5/8" x 1/2" | 30 days | Thu 09-03-23 | Mon 17-04-23 | 581FF | Capataz,Ingeniero F | RD$4,263.30 |
| 583 | Placa base de 6" x 9 1/2" x 3/8" | 30 days | Thu 09-03-23 | Mon 17-04-23 | 582FF | Capataz,Ingeniero F | RD$2,238.16 |
| 584 | Placa base de 5 1/2" x 5 1/2" x 3/4" | 30 days | Thu 09-03-23 | Mon 17-04-23 | 583FF | Capataz,Ingeniero F | RD$5,874.57 |
| 585 | Pernos de Ø5/8" A325 | 30 days | Thu 09-03-23 | Mon 17-04-23 | 584FF | Capataz,Ingeniero F | RD$7,672.36 |
| 586 | Pernos de Ø3/4" x 10" Hit-HY200+HIT-Z Acero Inoxidable (Incluye resina epóxica para anclajes) | 30 days | Thu 09-03-23 | Mon 17-04-23 | 585FF | Capataz,Ingeniero Residente,Peon,Ayu de Herreria,Herrero | RD$3,297.39 |
| 587 | Tornillos de Ø1/2" A307 | 30 days | Thu 09-03-23 | Mon 17-04-23 | 586FF | Capataz,Ingeniero F | RD$1,334.90 |
| 588 | | | | | | | |
| 589 | **INSTALACIONES SANITARIAS** | **12 days** | **Mon 29-05-23** | **Tue 13-06-23** | | | **RD$303,227.07** |
| 590 | Inodoro | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 631 | Ayudante de plomer | RD$80,855.59 |
| 591 | Lavamanos | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 590FF | Ayudante de plomer | RD$34,169.07 |
| 592 | Desagüe de piso 2" parrilla acero inoxidable | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 591FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$4,280.93 |
| 593 | Fregadero acero inoxidable doble | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 592FF | Ayudante de plomer | RD$19,740.77 |
| 594 | Trampa de grasa (1.00m x 1.00m x 1.00m) | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 593FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$15,288.65 |
| 595 | Cámara séptica (1.00m x 2.40m x 1.00m) | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 594FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$102,400.91 |
| 596 | Registro de inspección (0.60m x 0.60m x 0.75m) | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 595FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$31,944.27 |
| 597 | Tubería de descarga de Ø4" | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 596FF | Ayudante de plomer | RD$2,393.53 |
| 598 | Tubería de descarga de Ø3" | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 597FF | Ayudante de plomer | RD$601.96 |
| 599 | Tubería de descarga de Ø2" | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 598FF | Ayudante de plomer | RD$1,092.02 |
| 600 | Tubería Ø2" PVC presión (SCH-40) | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 599FF | Ayudante de plomer | RD$3,363.24 |
| 601 | Tubería Ø1" PVC presión (SCH-40) | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 600FF | Ayudante de plomer | RD$408.88 |
| 602 | Tubería Ø3/4" PVC presión (SCH-40) | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 601FF | Ayudante de plomer | RD$1,222.54 |
| 603 | Tubería Ø1/2" PVC presión (SCH-40) | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 602FF | Ayudante de plomer | RD$656.02 |
| 604 | Llave de paso Ø2" | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 603FF | Ayudante de plomer | RD$1,934.53 |
| 605 | Llave de paso Ø1/2" | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 604FF | Ayudante de plomer | RD$1,516.04 |
| 606 | Llave de chorro de Ø1/2" | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 605FF | Ayudante de plomer | RD$1,358.12 |
| 607 | | | | | | | |
| 608 | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | **7 days** | **Mon 17-04-23** | **Fri 28-04-23** | | | **RD$98,662.76** |
| 609 | Salida luces cenitales | 7 days | Mon 17-04-23 | Fri 28-04-23 | 587 | Ayudante Electricist | RD$45,173.32 |
| 610 | Salida interruptor sencillo | 7 days | Mon 17-04-23 | Fri 28-04-23 | 609FF | Ayudante Electricist | RD$12,229.41 |
| 611 | Salida interruptor triple | 7 days | Mon 17-04-23 | Fri 28-04-23 | 610FF | Ayudante Electricist | RD$2,915.22 |
| 612 | Tomacorriente doble 120V | 7 days | Mon 17-04-23 | Fri 28-04-23 | 611FF | Ayudante Electricist | RD$16,842.28 |
| 613 | Tomacorriente doble 120v sobre meseta | 7 days | Mon 17-04-23 | Fri 28-04-23 | 612FF | Ayudante Electricista,Capataz | RD$6,736.91 |
| 614 | Panel distribución 12 espacios con Breaker | 7 days | Mon 17-04-23 | Fri 28-04-23 | 613FF | Ayudante Electricista,Capataz | RD$14,765.62 |
| 615 | | | | | | | |
| 616 | **PISOS Y REVESTIMIENTO** | **17 days** | **Fri 28-04-23** | **Mon 22-05-23** | | | **RD$622,621.24** |
| 617 | Piso de granito (0.30m x 0.30m) fondo gris | 7 days | Fri 28-04-23 | Tue 09-05-23 | 614 | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$371,584.01 |
| 618 | Zócalos de granito (0.07m x 0.30m) fondo gris | 3 days | Tue 09-05-23 | Fri 12-05-23 | 617 | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$45,886.71 |
| 619 | Cerámica económica cocina | 2 days | Fri 12-05-23 | Tue 16-05-23 | 618 | Albañil de 1era,Ayuc | RD$17,938.25 |
| 620 | Cerámica económica en baños | 5 days | Tue 16-05-23 | Mon 22-05-23 | 619 | Albañil de 1era,Ayuc | RD$187,212.27 |
| 621 | | | | | | | |
| 622 | **PINTURA** | **7 days** | **Mon 29-05-23** | **Tue 06-06-23** | | | **RD$212,631.98** |
| 623 | Pintura base | 7 days | Mon 29-05-23 | Tue 06-06-23 | 631 | Ayudante de Pintor,I | RD$108,587.36 |
| 624 | Pintura acrílica interior | 7 days | Mon 29-05-23 | Tue 06-06-23 | 623FF | Ayudante de Pintor,I | RD$62,003.68 |
| 625 | Pintura acrílica exterior | 7 days | Mon 29-05-23 | Tue 06-06-23 | 624FF | Ayudante de Pintor,I | RD$42,040.94 |
| 626 | | | | | | | |

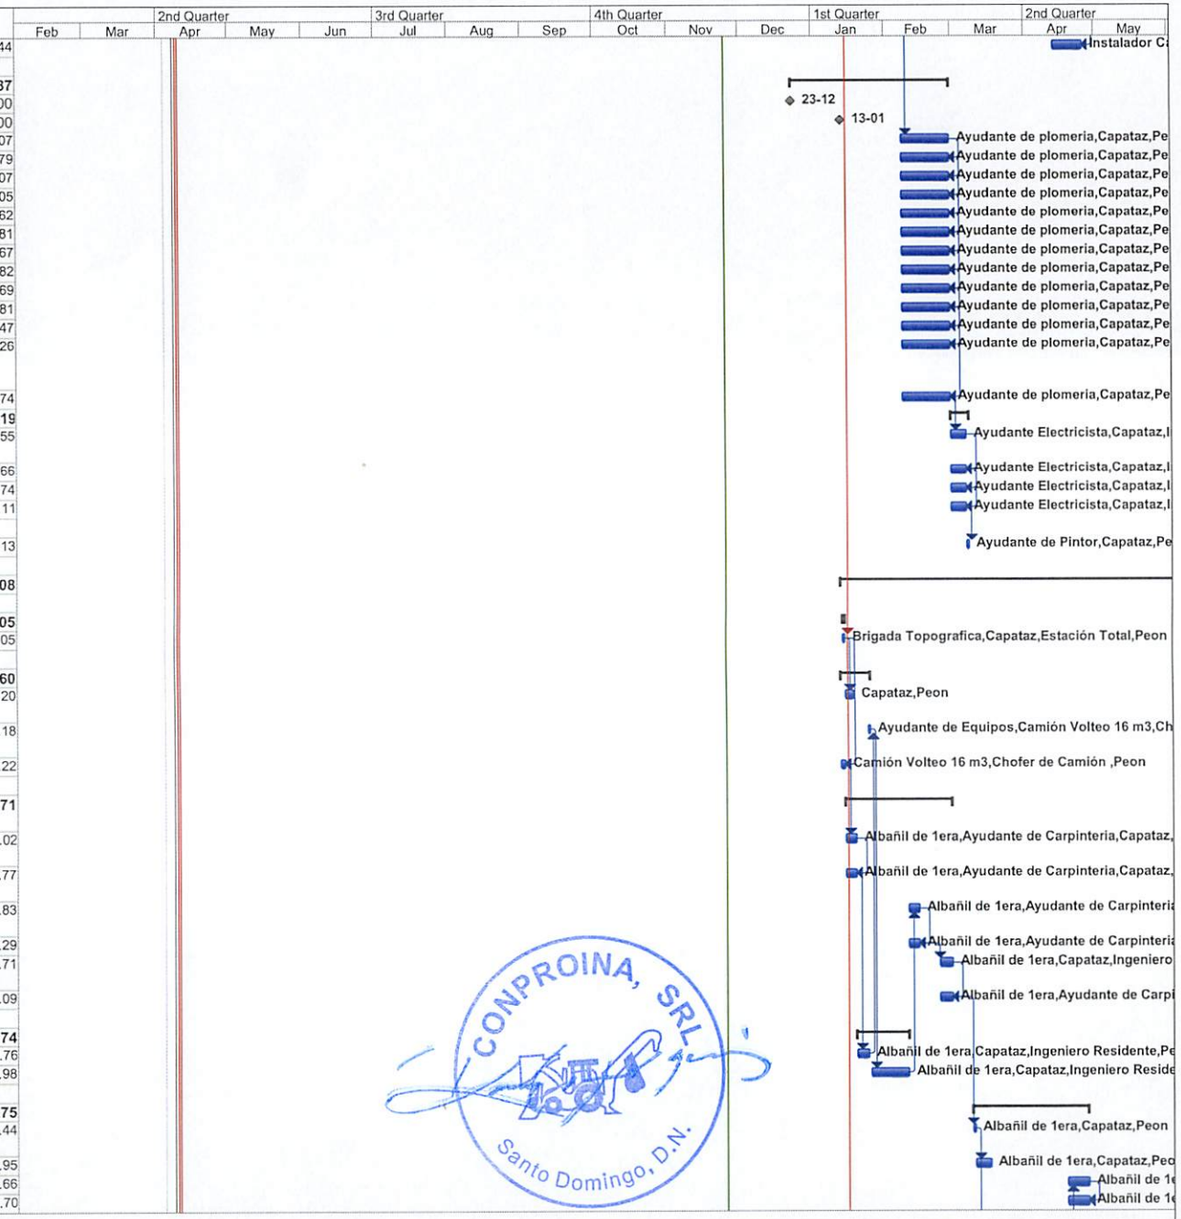Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split · Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Critical

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | **PUERTA Y VENTANAS** | **5 days** | **Mon 22-05-23** | **Mon 29-05-23** | | | **RD$117,566.55** |
| 628 | Puerta polimetálica blanca 1.20 x 2.10 | 5 days | Mon 22-05-23 | Mon 29-05-23 | 620 | Instalador Carpinteri | RD$13,423.29 |
| 629 | Puerta polimetálica blanca 1.00 x 2.10 | 5 days | Mon 22-05-23 | Mon 29-05-23 | 628FF | Instalador Carpinteri | RD$40,269.87 |
| 630 | Puerta polimetálica blanca 0.90 x 2.11 | 5 days | Mon 22-05-23 | Mon 29-05-23 | 629FF | Instalador Carpinteri | RD$26,846.58 |
| 631 | Ventana salomónica aluminio | 5 days | Mon 22-05-23 | Mon 29-05-23 | 630FF | Instalador Carpinteri | RD$37,026.81 |
| 632 | **MISCELÁNEOS** | **9 days** | **Tue 06-06-23** | **Mon 19-06-23** | | | **RD$623,257.21** |
| 633 | Suministro y colocación de particiones de baños en placa fenólicas con perfilería de anclaje en acero inoxidable. | 1 day | Tue 06-06-23 | Wed 07-06-23 | 625 | Ayudante de Herreria,Herrero,Ing Residente,Peon,Ayu de Pintor,Pintor | RD$221,089.49 |
| 634 | Suministro y colocación de barandas metálica fabricada con perfiles redondo negro de 1 1/2" (incluye pintura anticorrosiva e industrial) | 2 days | Wed 07-06-23 | Fri 09-06-23 | 633 | Ayudante de Herreria,Herrero,Ing Residente,Peon,Ayu de Pintor,Pintor | RD$239,174.61 |
| 635 | Acera de entrada y pasillo de cemento para acero a baños | 5 days | Fri 09-06-23 | Sat 17-06-23 | 634 | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$113,590.49 |
| 636 | Escalones de cemento pulido con canto reforzado | 3 days | Tue 13-06-23 | Sat 17-06-23 | 635FF | Albañil de 1era,Capataz,Peon | RD$13,367.18 |
| 637 | Tope en granito natural para cocina | 1 day | Sat 17-06-23 | Mon 19-06-23 | 636 | Capataz,Peon | RD$36,035.44 |
| 638 | | | | | | | |
| 639 | **BAÑOS PÚBLICOS (4 UD)** | **83 days** | **Fri 13-01-23** | **Sat 06-05-23** | | | **RD$10,270,677.94** |
| 640 | | | | | | | |
| 641 | Replanteo | 1 day | Fri 13-01-23 | Sat 14-01-23 | 447 | Brigada Topografica | RD$50,251.80 |
| 642 | | | | | | | |
| 643 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **7 days** | **Sat 14-01-23** | **Tue 24-01-23** | | | **RD$32,321.84** |
| 644 | Excavación material no clasificado a mano | 3 days | Sat 14-01-23 | Wed 18-01-23 | 641 | Capataz,Peon | RD$10,735.91 |
| 645 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 1 day | Mon 23-01-23 | Tue 24-01-23 | 658 | Ayudante de Equipos,Camión | RD$5,234.02 |
| 646 | Bote de material in situ | 3 days | Sat 14-01-23 | Wed 18-01-23 | 644FF | Camión Volteo 16 m | RD$16,351.91 |
| 647 | | | | | | | |
| 648 | **HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM² EN:** | **43 days** | **Wed 18-01-23** | **Fri 17-03-23** | | | **RD$2,134,234.31** |
| 649 | Zapata de muros 0.78 qq/m³ | 3 days | Wed 18-01-23 | Mon 23-01-23 | 646 | Albañil de 1era,Ayud | RD$311,189.24 |
| 650 | Viga a nivel de piso (0.15m x 0.20m) - 3.70 qq/m³ | 3 days | Wed 01-03-23 | Sat 04-03-23 | 653FS+7 days | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$197,353.46 |
| 651 | Viga dintel D1 (0.15m x 0.68m) - 2.70 qq/m³ | 3 days | Wed 01-03-23 | Sat 04-03-23 | 650FF | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$214,564.19 |
| 652 | Columna CA (0.15m x 0.30m) - 4.88 qq/m³ | 3 days | Wed 15-02-23 | Sat 18-02-23 | 660 | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$428,540.26 |
| 653 | Columna C1 (0.15m x 0.40m) - 5.02 qq/m³ | 3 days | Wed 15-02-23 | Sat 18-02-23 | 652FF | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$287,952.61 |
| 654 | Losa de techo e=0.12m - 1.22 qq/m³ | 3 days | Tue 14-03-23 | Fri 17-03-23 | 651FS+7 | Albañil de 1era,Cap | RD$641,405.27 |
| 655 | Losa de piso e=0.10m con malla electro soldada D2.3xD2.3x20x20, (Inc. Rampa de acceso) | 3 days | Tue 14-03-23 | Fri 17-03-23 | 654FF | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni Residente,Peon | RD$53,229.28 |
| 656 | | | | | | | |
| 657 | **MUROS DE BLOQUES** | **19 days** | **Thu 19-01-23** | **Wed 15-02-23** | | | **RD$1,207,835.66** |
| 658 | Bloques de 6" B.N.P. | 2 days | Thu 19-01-23 | Mon 23-01-23 | 649FF | Albañil de 1era,Cap | RD$140,104.85 |
| 659 | Bloques de 6" S.N.P. | 10 days | Mon 23-01-23 | Mon 06-02-23 | 658 | Albañil de 1era,Cap | RD$1,052,863.28 |
| 660 | Bloques calado | 7 days | Mon 06-02-23 | Wed 15-02-23 | 659 | Albañil de 1era,Cap | RD$14,867.53 |
| 661 | | | | | | | |
| 662 | **TERMINACIÓN DE SUPERFICIE** | **25 days** | **Fri 17-03-23** | **Tue 18-04-23** | | | **RD$3,512,456.47** |
| 663 | Pañete en techo | 12 days | Fri 17-03-23 | Sat 01-04-23 | 655 | Albañil de 1era,Cap | RD$166,977.84 |
| 664 | Pañete interior | 12 days | Fri 17-03-23 | Sat 01-04-23 | 663FF | Albañil de 1era,Cap | RD$292,647.55 |
| 665 | Pañete exterior y vuelos | 12 days | Fri 17-03-23 | Sat 01-04-23 | 664FF | Albañil de 1era,Cap | RD$289,979.46 |
| 666 | Cantos y mocheta | 7 days | Sat 01-04-23 | Tue 11-04-23 | 665 | Albañil de 1era,Cap | RD$135,349.50 |
| 667 | Antepecho | 3 days | Fri 17-03-23 | Tue 21-03-23 | 655 | Albañil de 1era,Cap | RD$60,600.04 |
| 668 | Fino de techo | 3 days | Tue 21-03-23 | Fri 24-03-23 | 667 | Albañil de 1era,Cap | RD$223,806.66 |
| 669 | Pintura base blanca | 1 day | Sat 01-04-23 | Mon 03-04-23 | 665 | Ayudante de Pintor, | RD$396,915.46 |
| 670 | Acrílica azul turquesa en vigas y columnas | 3 days | Mon 03-04-23 | Thu 06-04-23 | 672 | Ayudante de Pintor,Peon,Pintor | RD$396,915.46 |
| 671 | Cerámica criolla en baño (incluye paredes del en area de inodoro y lavamano h= 1.50 m.) | 5 days | Tue 21-03-23 | Tue 28-03-23 | 655FS+2 days | Albañil de 1era,Ayudante de Pizero,Capataz,Peo | RD$261,517.29 |




CONPROINA, SRL
Santo Domingo, D.N.

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split · Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Critical

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | Cerámica criolla en piso, incluye bañera | 5 days | Tue 28-03-23 | Mon 03-04-23 | 671 | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$502,430.21 |
| 673 | Suministro y colocacion de falso techo en plafon, pvc todo costos | 3 days | Thu 06-04-23 | Tue 11-04-23 | 670 | Capataz,Instalador Carpinteria | RD$507,400.39 |
| 674 | Acera perimetral 0.80 m | 3 days | Tue 11-04-23 | Fri 14-04-23 | 673 | Albañil de 1era,Cap | RD$247,840.45 |
| 675 | Escalones huella y contra huella redondeada 0.30m | 3 days | Fri 14-04-23 | Tue 18-04-23 | 674 | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$30,076.16 |
| 676 | | | | | | | |
| 677 | **INSTALACIONES SANITARIA** | **15 days** | **Mon 03-04-23** | **Tue 25-04-23** | | | **RD$2,786,152.94** |
| 678 | Inodoro completo | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 672 | Ayudante de plomer | RD$485,133.52 |
| 679 | Lavamanos blanco para empotrar incluye mezcladora | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 678FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$410,028.86 |
| 680 | Urinales | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 679FF | Ayudante de plomer | RD$238,144.97 |
| 681 | Tope en granito natural brasil, todo costo | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 680FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$450,075.04 |
| 682 | Desagüe de piso | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 681FF | Ayudante de plomer | RD$34,247.44 |
| 683 | Desagüe de techo | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 682FF | Ayudante de plomer | RD$51,368.56 |
| 684 | Cámara de inspección, según detalle | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 683FF | Ayudante de plomer | RD$79,594.69 |
| 685 | Cámara de séptica, según detalle | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 684FF | Ayudante de plomer | RD$409,603.65 |
| 686 | Zócalo | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 685FF | Ayudante de plomer | RD$68,758.83 |
| 687 | Tuberías y piezas para conexión de agua potable, ventilación y drenaje sanitario | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 686FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$42,638.69 |
| 688 | Juego accesorios dispensador de papel | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 687FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$49,271.37 |
| 689 | Juego accesorios dispensador de jabon | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 688FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$69,927.45 |
| 690 | Juego de accesorios de baño cristal y cromado | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 689FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$61,905.06 |
| 691 | Mampara de cristal templado para bañera 1.00m x 2.33m x 8mm | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 690FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$75,802.11 |
| 692 | Barra de seguridad acero inoxidable ducha/indoro 40cms | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 691FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$59,705.68 |
| 693 | Suministro e instalación tinaco 700 gls, inc. piezas, accesorios | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 692FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$136,778.59 |
| 694 | Mano de obra plomería en general | 15 days | Mon 03-04-23 | Tue 25-04-23 | 693FF | Ayudante de plomer | RD$63,168.43 |
| 695 | | | | | | | |
| 696 | **PORTAJE (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)** | **5 days** | **Tue 25-04-23** | **Wed 03-05-23** | | | **RD$486,818.00** |
| 697 | Puerta polimetal (1.00m x 2.10m) (Incluye llavín) | 5 days | Tue 25-04-23 | Wed 03-05-23 | 686 | Instalador Carpinteria | RD$105,280.71 |
| 698 | Puerta pino tratado (0.55m x 1.50m) (Incluye llavín) | 5 days | Tue 25-04-23 | Wed 03-05-23 | 697FF | Instalador Carpinteria | RD$247,620.23 |
| 699 | Puerta pino tratado (0.85m x 1.50m) (Incluye llavín) | 3 days | Thu 27-04-23 | Wed 03-05-23 | 698FF | Instalador Carpinteria | RD$133,917.06 |
| 700 | | | | | | | |
| 701 | **VENTANA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)** | **3 days** | **Wed 03-05-23** | **Sat 06-05-23** | | | **RD$55,962.18** |
| 702 | Ventana de celosías con palanca | 3 days | Wed 03-05-23 | Sat 06-05-23 | 699 | Instalador Carpinteri | RD$55,962.18 |
| 703 | | | | | | | |
| 704 | Limpieza final, incluye personal y bote | 3 days | Wed 03-05-23 | Sat 06-05-23 | 702FF | Camión Volteo 16 m | RD$4,644.74 |
| 705 | | | | | | | |
| 706 | **OFICINA ADMINISTRATIVA** | **76 days** | **Fri 13-01-23** | **Wed 26-04-23** | | | **RD$1,822,090.43** |
| 707 | | | | | | | |
| 708 | **PRELIMINARES** | **1 day** | **Fri 13-01-23** | **Sat 14-01-23** | | | **RD$9,311.88** |
| 709 | Replanteo y charrancha | 1 day | Fri 13-01-23 | Sat 14-01-23 | 447 | Brigada Topografica | RD$9,311.88 |
| 710 | | | | | | | |
| 711 | **MOVIMIENTO DE TIERRA** | **9 days** | **Sat 14-01-23** | **Fri 27-01-23** | | | **RD$8,254.08** |
| 712 | Excavación material no clasificado a mano | 3 days | Sat 14-01-23 | Wed 18-01-23 | 709 | Capataz,Peon | RD$2,426.18 |
| 713 | Relleno de reposición compactado | 1 day | Wed 25-01-23 | Fri 27-01-23 | 725 | Capataz,Peon | RD$1,098.54 |
| 714 | Bote de material in situ | 3 days | Sat 14-01-23 | Wed 18-01-23 | 712FF | Camión Volteo 16 m | RD$4,729.36 |
| 715 | | | | | | | |
| 716 | **HORMIGÓN ARMADO F'C=210 KG/CM² EN:** | **24 days** | **Wed 18-01-23** | **Mon 20-02-23** | | | **RD$408,390.39** |

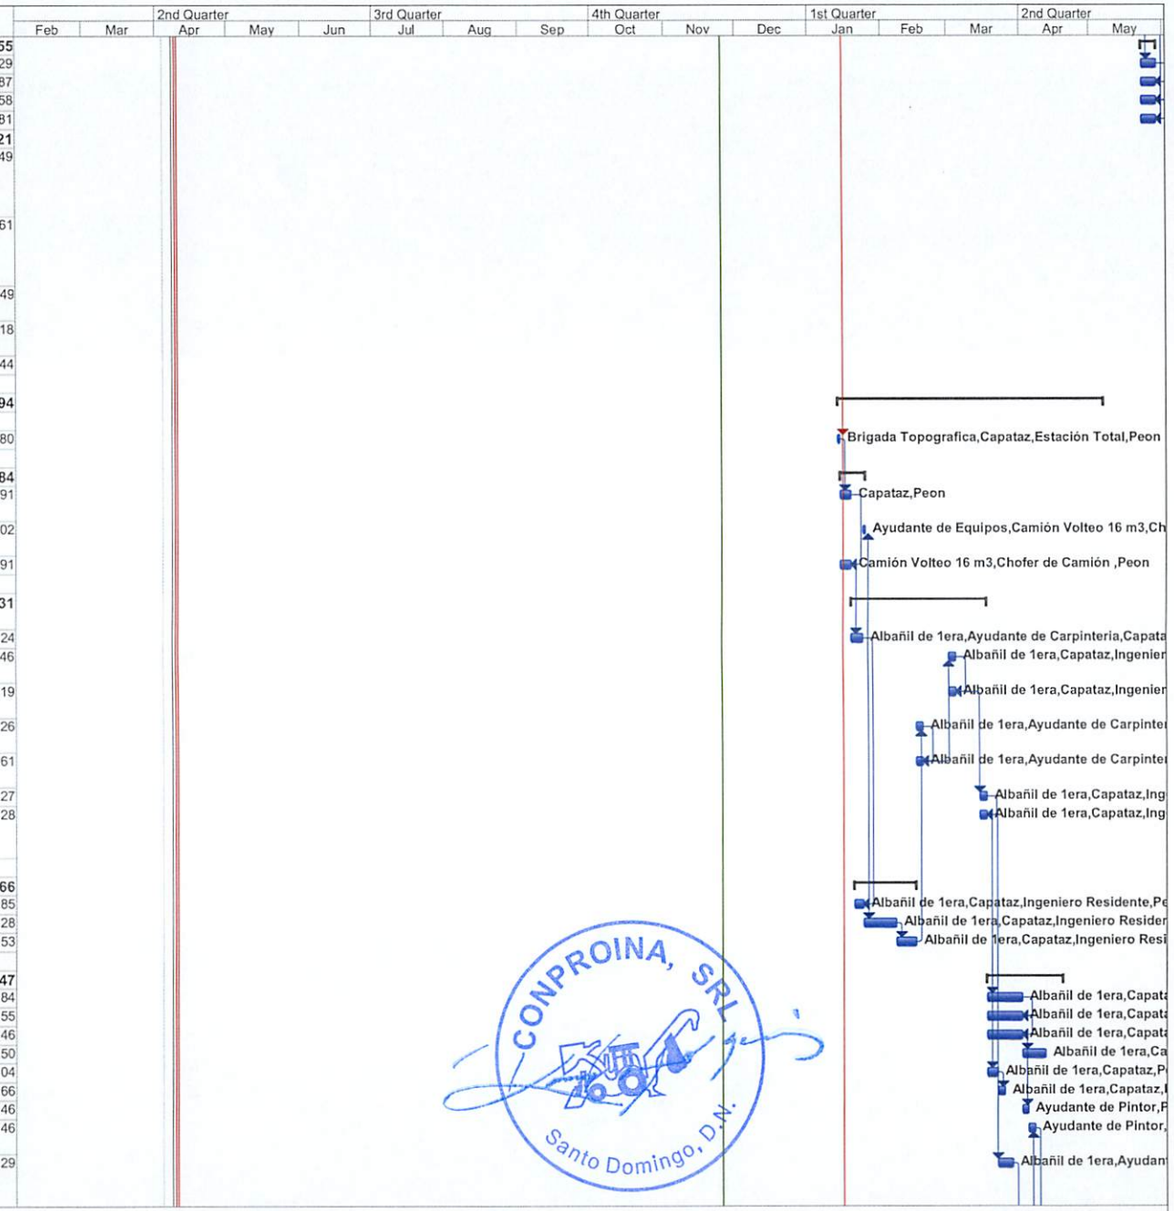


CONPROINA, SRL
Santo Domingo, D.N.

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split · Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Critical

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | Zapata de muros (0.45m x 0.30m) - 0.67 qq/m³ | 3 days | Wed 18-01-23 | Mon 23-01-23 | 714 | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$75,115.40 |
| 718 | Viga de amarre B.N.P. (0.20m x 0.20m) - 6.60 qq/m³ | 3 days | Fri 03-02-23 | Tue 07-02-23 | 719 | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni | RD$88,804.64 |
| 719 | Columna CA (0.15m x 0.30m) - 4.50 qq/m² | 3 days | Tue 31-01-23 | Fri 03-02-23 | 726 | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$58,767.58 |
| 720 | Dintel Di (0.15m x 0.30m) - 4.31 qq/m³ | 3 days | Fri 03-02-23 | Tue 07-02-23 | 718FF | | RD$66,086.37 |
| 721 | Losa de piso e=0.10m con malla electrosoldada D2.3x2.3x20x20 (Incluye rampa) | 3 days | Thu 16-02-23 | Mon 20-02-23 | 720FS+7 days | Albañil de 1era,Capataz,Ingeni Residente,Peon | RD$8,060.31 |
| 722 | Losa de techo e=0.12m - 1.80 qq/m³ | 3 days | Thu 16-02-23 | Mon 20-02-23 | 721FF | Albañil de 1era,Capa | RD$111,556.05 |
| 723 | | | | | | | |
| 724 | **MUROS DE BLOQUES** | **5 days** | **Mon 23-01-23** | **Tue 31-01-23** | | | **RD$205,896.78** |
| 725 | De 6" B.N.P. | 2 days | Mon 23-01-23 | Wed 25-01-23 | 717 | Albañil de 1era,Capa | RD$36,645.12 |
| 726 | De 6" S.N.P. | 2 days | Fri 27-01-23 | Tue 31-01-23 | 713 | Albañil de 1era,Capa | RD$169,251.66 |
| 727 | | | | | | | |
| 728 | **TERMINACIÓN DE SUPERFICIE** | **18 days** | **Thu 02-03-23** | **Fri 24-03-23** | | | **RD$352,168.37** |
| 729 | Fraguache | 2 days | Tue 07-03-23 | Thu 09-03-23 | 735FS+1 | Albañil de 1era,Capa | RD$33,129.08 |
| 730 | Pañete interior | 5 days | Thu 09-03-23 | Thu 16-03-23 | 729 | Albañil de 1era,Capa | RD$101,268.14 |
| 731 | Pañete exterior | 5 days | Thu 09-03-23 | Thu 16-03-23 | 730FF | Albañil de 1era,Capa | RD$47,337.57 |
| 732 | Cantos | 3 days | Thu 16-03-23 | Mon 20-03-23 | 731 | Albañil de 1era,Capa | RD$15,263.69 |
| 733 | Pintura base | 2 days | Mon 20-03-23 | Wed 22-03-23 | 732 | Ayudante de Pintor,I | RD$55,205.30 |
| 734 | Pintura acrílica | 2 days | Wed 22-03-23 | Fri 24-03-23 | 733 | Ayudante de Pintor,I | RD$55,208.57 |
| 735 | Antepecho | 2 days | Thu 02-03-23 | Sat 04-03-23 | 722FS+7 | Peon,Albañil de 1era | RD$15,222.49 |
| 736 | Fino de techo | 1 day | Sat 04-03-23 | Mon 06-03-23 | 735 | Peon,Albañil de 1era | RD$29,533.53 |
| 737 | | | | | | | |
| 738 | **INSTALACIONES SANITARIAS** | **12 days** | **Mon 03-04-23** | **Tue 18-04-23** | | | **RD$298,648.50** |
| 739 | Inodoro | 12 days | Mon 03-04-23 | Tue 18-04-23 | 760 | Ayudante de plomer | RD$20,213.90 |
| 740 | Lavamanos | 12 days | Mon 03-04-23 | Tue 18-04-23 | 739FF | Ayudante de plomer | RD$17,084.54 |
| 741 | Desagüe de piso 2" parrilla acero inoxidable | 12 days | Mon 03-04-23 | Tue 18-04-23 | 740FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$2,140.47 |
| 742 | Fregadero acero inoxidable doble | 12 days | Mon 03-04-23 | Tue 18-04-23 | 741FF | Ayudante de plomer | RD$19,740.77 |
| 743 | Trampa de grasa (1.00m x 1.00m x 1.00m) | 12 days | Mon 03-04-23 | Tue 18-04-23 | 742FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$15,288.65 |
| 744 | Cámara séptica (1.00m x 2.40m x 1.00m) | 12 days | Mon 03-04-23 | Tue 18-04-23 | 743FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$102,400.91 |
| 745 | Registro de inspección (0.60m x 0.60m x 0.75m) | 12 days | Mon 03-04-23 | Tue 18-04-23 | 744FF | Ayudante de plomeria,Peon,Plom | RD$15,972.14 |
| 746 | Tubería y piezas de agua potable | 12 days | Mon 03-04-23 | Tue 18-04-23 | 745FF | Ayudante de plomer | RD$18,950.53 |
| 747 | Tubería y piezas de agua residuales | 12 days | Mon 03-04-23 | Tue 18-04-23 | 746FF | Ayudante de plomer | RD$23,688.16 |
| 748 | Mano de obra de plomero | 12 days | Mon 03-04-23 | Tue 18-04-23 | 747FF | Ayudante de plomer | RD$63,168.43 |
| 749 | | | | | | | |
| 750 | **PISOS** | **5 days** | **Wed 22-03-23** | **Wed 29-03-23** | | | **RD$195,564.83** |
| 751 | Piso de granito (0.30m x 0.30m) fondo gris | 5 days | Wed 22-03-23 | Wed 29-03-23 | 733 | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$153,864.72 |
| 752 | Zócalos de granito (0.07m x 0.30m) fondo gris | 3 days | Fri 24-03-23 | Wed 29-03-23 | 751FF | Albañil de 1era,Ayudante de | RD$41,700.11 |
| 753 | | | | | | | |
| 754 | **PUERTA Y VENTANAS** | **4 days** | **Wed 29-03-23** | **Mon 03-04-23** | | | **RD$107,030.85** |
| 755 | Puerta polimetálica (1.00m x 2.10m) (Incluye llavín) | 4 days | Wed 29-03-23 | Mon 03-04-23 | 752 | Instalador Carpinteria | RD$13,160.09 |
| 756 | Puerta polimetálica (0.85m x 2.10m) (Incluye llavín) | 4 days | Wed 29-03-23 | Mon 03-04-23 | 755FF | Instalador Carpinteria | RD$40,269.87 |
| 757 | Puerta polimetálica (0.75m x 2.10m) (Incluye llavín) | 4 days | Wed 29-03-23 | Mon 03-04-23 | 756FF | Instalador Carpinteria | RD$13,423.29 |
| 758 | Ventana corrediza de cristal y aluminio (1.20m x 1.00m) | 4 days | Wed 29-03-23 | Mon 03-04-23 | 757FF | Instalador Carpinteria | RD$33,579.59 |
| 759 | Ventana corrediza de cristal y aluminio (1.00m x 1.00m) | 4 days | Wed 29-03-23 | Mon 03-04-23 | 758FF | Instalador Carpinteria | RD$5,202.11 |
| 760 | Ventana corrediza de cristal y aluminio (0.60m x 0.50m) | 4 days | Wed 29-03-23 | Mon 03-04-23 | 759FF | Instalador Carpinteria | RD$1,395.90 |
| 761 | | | | | | | |
| 762 | **MOBILIARIO** | **2 days** | **Tue 18-04-23** | **Mon 24-04-23** | | | **RD$157,901.25** |
| 763 | Escritorio tope melanina con estructura plateada (28" x 48") | 2 days | Tue 18-04-23 | Mon 24-04-23 | 748 | Capataz,Ingeniero Residente,Peon | RD$40,791.63 |

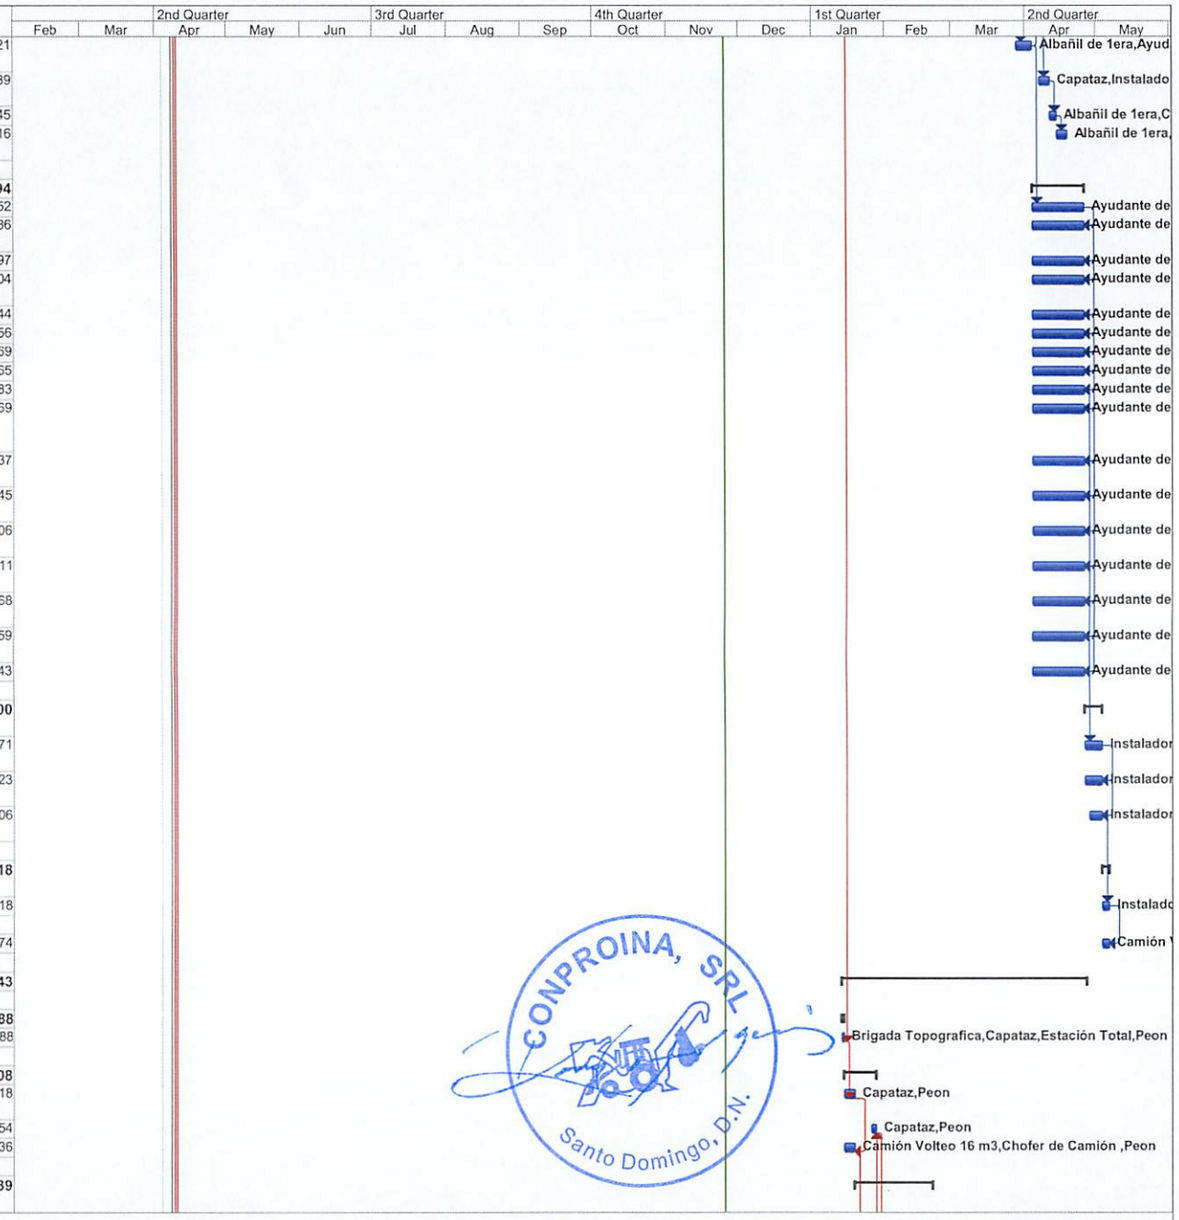


CONPROINA, SRL
Santo Domingo, D.N.

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

Critical Split · Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Progreso · Critical

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | Silla operativa en tela con brazos | 2 days | Tue 18-04-23 | Mon 24-04-23 | 763FF | Capataz,Ingeniero F | RD$33,655.46 |
| 765 | Silla de visita en tela negro con brazos | 2 days | Tue 18-04-23 | Mon 24-04-23 | 764FF | Capataz,Ingeniero F | RD$56,298.55 |
| 766 | Archivo metálico tipo módulo color aluminio de tres gavetas con ruedas | 2 days | Tue 18-04-23 | Mon 24-04-23 | 765FF | Capataz,Ingeniero Residente,Peon | RD$27,155.61 |
| 767 | | | | | | | |
| 768 | **MISCELANEOS** | **2 days** | **Mon 24-04-23** | **Wed 26-04-23** | | | **RD$78,923.50** |
| 769 | Suministro y colocación de barandas en acero inoxidable en entrada | 2 days | Mon 24-04-23 | Wed 26-04-23 | 766 | Ayudante de Herreria,Herrero,Ing | RD$10,847.13 |
| 770 | Tope en granito natural para cocina | 2 days | Mon 24-04-23 | Wed 26-04-23 | 769FF | | RD$18,532.50 |
| 771 | Letrero de Oficina Administrativa en acrílico (0.85m x 0.45m) (Suministro y colocación) | 2 days | Mon 24-04-23 | Wed 26-04-23 | 770FF | Ayudante de Herreria,Herrero,Ing Residente,Peon | RD$10,063.60 |
| 772 | Logo y Letrero de INAPA | 2 days | Mon 24-04-23 | Wed 26-04-23 | 771FF | Albañil de 1era,Ayuc | RD$39,480.27 |
| 773 | | | | | | | |
| 774 | **ELECTRIFICACIÓN GENERAL** | **43 days** | **Wed 26-04-23** | **Thu 22-06-23** | | | **RD$6,020,434.94** |
| 775 | | | | | | | |
| 776 | **ILUMINACIÓN DE CANCHAS DE BASKETBALL Y VOLEYBALL** | **10 days** | **Wed 26-04-23** | **Wed 10-05-23** | | | **RD$3,141,793.17** |
| 777 | Reflector LED de 150 Watts, 100-240 Volts, 60 HZ, 52,000 LM, IP 65 | 10 days | Wed 26-04-23 | Wed 10-05-23 | 772 | Ayudante Electricista,Capataz | RD$743,157.96 |
| 778 | Poste H.A.V 30', 300 DAM | 10 days | Wed 26-04-23 | Wed 10-05-23 | 777FF | Ayudante Electricist | RD$681,228.13 |
| 779 | Conductor eléctrico de goma No. 6/3 para alimentación de reflectores | 10 days | Wed 26-04-23 | Wed 10-05-23 | 778FF | Ayudante Electricista,Capataz | RD$1,290,308.01 |
| 780 | Salidas Panel de Breakers 2/4 Circuitos para el encendido de reflectores a instalar en poste | 10 days | Wed 26-04-23 | Wed 10-05-23 | 779FF | Ayudante Electricista,Capataz Electrico,Ingeniero | RD$44,211.71 |
| 781 | Tubería PVC de Ø3/4" x 19' | 10 days | Wed 26-04-23 | Wed 10-05-23 | 780FF | Ayudante Electricist | RD$96,461.90 |
| 782 | Instalación de postes | 10 days | Wed 26-04-23 | Wed 10-05-23 | 781FF | Ayudante Electricist | RD$216,754.40 |
| 783 | Mano de obra eléctrica | 10 days | Wed 26-04-23 | Wed 10-05-23 | 782FF | Ayudante Electricist | RD$69,671.06 |
| 784 | | | | | | | |
| 785 | **ELECTRIFICACIÓN DE GAZEBOS** | **7 days** | **Wed 10-05-23** | **Fri 19-05-23** | | | **RD$485,575.08** |
| 786 | Reflector LED tipo campana de 80 Watts, 100-240 Volts, 60 HZ | 7 days | Wed 10-05-23 | Fri 19-05-23 | 783 | Ayudante Electricista,Capataz | RD$65,026.32 |
| 787 | Salidas eléctricas para tomacorrientes dobles 120V | 7 days | Wed 10-05-23 | Fri 19-05-23 | 786FF | Ayudante Electricista,Capataz | RD$79,257.80 |
| 788 | Salidas eléctricas para reflector LED en tubería EMT | 7 days | Wed 10-05-23 | Fri 19-05-23 | 787FF | Ayudante Electricista,Capataz | RD$49,982.95 |
| 789 | Conductor eléctrico de goma No. 8/3 para alimentación de reflectores | 7 days | Wed 10-05-23 | Fri 19-05-23 | 788FF | Ayudante Electricista,Capataz | RD$178,667.56 |
| 790 | Tubería PVC de Ø3/4" x 19' | 7 days | Wed 10-05-23 | Fri 19-05-23 | 789FF | Ayudante Electricist | RD$42,969.39 |
| 791 | Mano de obra eléctrica | 7 days | Wed 10-05-23 | Fri 19-05-23 | 790FF | Ayudante Electricist | RD$69,671.06 |
| 792 | | | | | | | |
| 793 | **ELECTRIFICACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS** | **7 days** | **Fri 19-05-23** | **Mon 29-05-23** | | | **RD$308,275.62** |
| 794 | Salidas cenitales | 7 days | Fri 19-05-23 | Mon 29-05-23 | 791 | Ayudante Electricist | RD$70,860.11 |
| 795 | Salidas para tomacorrientes dobles 120V | 7 days | Fri 19-05-23 | Mon 29-05-23 | 794FF | Ayudante Electricista,Capataz | RD$36,326.49 |
| 796 | Conductor eléctrico THW No.10 | 7 days | Fri 19-05-23 | Mon 29-05-23 | 795FF | Ayudante Electricist | RD$42,037.24 |
| 797 | Salidas Panel de Breakers 4/8 circuitos | 7 days | Fri 19-05-23 | Mon 29-05-23 | 796FF | Ayudante Electricista,Capataz | RD$55,749.85 |
| 798 | Salida interruptor sencillo | 7 days | Fri 19-05-23 | Mon 29-05-23 | 797FF | Ayudante Electricist | RD$33,630.87 |
| 799 | Mano de obra eléctrica | 7 days | Fri 19-05-23 | Mon 29-05-23 | 798FF | Ayudante Electricist | RD$69,671.06 |
| 800 | | | | | | | |
| 801 | **ELECTRIFICACIÓN OFICINA ADMINISTRATIVA** | **12 days** | **Mon 29-05-23** | **Tue 13-06-23** | | | **RD$236,501.49** |
| 802 | Salidas cenitales | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 799 | Ayudante Electricist | RD$23,620.04 |
| 803 | Salidas para tomacorrientes dobles 120V | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 802FF | Ayudante Electricista,Capataz | RD$39,628.90 |
| 804 | Salida interruptor sencillo | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 803FF | Ayudante Electricist | RD$9,172.06 |
| 805 | Salida interruptor doble | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 804FF | Ayudante Electricist | RD$3,090.30 |
| 806 | Salida interruptor triple | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 805FF | Ayudante Electricist | RD$2,915.22 |
| 807 | Salidas para tomacorrientes dobles 120V | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 806FF | Ayudante Electricista,Capataz | RD$6,604.82 |
| 808 | Salidas Panel de Breakers 6/12 circuitos | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 807FF | Ayudante Electricista,Capataz | RD$14,317.87 |

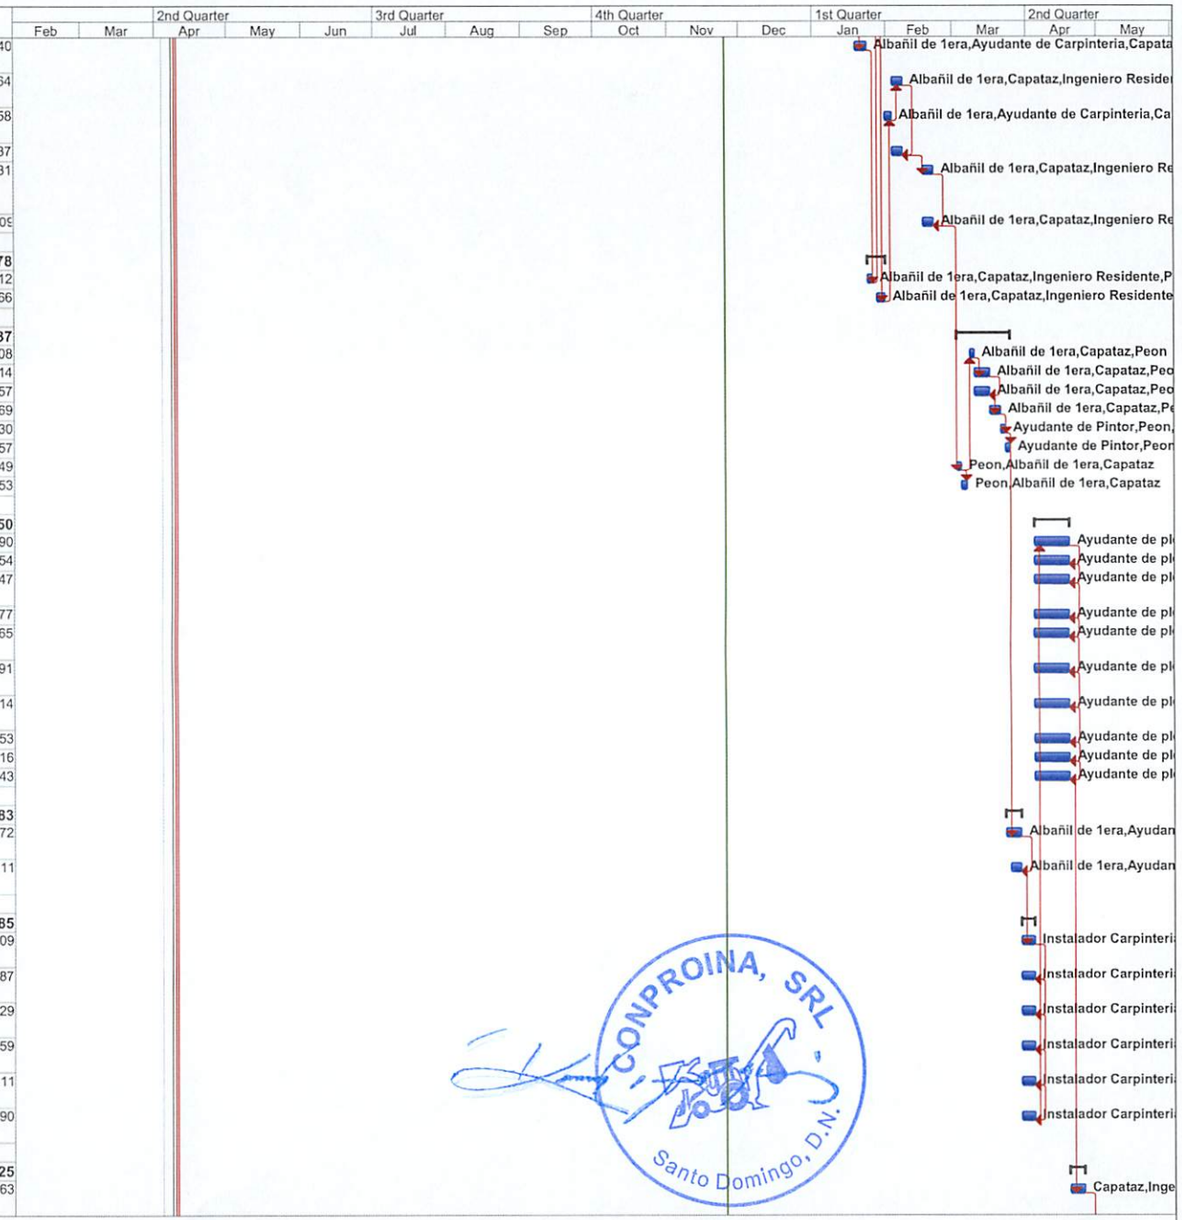


CONPROINA, SRL
Santo Domingo, D.N.

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical Split | Hito | Tareas externas | Hito inactivo | Sólo duración | Sólo el comienzo | Progreso |
| Tarea | Resumen | Hito externo | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | Sólo fin | Critical |
| División | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Fecha límite | |

| ID | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish | Predeces | Resource Names | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | Registro metálico N-1R, 6" X 6" X 4" | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 808FF | Ayudante Electricist | RD$1,527.50 |
| 810 | Registro metálico N-1R, 12" X 12" X 6" | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 809FF | Ayudante Electricist | RD$1,809.90 |
| 811 | Conductor eléctrico THW No.8 | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 810FF | Ayudante Electricist | RD$30,190.79 |
| 812 | Conductor eléctrico THW No.10 | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 811FF | | RD$33,953.03 |
| 813 | Mano de obra eléctrica | 12 days | Mon 29-05-23 | Tue 13-06-23 | 812FF | Ayudante Electricist | RD$69,671.06 |
| 814 | **ELECTRIFICACIÓN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES** | **7 days** | **Tue 13-06-23** | **Thu 22-06-23** | | | **RD$1,848,289.58** |
| 815 | Reflector LED de 150 Watts, 100-240 Volts, 60 HZ, 52,000 LM, IP 65 | 7 days | Tue 13-06-23 | Thu 22-06-23 | 813 | Capataz,Ingeniero Electrico,Ingeniero | RD$371,578.98 |
| 816 | Poste H.A.V 30', 300 DAM | 7 days | Tue 13-06-23 | Thu 22-06-23 | 815FF | Capataz,Ingeniero E | RD$340,614.06 |
| 817 | Conductor eléctrico de goma No. 6/3 | 7 days | Tue 13-06-23 | Thu 22-06-23 | 816FF | Capataz,Ingeniero E | RD$817,195.07 |
| 818 | Tubería PVC de Ø3/4" x 19' | 7 days | Tue 13-06-23 | Thu 22-06-23 | 817FF | Capataz,Ingeniero E | RD$78,923.38 |
| 819 | Instalación de postes | 7 days | Tue 13-06-23 | Thu 22-06-23 | 818FF | Capataz,Ingeniero E | RD$108,377.20 |
| 820 | Mano de obra eléctrica | 7 days | Tue 13-06-23 | Thu 22-06-23 | 819FF | Capataz,Ingeniero E | RD$131,600.89 |
| 821 | | | | | | | |
| 822 | **VARIOS** | **5 days** | **Mon 04-04-22** | **Fri 08-04-22** | | | **RD$3,194,489.81** |
| 823 | Valla anunciando obra 16' x 8' impresión Full Color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. estructura en tubos galvanizados 1.1/2" x 1.1/2" y soportes en tubo cuadrado 4" x 4". | 1 day | Mon 04-04-22 | Mon 04-04-22 | 2 | Ayudante de Herreria,Capataz,He | RD$575,947.42 |
| 824 | Campamento (Incluye oficinas, almacenes, talleres y unidades baños móviles). Sujeto a aprobación de la Supervisión | 3 days | Mon 04-04-22 | Wed 06-04-22 | 2 | Capataz,Ingeniero Electrico,Ingeniero Residente,Peon | RD$2,180,388.84 |
| 825 | Limpieza final y continua | 1 day | Fri 08-04-22 | Fri 08-04-22 | 56 | Capataz,Peon | RD$438,153.55 |

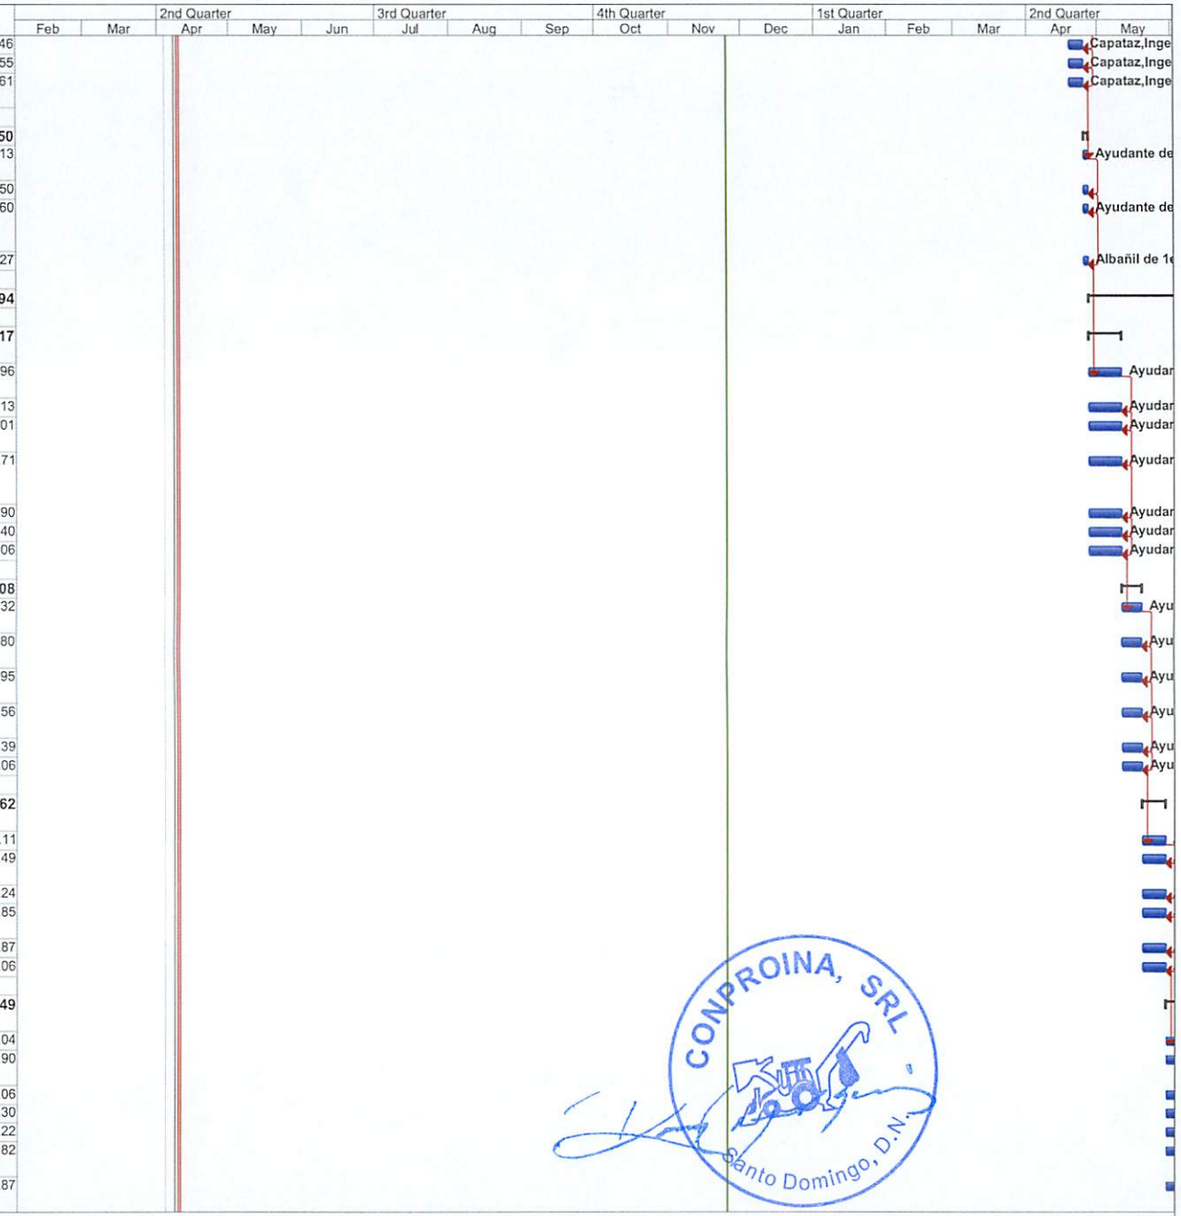CONPROINA, SRL
Santo Domingo, D.N.

Proyecto: msproj11
Fecha: Fri 25-11-22

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical Split | Hito | Tareas externas | Hito inactivo | Sólo duración | Sólo el comienzo | Progreso |
| Tarea | Resumen | Hito externo | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | Sólo fin | Critical |
| División | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Fecha límite | |
