AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURISTICAS, MUNICIPIO DE MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI
INAPA-CCC-LPN-2021-0051

Días Habiles: 347 días
Días Calendarios: 430 días ≈ 14 meses

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**1**	**AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, MUNICIPIO MICHES**	**229.75 días**	**mar 03 may '22**	**lun 13 feb '23**	
2	**1.1**	**INICIO**	**6 días**	**mar 03 may '22**	**mar 10 may '22**	
3	1.1.1	Acta de Inicio de Obra	1 día	mar 03 may '22	mar 03 may '22	
4	1.1.2	Movilización e instalación	5 días	mié 04 may '22	mar 10 may '22	3
5	**1.2**	**A - OBRA DE TOMA RÍO YEGUADA**	**223.75 días**	**mar 10 may '22**	**lun 13 feb '23**	
6	**1.2.1**	**DIQUE CAUCACIANO**	**223.75 días**	**mar 10 may '22**	**lun 13 feb '23**	
7	**1.2.1.1**	**Preliminares**	**5 días**	**mar 10 may '22**	**lun 16 may '22**	
8	1.2.1.1.1	Replanteo y control topográfico	5 días	mar 10 may '22	lun 16 may '22	4
9	**1.2.1.2**	**Ataguía**	**12 días**	**lun 25 jul '22**	**lun 08 ago '22**	
10	1.2.1.2.1	Encausamiento, desvío de río y construcción ataguía	12 días	lun 25 jul '22	lun 08 ago '22	
11	**1.2.1.3**	**Reforzamiento en ataguía**	**9.13 días**	**mar 26 jul '22**	**vie 05 ago '22**	
12	1.2.1.3.1	Refuerzo con muros de sacos	8 días	mar 26 jul '22	jue 04 ago '22	10CC+1 día
13	1.2.1.3.2	Extracción de muros de sacos	3 días	mar 02 ago '22	vie 05 ago '22	84CF
14	**1.2.1.4**	**Movimiento de tierra para dique, cuenco, muros y tuberías**	**100.25 días**	**jue 04 ago '22**	**mié 07 dic '22**	
15	**1.2.1.4.1**	**Excavación**	**100.25 días**	**jue 04 ago '22**	**mié 07 dic '22**	
16	1.2.1.4.1.1	Excavación material granular en presencia de agua con equipo	15 días	jue 04 ago '22	mar 23 ago '22	12
17	1.2.1.4.1.2	Relleno material producto de la excavación	7 días	mar 22 nov '22	mié 30 nov '22	27
18	1.2.1.4.1.3	Bote de material in situ	5 días	jue 01 dic '22	mié 07 dic '22	17
19	**1.2.1.5**	**Hormigón Armado**	**105 días**	**mar 13 sep '22**	**sáb 21 ene '23**	
20	1.2.1.5.1	Cimacio	35 días	lun 28 nov '22	mar 10 ene '23	25
21	1.2.1.5.2	Zapata de muro MC1	8 días	mar 13 sep '22	vie 23 sep '22	16,33
22	1.2.1.5.3	Losa de fundación	5 días	vie 23 sep '22	jue 29 sep '22	21
23	1.2.1.5.4	Losa de fondo	5 días	jue 29 sep '22	mié 05 oct '22	22
24	1.2.1.5.5	Losa de fondo inclinada	8 días	jue 06 oct '22	sáb 15 oct '22	23
25	1.2.1.5.6	Viga	4 días	mar 22 nov '22	sáb 26 nov '22	27
26	1.2.1.5.7	Vertedor	5 días	mar 10 ene '23	lun 16 ene '23	20
27	1.2.1.5.8	Muros	30 días	sáb 15 oct '22	mar 22 nov '22	24
28	1.2.1.5.9	Losa de techo desarenador	5 días	lun 16 ene '23	sáb 21 ene '23	26
29	**1.2.1.6**	**Terminación de Superficie**	**17 días**	**lun 23 ene '23**	**lun 13 feb '23**	
30	1.2.1.6.1	Pañete	15 días	lun 23 ene '23	jue 09 feb '23	28
31	1.2.1.6.2	Fino pulido losa de fondo	2 días	jue 09 feb '23	lun 13 feb '23	30
32	**1.2.1.7**	**Muro de Gaviones**	**30 días**	**lun 08 ago '22**	**mar 13 sep '22**	
33	1.2.1.7.1	Corchoneta de gaviones	30 días	lun 08 ago '22	mar 13 sep '22	
34	1.2.1.8	Suministro y colocación de válvulas y piezas especiales	5 días	mar 24 ene '23	lun 30 ene '23	
35	1.2.1.9	Suministro y colocación de tuberias de 12" y 16"	5 días	lun 30 ene '23	sáb 04 feb '23	34
36	**1.3**	**B- LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE ARROYO SANTIAGO HASTA ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO YEGUADA**	**16 días**	**mié 20 jul '22**	**mar 09 ago '22**	
37	**1.3.1**	**Preliminares**	**1 día**	**mié 20 jul '22**	**mié 20 jul '22**	
38	1.3.1.1	Replanteo para tubería	1 día	mié 20 jul '22	mié 20 jul '22	
39	**1.3.2**	**Movimiento de tierra**	**12 días**	**jue 21 jul '22**	**jue 04 ago '22**	
40	1.3.2.1	Excavación	3 días	jue 21 jul '22	lun 25 jul '22	38
41	1.3.2.2	Asiento de arena	1 día	lun 25 jul '22	mar 26 jul '22	40
42	1.3.2.3	Relleno Compactado	5 días	jue 28 jul '22	mié 03 ago '22	44
43	1.3.2.4	Bote de material con camión	1 día	mié 03 ago '22	jue 04 ago '22	42
44	1.3.3	Suministro y colocación de tuberías y accesorios	2 días	mar 26 jul '22	jue 28 jul '22	41
45	1.3.4	Pruebas hidrostáticas en tuberías	1 día	mié 03 ago '22	jue 04 ago '22	42

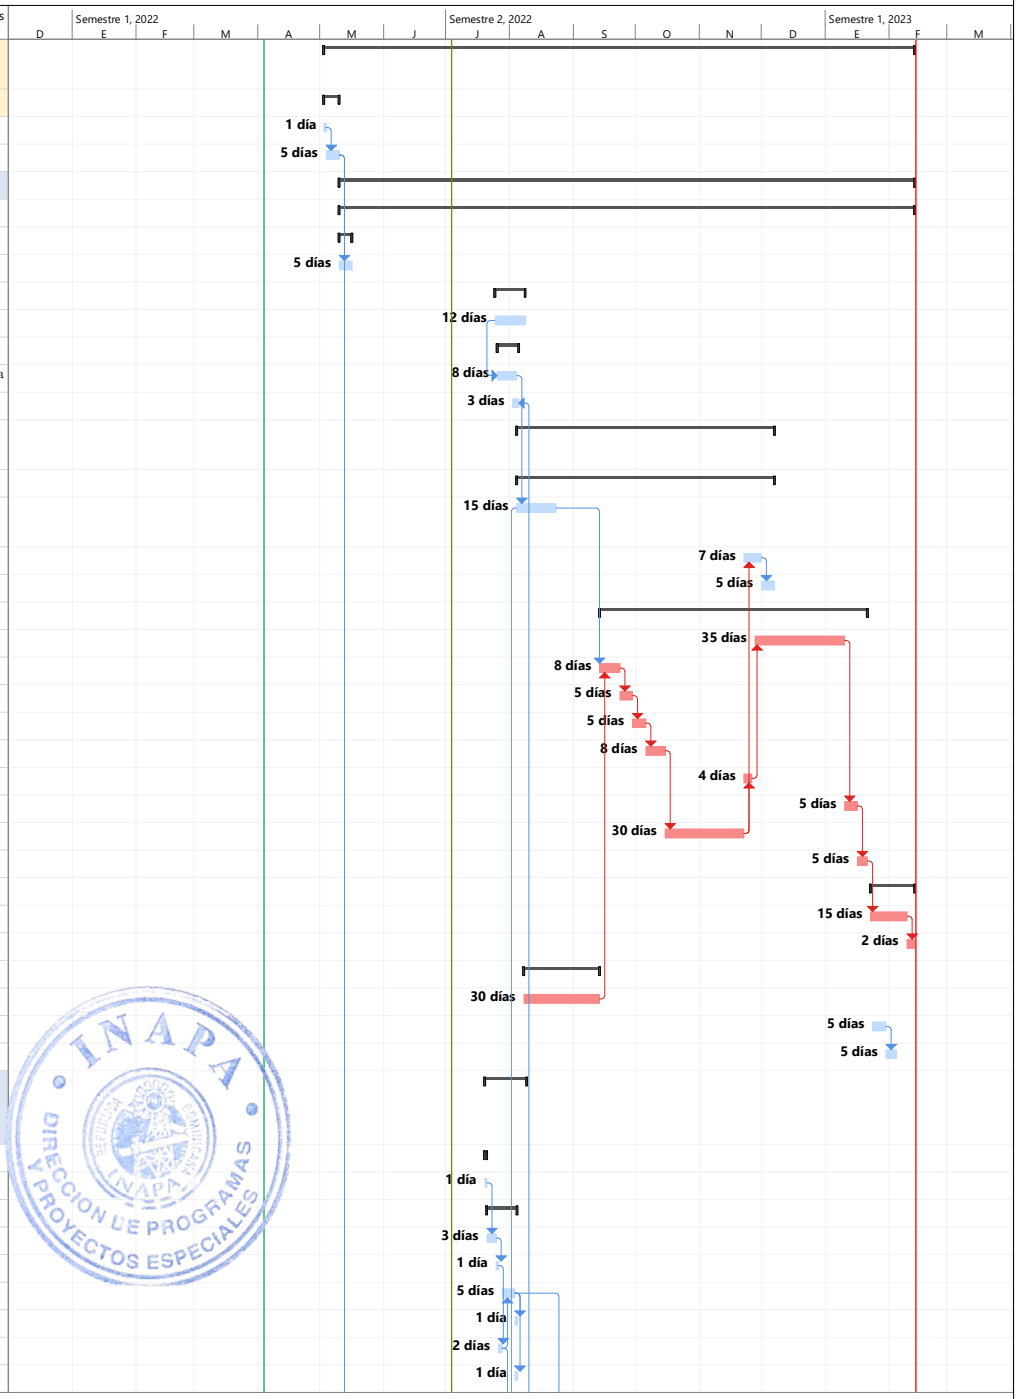

INAPA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

Comienzo Proyecto: lun 04 abr '22
Fin Proyecto: lun 13 feb '23

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURISTICAS, MUNICIPIO DE MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI
INAPA-CCC-LPN-2021-0051

Días Habiles: 347 días
Días Calendarios: 430 días ≈ 14 meses

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
46	1.3.5	Suministro y colocación de válvulas	1 día	jue 28 jul '22	vie 29 jul '22	44
47	1.3.6	Construcción de Registros	8 días	vie 29 jul '22	mar 09 ago '22	46
48	**1.4**	**C- CÁRCAMO DE BOMBEO RÍO YEGUADA**	**104 días**	**jue 25 ago '22**	**lun 02 ene '23**	
49	1.4.1	Replanteo y control topográfico	1 día	jue 25 ago '22	jue 25 ago '22	42
50	**1.4.2**	**Movimiento de Tierra**	**43 días**	**vie 26 ago '22**	**mar 18 oct '22**	
51	1.4.2.1	Excavación en tosca con equipo	5 días	vie 26 ago '22	jue 01 sep '22	49
52	1.4.2.2	Compactación de relleno	2 días	vie 14 oct '22	lun 17 oct '22	57
53	1.4.2.3	Bote de material con camión	1 día	mar 18 oct '22	mar 18 oct '22	52
54	**1.4.3**	**Hormigón Armado**	**56 días**	**jue 01 sep '22**	**jue 10 nov '22**	
55	1.4.3.1	Losa de fondo	6 días	mié 07 sep '22	jue 15 sep '22	56
56	1.4.3.2	Zapata de muro	5 días	jue 01 sep '22	mié 07 sep '22	51
57	1.4.3.3	Muros	30 días	mié 07 sep '22	vie 14 oct '22	56
58	1.4.3.4	Losa de entrepiso	10 días	vie 14 oct '22	jue 27 oct '22	57
59	1.4.3.5	Zapata de columna	3 días	mar 18 oct '22	jue 20 oct '22	52
60	1.4.3.6	Zapata de muro de mampostería	3 días	mar 18 oct '22	jue 20 oct '22	59CC
61	1.4.3.7	Columna	5 días	sáb 22 oct '22	vie 28 oct '22	66FF
62	1.4.3.8	Viga	3 días	vie 28 oct '22	mar 01 nov '22	61
63	1.4.3.9	Losa de techo	7 días	mar 01 nov '22	jue 10 nov '22	62
64	**1.4.4**	**Muros de Block**	**6 días**	**vie 21 oct '22**	**vie 28 oct '22**	
65	1.4.4.1	Muros de block de Ø6 " BNP	2 días	vie 21 oct '22	lun 24 oct '22	60
66	1.4.4.2	Muros de block de ø 6 " SNP	4 días	lun 24 oct '22	vie 28 oct '22	65
67	**1.4.5**	**Terminación de Superficie**	**23 días**	**mar 15 nov '22**	**mar 13 dic '22**	
68	1.4.5.1	Fino pulido losa de fondo	2 días	lun 28 nov '22	mié 30 nov '22	69
69	1.4.5.2	Pañete	10 días	mar 15 nov '22	lun 28 nov '22	63FC+4 días
70	1.4.5.3	Fino losa de techo	2 días	mié 30 nov '22	vie 02 dic '22	68
71	1.4.5.4	Base fresh cement interior y exterior	3 días	mar 06 dic '22	vie 09 dic '22	73
72	1.4.5.5	Pintura acrílica	3 días	vie 09 dic '22	mar 13 dic '22	71
73	1.4.6	Acera perimetral	3 días	vie 02 dic '22	mar 06 dic '22	70
74	1.4.7	Suministro y colocación de puertas y ventanas	1 día	mié 14 dic '22	mié 14 dic '22	72
75	**1.4.8**	**Equipamiento a estación de bombeo**	**28 días**	**lun 28 nov '22**	**lun 02 ene '23**	
76	1.4.8.1	Electrificación primaria	10 días	lun 28 nov '22	vie 09 dic '22	69
77	1.4.8.2	Electrificación secundaria	6 días	vie 09 dic '22	vie 16 dic '22	76
78	1.4.8.3	Iluminación exterior	4 días	sáb 17 dic '22	jue 22 dic '22	77
79	1.4.8.4	Equipos de bombeo	6 días	jue 22 dic '22	jue 29 dic '22	78
80	1.4.8.5	Suministro e instalación de generador eléctrico	2 días	jue 29 dic '22	lun 02 ene '23	79
81	**1.5**	**D-CAMINO ACCESO A ESTACIÓN DE BOMBEO RÍO YEGUADA**	**71 días**	**sáb 30 jul '22**	**mié 26 oct '22**	
82	1.5.1	Topografía	5 días	sáb 30 jul '22	vie 05 ago '22	
83	**1.5.2**	**Movimiento de tierrra alta pendiente**	**25.5 días**	**mar 02 ago '22**	**jue 01 sep '22**	
84	1.5.2.1	Corte de material no clasificado c/equipo	15 días	vie 05 ago '22	mié 24 ago '22	82
85	1.5.2.2	Relleno con material de corte	7 días	mié 24 ago '22	jue 01 sep '22	84
86	1.5.2.3	Bote material sobrante	5 días	mar 02 ago '22	lun 08 ago '22	
87	**1.5.3**	**Relleno para conformar la rasante del camino**	**52 días**	**mar 02 ago '22**	**mié 05 oct '22**	
88	1.5.3.1	Relleno compactado con material de mina	10 días	mar 02 ago '22	sáb 13 ago '22	
89	1.5.3.2	Conformación de cunetas	7 días	sáb 13 ago '22	mar 23 ago '22	88
90	1.5.3.3	Encache de cunetas	35 días	mar 23 ago '22	mié 05 oct '22	89
91	**1.5.4**	**Pavimentación**	**16.88 días**	**jue 06 oct '22**	**mié 26 oct '22**	
92	1.5.4.1	Riego de imprimación con gravilla	7 días	jue 06 oct '22	vie 14 oct '22	89
93	1.5.4.2	Suministro y colocación de asfalto	3 días	lun 24 oct '22	mié 26 oct '22	92

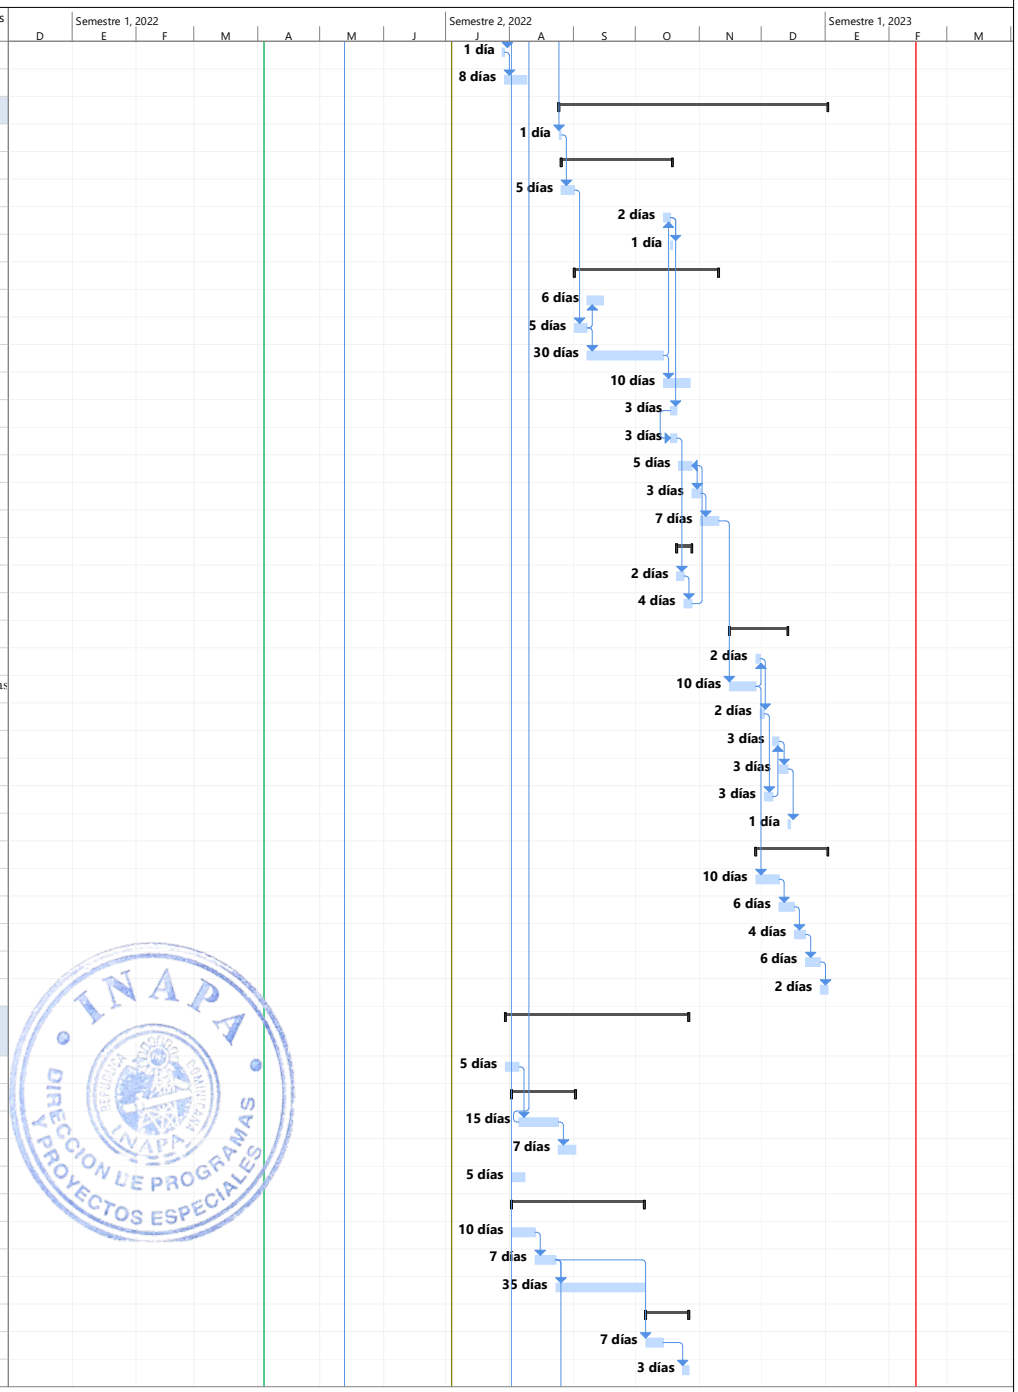

INAPA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

Comienzo Proyecto: lun 04 abr '22
Fin Proyecto: lun 13 feb '23

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURISTICAS, MUNICIPIO DE MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI
INAPA-CCC-LPN-2021-0051

Días Habiles: 347 días
Días Calendarios: 430 días ≈ 14 meses

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
94	**1.6**	**E- LÍNEA DE IMPULSIÓN RÍO YEGUADA**	**82.63 días**	**mar 23 ago '22**	**vie 02 dic '22**	
95	1.6.1	Replanteo	3 días	mar 23 ago '22	vie 26 ago '22	89
96	**1.6.2**	**Corte y extracción de asfalto**	**19 días**	**vie 26 ago '22**	**lun 19 sep '22**	
97	1.6.2.1	Corte de asfalto	15 días	vie 26 ago '22	mié 14 sep '22	95
98	1.6.2.2	Remoción de carpeta asfáltica	3 días	mié 14 sep '22	sáb 17 sep '22	97
99	1.6.2.3	Bote de material asfáltico c/camión	1 día	sáb 17 sep '22	lun 19 sep '22	98
100	**1.6.3**	**Movimiento de Tierra**	**48 días**	**lun 19 sep '22**	**jue 17 nov '22**	
101	1.6.3.1	Excavación material compacto con equipo	15 días	lun 19 sep '22	vie 07 oct '22	99
102	1.6.3.2	Asiento de arena	15 días	mié 21 sep '22	lun 10 oct '22	101CC+2 dí
103	1.6.3.3	Relleno compactado	7 días	mar 08 nov '22	mié 16 nov '22	107
104	1.6.3.4	Bote material sobrante	1 día	mié 16 nov '22	jue 17 nov '22	103
105	1.6.4	Suministro y colocación de tuberías y piezas especiales	15 días	lun 10 oct '22	vie 28 oct '22	102
106	1.6.5	Anclajes de hormigón armado	5 días	vie 28 oct '22	jue 03 nov '22	105
107	1.6.6	Suministro y colocación de válvulas	3 días	jue 03 nov '22	mar 08 nov '22	106
108	1.6.7	Construcción de registros	15 días	mar 08 nov '22	vie 25 nov '22	107
109	1.6.8	Reparación de servicios existentes	5 días	mar 08 nov '22	lun 14 nov '22	107
110	**1.6.9**	**Reposición de la carpeta asfáltica**	**5.63 días**	**sáb 26 nov '22**	**vie 02 dic '22**	
111	1.6.9.1	Riego de imprimación con gravilla	1 día	sáb 26 nov '22	lun 28 nov '22	108
112	1.6.9.2	Suministro y colocación de asfalto	3 días	mié 30 nov '22	vie 02 dic '22	111
113	**1.7**	**F-OBRA DE TOMA ARROYO SANTIAGO**	**173.75 días**	**mié 04 may '22**	**mar 06 dic '22**	
114	**1.7.1**	**Badén**	**2 días**	**vie 15 jul '22**	**lun 18 jul '22**	
115	1.7.1.1	Excavación	1 día	vie 15 jul '22	vie 15 jul '22	
116	1.7.1.2	Bote in situ	1 día	sáb 16 jul '22	lun 18 jul '22	115
117	1.7.1.3	Suministro y colocación de tosca	1 día	sáb 16 jul '22	lun 18 jul '22	115
118	1.7.1.4	Suministro y colocación de material granular	1 día	sáb 16 jul '22	lun 18 jul '22	117CC
119	**1.7.2**	**Muros de Gaviones**	**4 días**	**lun 18 jul '22**	**vie 22 jul '22**	
120	1.7.2.1	Excavación	1 día	lun 18 jul '22	mar 19 jul '22	118
121	1.7.2.2	Bote de material in situ	1 día	mar 19 jul '22	mié 20 jul '22	120
122	1.7.2.3	Suministro y colocación de muros de gaviones	2 días	mié 20 jul '22	vie 22 jul '22	121
123	**1.7.3**	**Reparación en dique**	**156.5 días**	**mié 04 may '22**	**lun 14 nov '22**	
124	1.7.3.1	Remoción de tubería	2 días	sáb 13 ago '22	mar 16 ago '22	
125	1.7.3.2	Suministro y colocación de rejillas	1 día	sáb 20 ago '22	lun 22 ago '22	124
126	1.7.3.3	Demolición de registro	1 día	jue 10 nov '22	jue 10 nov '22	125
127	1.7.3.4	Construcción de registro	1 día	lun 14 nov '22	lun 14 nov '22	
128	1.7.3.5	Dragado de dique	15 días	mié 04 may '22	lun 23 may '22	
129	**1.7.4**	**Obra de toma y gaviones**	**7 días**	**mar 19 jul '22**	**mié 27 jul '22**	
130	1.7.4.1	Suministro y colocación muros de gaviones	5 días	mar 19 jul '22	lun 25 jul '22	120
131	1.7.4.2	Excavación	1 día	lun 25 jul '22	mar 26 jul '22	130
132	1.7.4.3	Bote de material in situ	1 día	mar 26 jul '22	mié 27 jul '22	131
133	**1.7.5**	**Camino de acceso**	**8 días**	**mié 27 jul '22**	**sáb 06 ago '22**	
134	1.7.5.1	Corte de material	1 día	mié 27 jul '22	jue 28 jul '22	132
135	1.7.5.2	Relleno con material de corte	1 día	jue 28 jul '22	vie 29 jul '22	134
136	1.7.5.3	Bote de material sobrante	1 día	vie 29 jul '22	lun 01 ago '22	135
137	1.7.5.4	Relleno compactado con material de mina	3 días	lun 01 ago '22	jue 04 ago '22	136
138	1.7.5.5	Conformación de cuneta en tierra	2 días	jue 04 ago '22	sáb 06 ago '22	137
139	1.7.6	Rehabilitación de camino de acceso existente desde Barrio Los Franceses hasta Obra de Toma Arroyo Santiago más badén	50 días	mar 10 may '22	lun 11 jul '22	4
140	**1.7.7**	**Almacén de Materiales**	**35 días**	**mié 10 ago '22**	**jue 22 sep '22**	
141	1.7.7.1	Replanteo	1 día	mié 10 ago '22	mié 10 ago '22	16CC

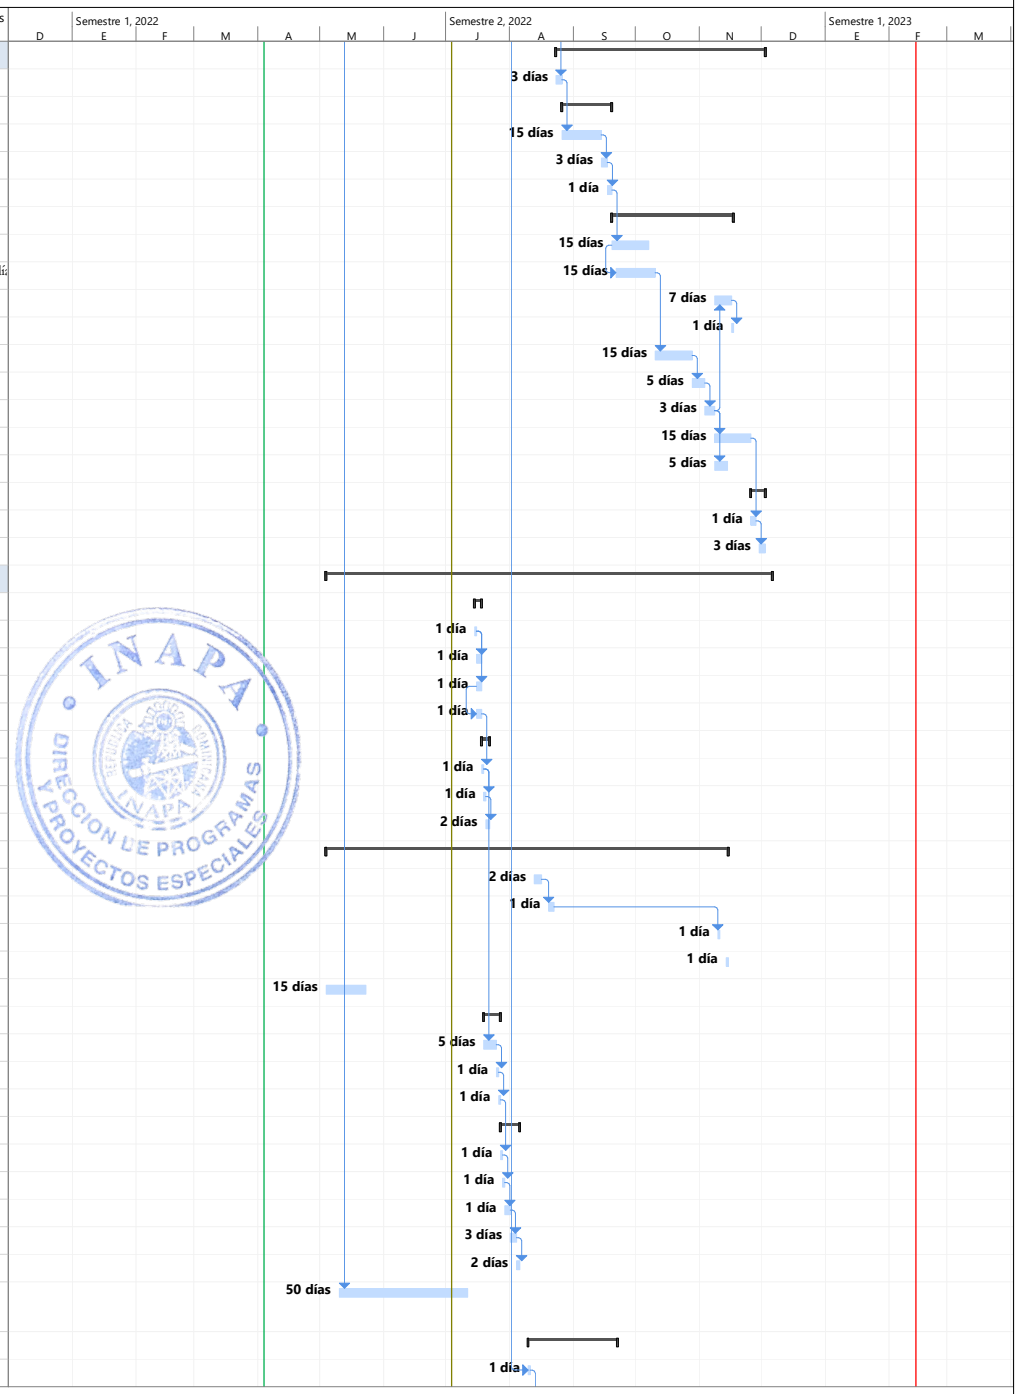

INAPA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

Comienzo Proyecto: lun 04 abr '22
Fin Proyecto: lun 13 feb '23

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURISTICAS, MUNICIPIO DE MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI
INAPA-CCC-LPN-2021-0051

Días Habiles: 347 días
Días Calendarios: 430 días ≈ 14 meses

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
142	**1.7.7.2**	**Movimiento de Tierra**	**3 días**	**jue 11 ago '22**	**lun 15 ago '22**	
143	1.7.7.2.1	Excavación material compactado a mano	1 día	jue 11 ago '22	jue 11 ago '22	141
144	1.7.7.2.2	Relleno de reposición compactado	1 día	vie 12 ago '22	vie 12 ago '22	143
145	1.7.7.2.3	Bote de material in situ	1 día	sáb 13 ago '22	lun 15 ago '22	144
146	**1.7.7.3**	**Hormigón Armado**	**17 días**	**vie 12 ago '22**	**vie 02 sep '22**	
147	1.7.7.3.1	Zapata de muro	2 días	vie 12 ago '22	lun 15 ago '22	143
148	1.7.7.3.2	Zapata de columna	2 días	vie 12 ago '22	lun 15 ago '22	147CC
149	1.7.7.3.3	Columna	2 días	lun 22 ago '22	mié 24 ago '22	157
150	1.7.7.3.4	Viga de amarre inferior	2 días	lun 15 ago '22	mié 17 ago '22	147
151	1.7.7.3.5	Viga de amarre intermedia	2 días	mié 24 ago '22	vie 26 ago '22	149
152	1.7.7.3.6	Viga de amarre superior	2 días	vie 26 ago '22	mar 30 ago '22	151
153	1.7.7.3.7	Dintel en puerta	1 día	lun 22 ago '22	mar 23 ago '22	157
154	1.7.7.3.8	Losa de piso	2 días	mié 17 ago '22	vie 19 ago '22	150
155	1.7.7.3.9	Losa de techo	3 días	mar 30 ago '22	vie 02 sep '22	152
156	**1.7.7.4**	**Muros de Block**	**12 días**	**vie 19 ago '22**	**sáb 03 sep '22**	
157	1.7.7.4.1	Bloques de 6" SNP	2 días	vie 19 ago '22	lun 22 ago '22	154
158	1.7.7.4.2	Muros de bloques calado	1 día	mar 23 ago '22	mié 24 ago '22	153
159	1.7.7.4.3	Antepecho	1 día	vie 02 sep '22	sáb 03 sep '22	155
160	**1.7.7.5**	**Terminación de Superficie**	**6 días**	**sáb 03 sep '22**	**sáb 10 sep '22**	
161	1.7.7.5.1	Fraguache	1 día	sáb 03 sep '22	lun 05 sep '22	159
162	1.7.7.5.2	Pañete	2 días	lun 05 sep '22	mié 07 sep '22	161
163	1.7.7.5.3	Fino de techo	1 día	mié 07 sep '22	jue 08 sep '22	162
164	1.7.7.5.4	Sabaleta en techo	1 día	jue 08 sep '22	vie 09 sep '22	163
165	1.7.7.5.5	Pintura acrílica	1 día	vie 09 sep '22	sáb 10 sep '22	164
166	1.7.7.6	Desague de Techo	1 día	vie 09 sep '22	sáb 10 sep '22	164
167	1.7.7.7	Suministro y colocación de puerta	1 día	sáb 10 sep '22	lun 12 sep '22	165
168	**1.7.7.8**	**Instalación eléctrica**	**1 día**	**mié 07 sep '22**	**jue 08 sep '22**	
169	1.7.7.8.1	Salida de interruptores, tomacorrientes y luces cenitales	1 día	mié 07 sep '22	jue 08 sep '22	162
170	**1.7.7.9**	**Verja en malla ciclónica**	**10 días**	**vie 09 sep '22**	**jue 22 sep '22**	
171	1.7.7.9.1	Verja en malla ciclónica (incluye replanteo, movimiento de tierra, zapata de muro, block, terminación de superficie, tubos verticales y horizontales, malla ciclónica, palometas, alambre de púas, abrazaderas, copa, planchuelas, pintura, mano de obra, etc.)	7 días	vie 09 sep '22	lun 19 sep '22	164
172	1.7.7.9.2	Columnas C1	2 días	lun 19 sep '22	mié 21 sep '22	171
173	1.7.7.9.3	Columnas C2	2 días	lun 19 sep '22	mié 21 sep '22	172CC
174	1.7.7.9.4	Suministro y confección de puerta en malla ciclónica	1 día	mié 21 sep '22	jue 22 sep '22	173
175	**1.7.8**	**Garita de Vigilancia**	**60 días**	**jue 22 sep '22**	**mar 06 dic '22**	
176	1.7.8.1	Replanteo	1 día	jue 22 sep '22	vie 23 sep '22	174
177	1.7.8.2	Movimiento de tierra a mano (incluye excavación de zapatas, reposición de material compactado y bote de material sobrante)	2 días	vie 23 sep '22	lun 26 sep '22	176
178	**1.7.8.3**	**Hormigón Armado**	**22 días**	**lun 26 sep '22**	**lun 24 oct '22**	
179	1.7.8.3.1	Zapata de muro	2 días	lun 26 sep '22	mié 28 sep '22	177
180	1.7.8.3.2	Viga de amarre bajo de piso	2 días	lun 03 oct '22	mar 04 oct '22	187
181	1.7.8.3.3	Viga de amarre a nivel de techo	2 días	lun 17 oct '22	mié 19 oct '22	183
182	1.7.8.3.4	Dintel	1 día	vie 14 oct '22	sáb 15 oct '22	183CC
183	1.7.8.3.5	Viga dintel	2 días	vie 14 oct '22	lun 17 oct '22	184
184	1.7.8.3.6	Columna	2 días	mié 12 oct '22	vie 14 oct '22	188
185	1.7.8.3.7	Losa de techo	3 días	mié 19 oct '22	lun 24 oct '22	181

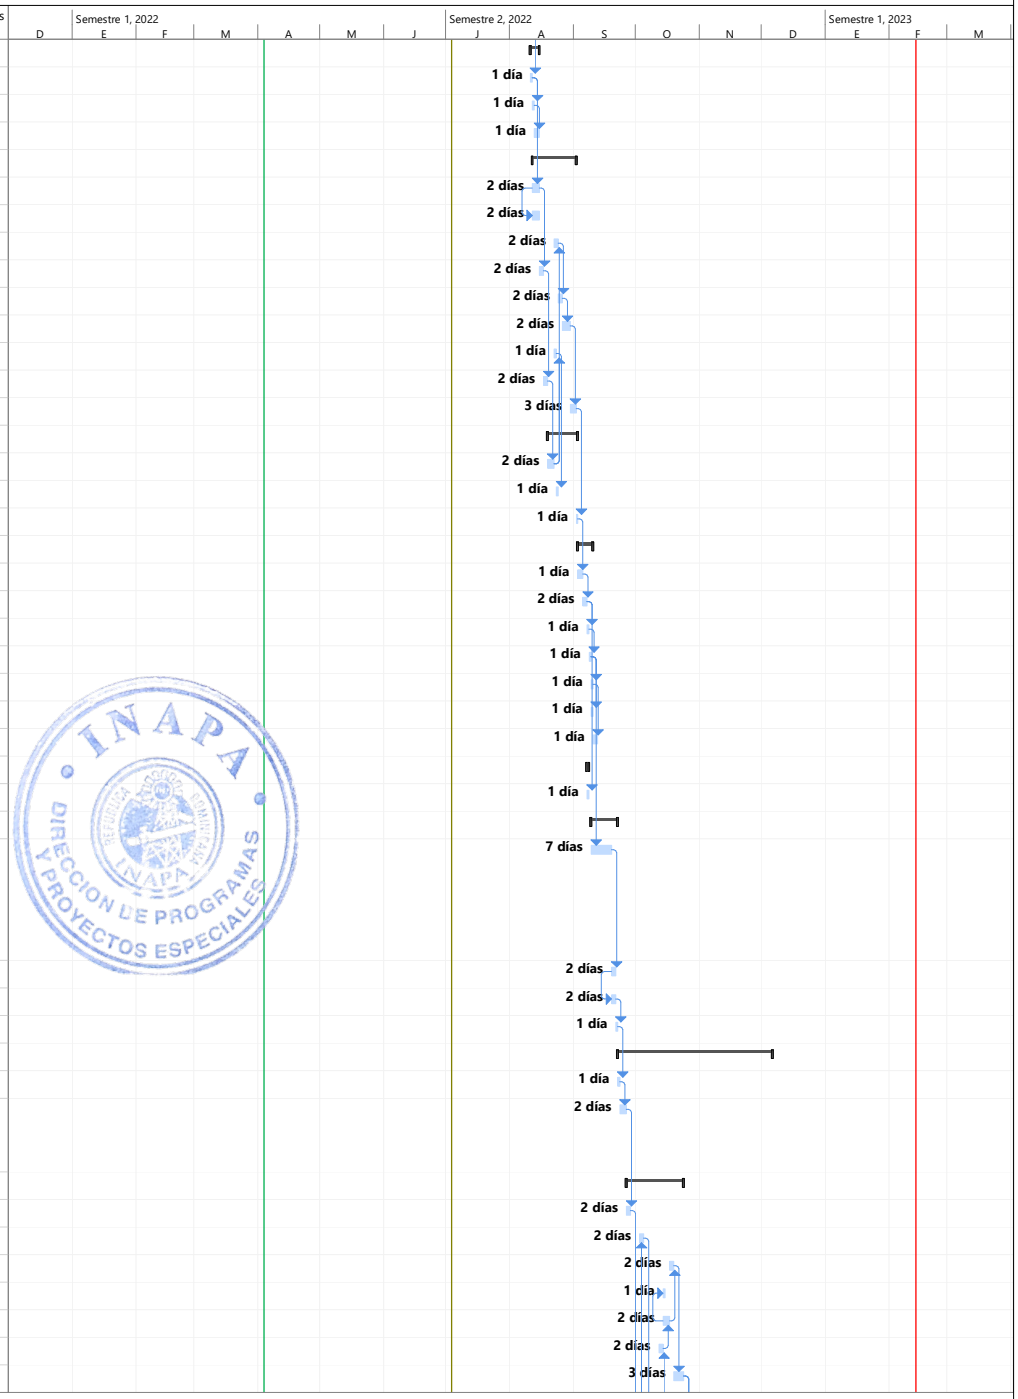

INAPA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

Comienzo Proyecto: lun 04 abr '22
Fin Proyecto: lun 13 feb '23

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURISTICAS, MUNICIPIO DE MICHES, PROVINCIA EL SEIBO, ZONA VI
INAPA-CCC-LPN-2021-0051

Días Habiles: 347 días
Días Calendarios: 430 días ≈ 14 meses

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
186	**1.7.8.4**	**Muros de Block**	**11 días**	**mié 28 sep '22**	**mié 12 oct '22**	
187	1.7.8.4.1	B.N.P de ø 6¨	3 días	mié 28 sep '22	sáb 01 oct '22	179
188	1.7.8.4.2	S.N.P de ø 6¨	4 días	vie 07 oct '22	mié 12 oct '22	200
189	**1.7.8.5**	**Terminación de Superficie**	**18 días**	**lun 24 oct '22**	**mar 15 nov '22**	
190	1.7.8.5.1	Fraguache	1 día	lun 24 oct '22	mar 25 oct '22	185
191	1.7.8.5.2	Pañete interior	3 días	vie 28 oct '22	mar 01 nov '22	192
192	1.7.8.5.3	Pañete exterior	3 días	mar 25 oct '22	vie 28 oct '22	190
193	1.7.8.5.4	Fino de techo	2 días	vie 28 oct '22	lun 31 oct '22	192
194	1.7.8.5.5	Antepecho	3 días	lun 24 oct '22	jue 27 oct '22	185
195	1.7.8.5.6	Zabaleta en techo	1 día	lun 31 oct '22	mar 01 nov '22	193
196	1.7.8.5.7	Gotero ranurado	2 días	mar 01 nov '22	jue 03 nov '22	195
197	1.7.8.5.8	Impermeabilizante en techo (tipo sellador)	1 día	jue 03 nov '22	vie 04 nov '22	196
198	1.7.8.5.9	Cerámica en baño	3 días	vie 04 nov '22	mar 08 nov '22	197
199	1.7.8.5.10	Pintura general acrílica (incluye base blanca)	3 días	jue 10 nov '22	mar 15 nov '22	201
200	1.7.8.6	Pisos de hormigón con malla electrosoldada	2 días	mié 05 oct '22	jue 06 oct '22	180
201	1.7.8.7	Acera perimetral	2 días	mar 08 nov '22	jue 10 nov '22	198
202	**1.7.8.8**	**Suministro y colocación de puerta**	**3 días**	**mar 15 nov '22**	**vie 18 nov '22**	
203	1.7.8.8.1	Suministro e Instalación de puerta	1 día	mar 15 nov '22	mié 16 nov '22	199
204	1.7.8.8.2	Verja de protección en puerta	2 días	mié 16 nov '22	vie 18 nov '22	203
205	**1.7.8.9**	**Colocación Ventana de Aluminio**	**3 días**	**mié 16 nov '22**	**sáb 19 nov '22**	
206	1.7.8.9.1	Ventanas de aluminio en celosías	1 día	mié 16 nov '22	jue 17 nov '22	203
207	1.7.8.9.2	Verja de protección en ventanas	1 día	vie 18 nov '22	sáb 19 nov '22	204
208	**1.7.8.10**	**Instalación sanitaria**	**29 días**	**lun 31 oct '22**	**mar 06 dic '22**	
209	1.7.8.10.1	Lavamanos sencillos	2 días	vie 18 nov '22	lun 21 nov '22	204
210	1.7.8.10.2	Inodoro	2 días	vie 18 nov '22	lun 21 nov '22	209CC
211	1.7.8.10.3	Desagüe de techo	2 días	lun 31 oct '22	mié 02 nov '22	193
212	1.7.8.10.4	Ducha	2 días	lun 21 nov '22	mié 23 nov '22	210
213	1.7.8.10.5	Desagüe de piso	2 días	lun 21 nov '22	mié 23 nov '22	212CC
214	1.7.8.10.6	Columna ventilación de 3"	2 días	lun 31 oct '22	mié 02 nov '22	211CC
215	1.7.8.10.7	Cámara de inspección	3 días	mié 23 nov '22	sáb 26 nov '22	213
216	1.7.8.10.8	Séptico	5 días	lun 28 nov '22	vie 02 dic '22	215
217	1.7.8.10.9	Tinaco 150 GLS	2 días	sáb 03 dic '22	mar 06 dic '22	216
218	1.7.8.10.10	Barra para cortina de baño	1 día	mié 23 nov '22	jue 24 nov '22	213
219	**1.7.8.11**	**Instalación Eléctrica**	**6 días**	**vie 18 nov '22**	**vie 25 nov '22**	
220	1.7.8.11.1	Entrada general (incluye panel de braeker de 4/8 circuitos)	3 días	vie 18 nov '22	mar 22 nov '22	204
221	1.7.8.11.2	Salida de interruptores, tomacorrientes y luces cenitales	3 días	mar 22 nov '22	vie 25 nov '22	220

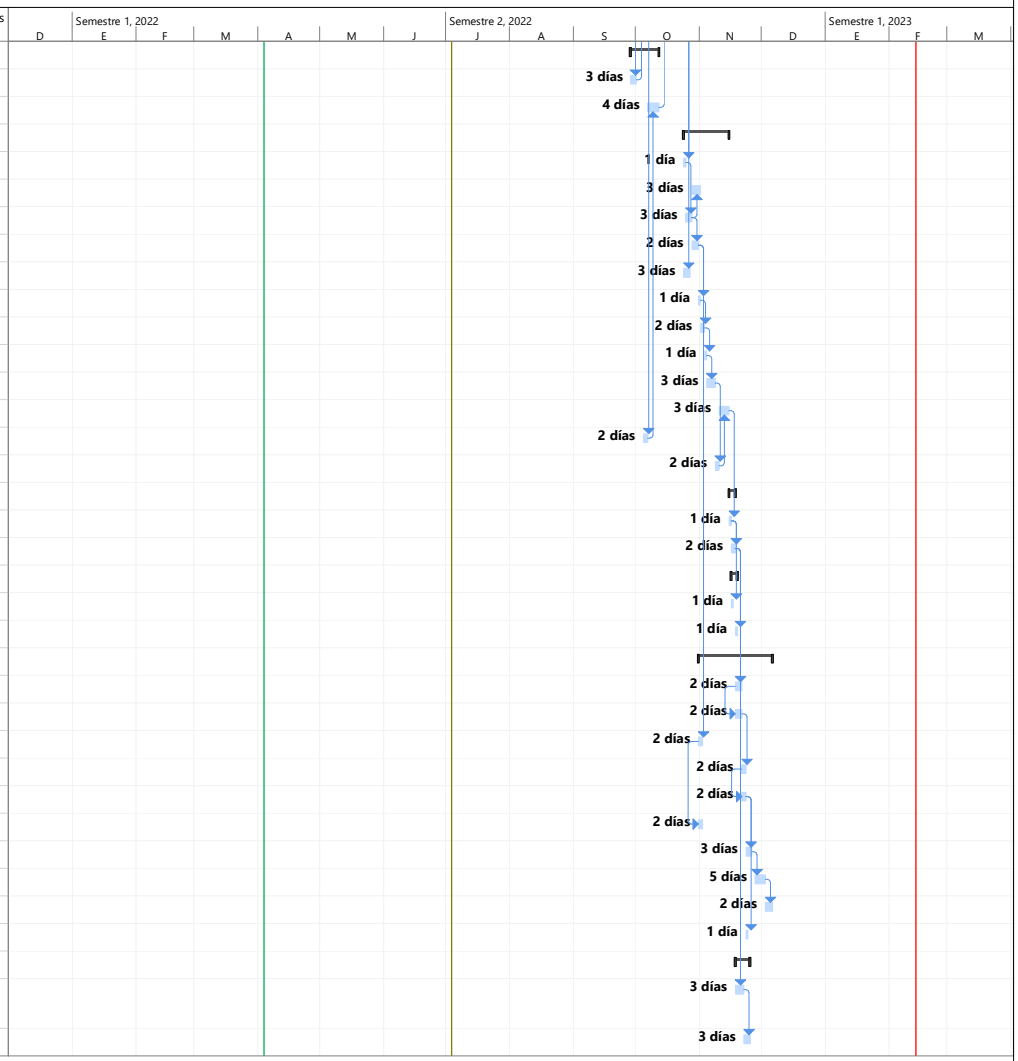

INAPA
DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

Comienzo Proyecto: lun 04 abr '22
Fin Proyecto: lun 13 feb '23

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual
