CONSTRUCTORA MONTEBIANCO

Cronograma de ejecucion

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**TERMINACION ETAPA I ALCANTARILLADO JUAN DOLIO-GUAYACANES**	**534 días**	**2/10/2022**	**2/27/2024**	
2		INICIO	0 días	2/10/2022	2/10/2022	
3		**REDES COLECTORAS (FASE A)**	**334 días**	**2/10/2022**	**5/23/2023**	
4		Replanteo y control topográfico	10 días	2/10/2022	2/23/2022	2
5		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**150 días**	**4/7/2022**	**11/2/2022**	
6		Excavación material compactado con equipo zanjas h<2m	30 días	4/7/2022	5/18/2022	40
7		Excavación en roca durac/equipo	30 días	5/19/2022	6/29/2022	6
8		Excavación en roca durac/trencher	40 días	6/30/2022	8/24/2022	7
9		Suministro de material de minas dist.=20km	10 días	8/25/2022	9/7/2022	6,7,8
10		Regularización de zanjas	30 días	5/19/2022	6/29/2022	6
11		Asiento de arena	20 días	6/30/2022	7/27/2022	10
12		Compactado de relleno con compactador mecánico en capas de 0.20	40 días	9/8/2022	11/2/2022	9,10
13		Bote de material c/camión dist.=5km	18 días	8/25/2022	9/19/2022	6,7,8
14		**SUMINISTRO DE TUBERIAS (ESPIGA Y CAMPANA)**	**26 días**	**7/28/2022**	**9/1/2022**	
15		DE Ø 8" PVC SDR 32.5 + 3% Perdida por campana	10 días	7/28/2022	8/10/2022	11
16		DE Ø 12" PVC SDR 32.5 + 3% Perdida por campana	6 días	8/11/2022	8/18/2022	15
17		DE Ø 16" PVC SDR 32.5 + 3% Perdida por campana	6 días	8/19/2022	8/26/2022	16
18		DE Ø 20" PVC SDR 32.5 + 3% Perdida por campana	4 días	8/29/2022	9/1/2022	17
19		**COLOCACION DE TUBERIAS (ESPIGA Y CAMPANA)**	**40 días**	**8/11/2022**	**10/5/2022**	
20		DE Ø 8" PVC SDR 32.5	40 días	8/11/2022	10/5/2022	15,25
21		DE Ø 12" PVC SDR 32.5	20 días	8/19/2022	9/15/2022	16
22		DE Ø 16" PVC SDR 32.5	10 días	8/29/2022	9/9/2022	17
23		DE Ø 20" PVC SDR 32.5	10 días	9/2/2022	9/15/2022	18
24		Suministro y colocación de piezas especiales	10 días	10/6/2022	10/19/2022	20,21,22,23
25		Entibado de zanjas	10 días	6/30/2022	7/13/2022	10
26		**REGISTROS PREFABRICADOS**	**70 días**	**10/20/2022**	**1/25/2023**	
27		De 1.00 a 1.50 M	40 días	10/20/2022	12/14/2022	24
28		De 1.50 a 2.00 M	40 días	10/20/2022	12/14/2022	24
29		De 2.00 a 2.50 M	30 días	12/15/2022	1/25/2023	28
30		De 2.50 a 3.00 M	20 días	12/15/2022	1/11/2023	28

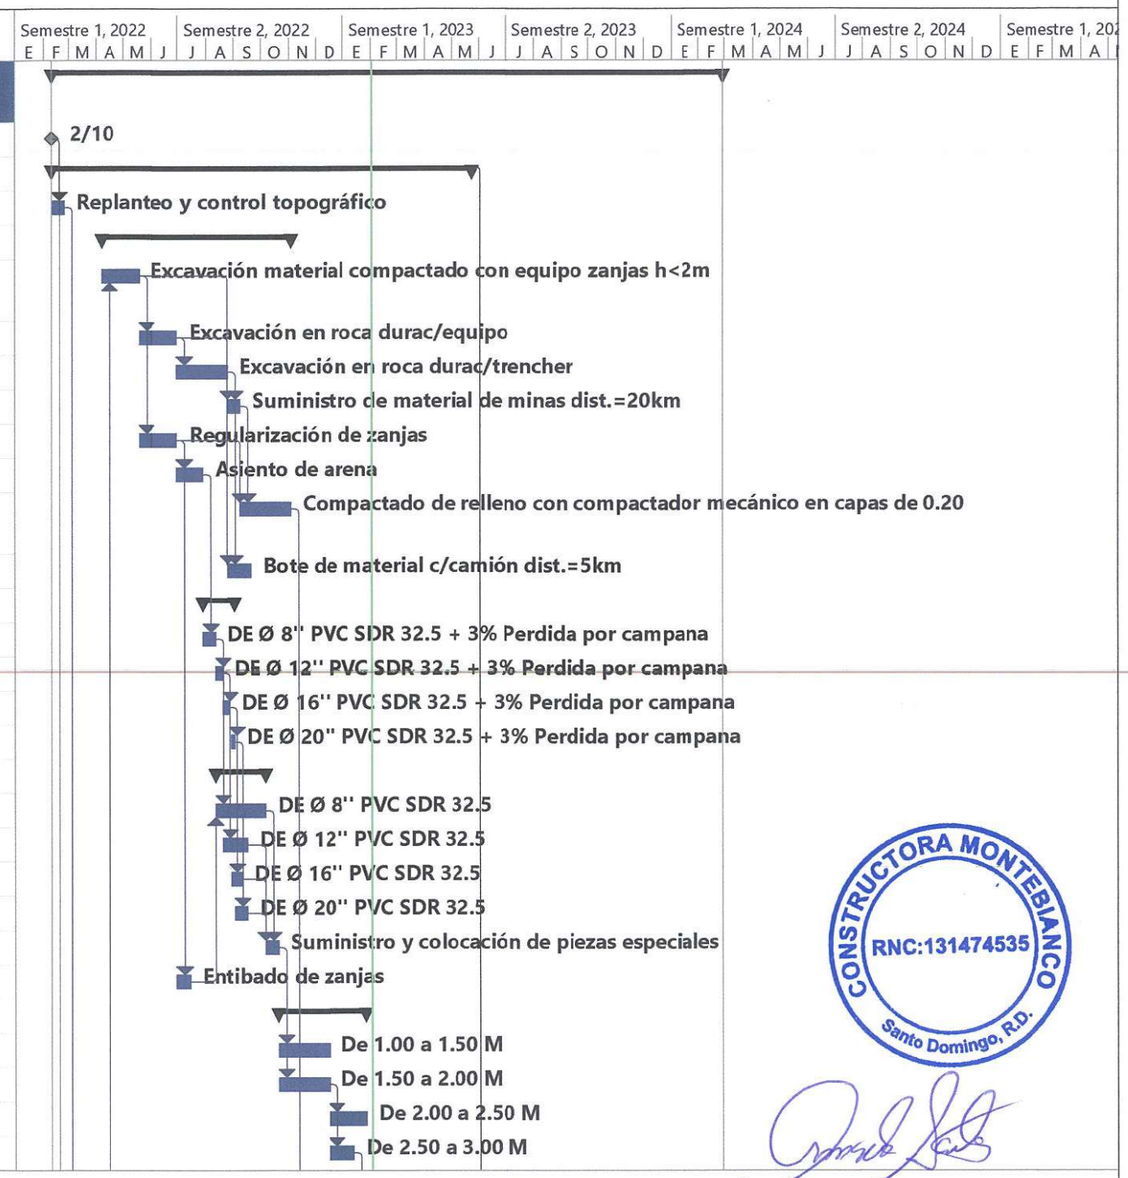

CONSTRUCTORA MONTEBIANCO
RNC:131474535
Santo Domingo, R.D.

Project: guayacanes INAPA 100
Date: 2/2/2023

Task	Inactive Task	Manual Summary Rollup	External Milestone	Manual Progress
Split	Inactive Milestone	Manual Summary	Deadline	
Milestone	Inactive Summary	Start-only	Critical	
Summary	Manual Task	Finish-only	Critical Split	
Project Summary	Duration-only	External Tasks	Progress	

CONSTRUCTORA MONTEBIANCO

Cronograma de ejecucion

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
31		**CAIDAS**	**34 días**	**1/12/2023**	**2/28/2023**	
32		De 1.00 a 2.00 M	10 días	1/12/2023	1/25/2023	30
33		De 2.00 a 3.00 M	10 días	1/26/2023	2/8/2023	32
34		De 3.00 a 4.00 M	8 días	2/9/2023	2/20/2023	33
35		De 4.00 a 5.00 M	6 días	2/21/2023	2/28/2023	34
36		**ACOMETIDAS DOMICILIARIAS**	**60 días**	**3/1/2023**	**5/23/2023**	
37		DE Ø 4" PVC SDR 32.5	40 días	3/1/2023	4/25/2023	35
38		DE Ø 6" PVC SDR 32.5	20 días	4/26/2023	5/23/2023	37
39		**ASFALTO 90 % DE LAS LONGITUDES**	**247 días**	**2/24/2022**	**2/3/2023**	
40		Corte carpeta asfáltica	30 días	2/24/2022	4/6/2022	4
41		Extracción carpeta asfáltica	60 días	4/7/2022	6/29/2022	40
42		Bote de material c/camión dist.=5km	10 días	6/30/2022	7/13/2022	41
43		Suministro y colocación de asfalto 2"	20 días	11/3/2022	11/30/2022	44,12
44		Transporte de asfalto distancia aprox.=57km	20 días	6/30/2022	7/27/2022	41
45		Reparación de servicio existente	30 días	12/1/2022	1/11/2023	43
46		Control y manejo de tránsito	7 días	1/12/2023	1/20/2023	45
47		Limpieza final y continua	10 días	1/23/2023	2/3/2023	46
48		**ESTACION DE BOMBEO (FASE B)**	**35 días**	**5/24/2023**	**7/11/2023**	
49		Estación de bombeo (6m x 8m)	35 días	5/24/2023	7/11/2023	3
50		**LINEA DE IMPULSION (FASE C)**	**106 días**	**7/12/2023**	**12/6/2023**	
51		Replanteo y control topográfico	7 días	7/12/2023	7/20/2023	48
52		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**69 días**	**8/16/2023**	**11/20/2023**	
53		Excavación material compactado con equipo zanjas h<2m	15 días	8/16/2023	9/5/2023	75
54		Excavación en roca c/equipo	10 días	9/6/2023	9/19/2023	53
55		Asiento de arena	5 días	9/29/2023	10/5/2023	56
56		Regularización de zanjas	7 días	9/20/2023	9/28/2023	54
57		Suministro de material de minas dist.=20km	2 días	10/2/2023	10/3/2023	60
58		Relleno compactado c/mat. De excavación	23 días	10/19/2023	11/20/2023	57,69,70,71
59		Bote de material c/camión dist.=5km	7 días	9/20/2023	9/28/2023	53,54
60		**SUMINISTRO DE TUBERIAS**	**8 días**	**9/20/2023**	**9/29/2023**	
61		DE Ø 12" PVC SDR 26 C/JG + 4% Perdida por campana	3 días	9/20/2023	9/22/2023	53,54

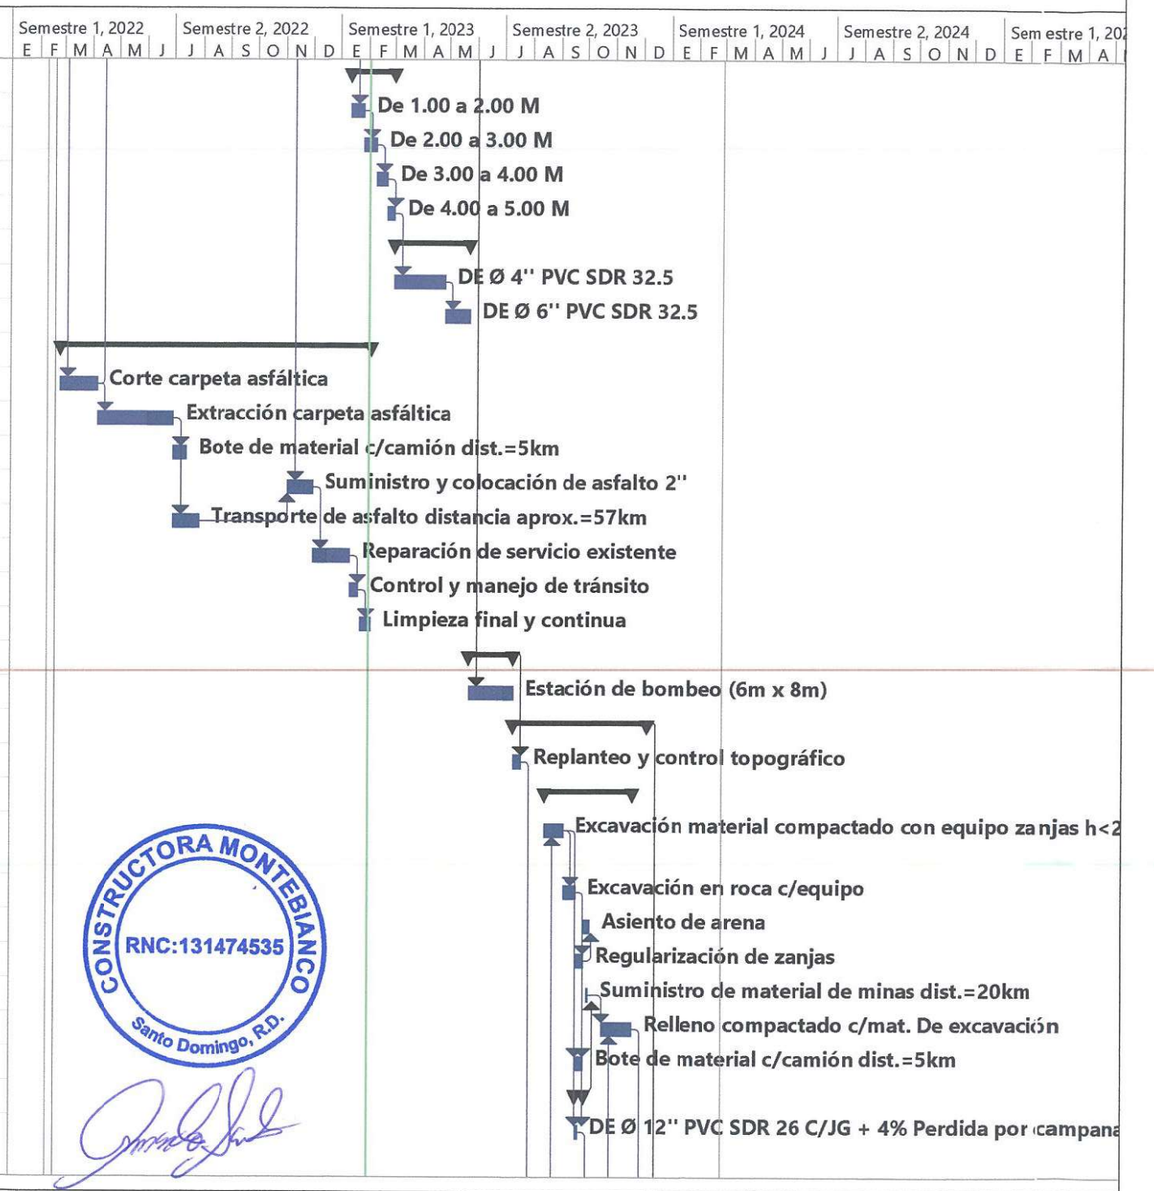

CONSTRUCTORA MONTEBIANCO
RNC:131474535
Santo Domingo, R.D.

Project: guayacanes INAPA 100
Date: 2/2/2023

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			

CONSTRUCTORA MONTEBIANCO

Cronograma de ejecucion

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
62		DE Ø 16'' PVC SDR 26 C/JG + 5% Perdida por campana	3 días	9/25/2023	9/27/2023	61
63		DE Ø 20'' PVC SDR 26 C/JG + 6% Perdida por campana	2 días	9/28/2023	9/29/2023	62
64		**COLOCACION DE TUBERIAS**	**13 días**	**9/25/2023**	**10/11/2023**	
65		DE Ø 12'' PVC SDR 26 C/JG	7 días	9/25/2023	10/3/2023	61
66		DE Ø 16'' PVC SDR 26 C/JG	10 días	9/28/2023	10/11/2023	62
67		DE Ø 20'' PVC SDR 26 C/JG	5 días	10/2/2023	10/6/2023	63
68		**PRUEBA HIDROSTATICA**	**2 días**	**10/17/2023**	**10/18/2023**	**72**
69		DE Ø 12'' PVC SDR 26 C/JG	2 días	10/17/2023	10/18/2023	65
70		DE Ø 16'' PVC SDR 26 C/JG	2 días	10/17/2023	10/18/2023	66
71		DE Ø 20'' PVC SDR 26 C/JG	2 días	10/17/2023	10/18/2023	67
72		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESECIALES	3 días	10/12/2023	10/16/2023	64
73		**ASFALTO 90 % DE LAS LONGITUDES**	**99 días**	**7/21/2023**	**12/6/2023**	
74		Corte carpeta asfáltica	8 días	7/21/2023	8/1/2023	51
75		Extracción carpeta asfáltica	10 días	8/2/2023	8/15/2023	74
76		Bote de material c/camión dist.=5km	3 días	8/16/2023	8/18/2023	75
77		Suministro y colocación de asfalto 2''	4 días	11/21/2023	11/24/2023	78,58
78		Transporte de asfalto distancia aprox.=57km	4 días	8/21/2023	8/24/2023	76
79		Control y manejo de tránsito	3 días	11/27/2023	11/29/2023	77
80		Limpieza final y continua	5 días	11/30/2023	12/6/2023	79
81		**PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO 100 LPS (FASE D)**	**34 días**	**12/7/2023**	**1/23/2024**	
82		Rehabilitación sistema electromecánico de la planta	15 días	12/7/2023	12/27/2023	50
83		Sustitución de tuberías, piezas, válvulas y reparación de pasarela	10 días	12/28/2023	1/10/2024	82
84		Acondicionamiento de camino de acceso a planta	9 días	1/11/2024	1/23/2024	83
85		**VARIOS (FASE E)**	**534 días**	**2/10/2022**	**2/27/2024**	
86		Fabricación e instalación de valla	15 días	2/10/2022	3/2/2022	2
87		Sistema de video y vigilancia	10 días	2/14/2024	2/27/2024	88FF
88		Campamento	534 días	2/10/2022	2/27/2024	2
89		FIN	0 días	2/27/2024	2/27/2024	87FF

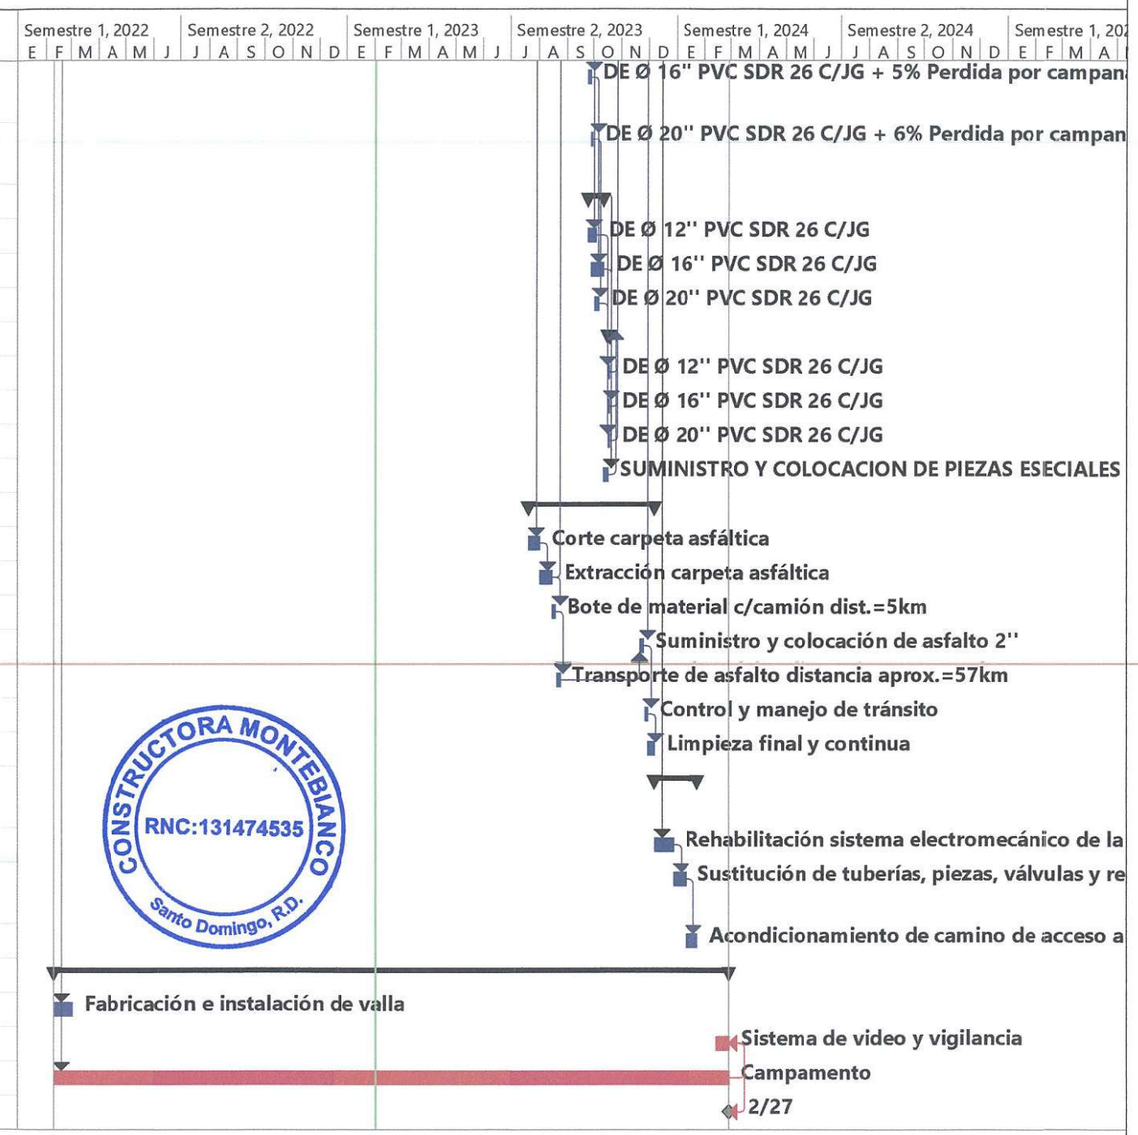

CONSTRUCTORA MONTEBIANCO
RNC:131474535
Santo Domingo, R.D.

Project: guayacanes INAPA 100
Date: 2/2/2023

Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			
